

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 44 (PARTE I- INFORME SOBRE EL CONTRATO)

PERÍODO:

Abril 1 al 30 de 2024



BOGOTÁ D.C.-COLOMBIA

L1T1-INT-GGP-IN-0044_01_VBB

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 2 de 104	

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

Versión	Acción	Fecha	Descripción de la Acción
00	Creación del documento	20/03/2021	Creación del informe mensual de interventoría
V01	Codificación de la plantilla	25-03-2021	Ajuste de cajetín superior de la plantilla codificación -
V02	Ajustes en la portada de la plantilla	26-06-2022	Cambio de imagen de portada, uso de colores institucionales y redistribución de información

CONTROL DE APROBACIÓN

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>	<i>Fecha</i>
<i>Elaboración</i>	<i>Constanza Escobar R</i>	<i>Coordinadora Administrativa</i>	<i>01/05/2024</i>
<i>Revisión</i>	<i>Jesús Torres Romero</i>	<i>Subdirector Técnico</i>	<i>09/05/2024</i>
<i>Aprobación</i>	<i>Javier Descarga Nápoles</i>	<i>Director Interventoría</i>	<i>09/05/2024</i>

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA			
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.			
Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 3 de 104	

TABLA DE CONTENIDO

1.	INFORME SOBRE EL CONTRATO: Contrato de Interventoría 148 de 2020.....	7
1.1.	Introducción	7
1.2.	Resumen Ejecutivo	9
1.2.1.	Seguimiento Jurídico	9
1.2.2.	Seguimiento Financiero.....	10
1.2.3.	Control de Calidad y Sistemas Integrados de Gestión	11
1.2.4.	Seguimiento Predial	15
1.2.5.	Seguimiento a la Gestión Ambiental	24
1.2.6.	Seguimiento a la Gestión Social	25
1.2.7.	Seguimiento a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	26
1.2.8.	Redes Secas.....	28
1.2.9.	Redes Húmedas	59
1.2.10.	Diseño Geométrico Ferroviario	65
1.2.11.	RAMS.....	66
1.2.12.	Sistema Metro - Ferroviario y MR	67
1.2.13.	Seguimiento Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos	73
1.3.	Información legal del Contrato	74
a)	Número del Contrato	74
b)	Objeto	74
c)	Fecha de suscripción del Contrato	74
d)	Fecha de inicio del Contrato.....	74
e)	Fecha Máxima de terminación del Contrato	75
f)	Plazo, prórrogas, suspensiones y reiniciación en sus diferentes fases	75
g)	Valor del Contrato, adiciones y modificaciones	75
h)	Supervisor del Contrato	76
i)	Informe en relación con el estado de las garantías:	76
1.4.	Información Administrativa y Financiera del Contrato	79
a)	Soporte que demuestra que el interventor está a paz y salvo de las obligaciones tributarias	79
b)	Valor pagado del Contrato, detallando el valor a pagar del mes en curso y pago acumulado	79
1.5.	Información de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Interventoría	90
1.5.1	Formatos de Gestión SST del CSPLMB.....	90
1.5.2	Certificaciones de Paz y salvo	94
1.5.3	Afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad Social.....	94
1.5.4	Pagos de salarios personal de interventoría.....	94
1.5.5	Egresos de personal/ Examen de retiro	95
1.5.6	Registro de la notificación de riesgos	95
1.5.7	Registro de asistencia a la inducción SST	95
1.5.8	Conceptos médicos ocupacionales	95
1.5.9	Registro de Capacitaciones y entrenamientos	96
1.5.10	Entrega de EPP	96
1.5.11	Soporte Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (“COPASST”)	96
1.5.12	Soporte Comité de Convivencia Laboral	97
1.5.13	Aprobación emitida entidad gubernamental PESV	97
1.5.14	Soporte cumplimiento PESV.....	97
1.5.15	Registro de capacitaciones conductores	97

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 4 de 104		

1.5.16	Soporte Actas de comité ambiental y SST	98
1.5.17	Registro Fotográfico	98
1.5.18	Registro de PQRS.....	98
1.5.19	Registro de inspecciones.....	98
1.5.20	Documentos finales de año.....	99
1.5.21	Otras actividades SST realizadas por interventoría	99
1.5.22	Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV	100
1.5.23	Cumplimiento de las obligaciones SST por parte de interventoría.....	102
1.6.	Seguimiento Contrato No. 148 de 2020	104

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 5 de 104	

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1.2.3-1. Resultado del Seguimiento al Plan de Trabajo Anual del SGI - Interventoría	11
Tabla 1.2.3-2. Registros definidos a la fecha para el Repositorio de formularios PMO	14
Tabla 1.2.4-1. Resumen fechas puesta a disposición de predios y espacio publico	20
Tabla 1.2.4-2 Resumen fechas entrega puesta a disposición Acuerdo Transacción	20
Tabla 1.2.8-1. Estado actual de los diseños respecto a las ESP.	28
Tabla 1.2.8-2. Estado actual de los diseños respecto a las ESP.	29
Tabla 1.2.8-3. Relación de las últimas transmisiones de diseños de redes secas.....	30
Tabla 1.2.8-4. Estado actual de los diseños respecto a las ESP.	31
Tabla 1.2.8-5. Avance acumulado diseños redes secas –discriminado por Entidad Distrital / ESP.	31
Tabla 1.2.8-6. Estado actual de los diseños respecto a las ESP.	38
Tabla 1.2.8-7. Avance diseños redes secas, seguimiento según el Plan de Ejecución V11- discriminado por tramo. ...	41
Tabla 1.2.8-8. Avance acumulado Proyectos Serie 1, Serie 3, Serie 4, Serie 5 y Serie 6.	44
Tabla 1.2.8-9. Avance de los diseños de los Proyectos Serie 1	49
Tabla 1.2.8-10. Avance de los diseños de los Proyectos Serie 3, Serie 4, Serie 5 y Serie 6	52
Tabla 1.2.8-11. Diseños No Objetados por la interventoría y su estado de aprobación por las ESP o por la UAESP.	56
Tabla 1.2.8-12 Estado de Cumplimiento de entregables Redes Secas en V00 según PET V11.	57
Tabla 1.2.8-13. Relación mesas de trabajo celebradas durante el periodo	58
Tabla 1.2.9-1. Comunicados de No Objeción Diseños RHU – Int. Calle 72, con radicados a EMB.	59
Tabla 1.2.9-2. Comunicados de No Objeción Diseños RHU – Av. 68, con radicados a EMB.	60
Tabla 1.2.9-3. Comunicados de No Objeción Diseños RHU - Corredor Principal, con radicados a EMB.	61
Tabla 1.2.9-4. Estado de gestión de los productos ante la EAAB ESP.	63
Tabla 1.2.9-5. Estado de Cumplimiento de entregables RHU en V00 según PET V11.	64
Tabla 1.3-1. Porcentaje de participación, Consorcio Supervisor PLMB.	75
Tabla 1.4-1. Valores del Contrato	79
Tabla 1.4-2. Causación Retribución del Interventor a pesos y dólares constantes de diciembre de 2017 antes de IVA81	
Tabla 1.4-3. Causación acumulada de la Retribución del Interventor a pesos y dólares constantes de diciembre de 2017 antes de IVA	83
Tabla 1.4-4. Valores pagados en pesos y dólares constantes de diciembre de 2017 antes de IVA.....	85
Tabla 1.4-5. Valores pagados en pesos y dólares corrientes antes de IVA.....	87
Tabla 1.4-6. Valores retención Fase Previa COP antes de IVA	88
Tabla 1.4-7. Valores retención Fase Previa USD antes de IVA	88
Tabla 1.4-8. Valor de la Retribución del Interventor enero de 2024 antes de IVA.....	89

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 6 de 104		

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1.5-1. Seguimiento personal interventoría	91
Ilustración 1.5-2. Seguimiento sexo personal interventoría	92

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 7 de 104		

1. INFORME SOBRE EL CONTRATO: Contrato de Interventoría 148 de 2020

1.1. Introducción

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) y el Consorcio Supervisor PLMB (CSPLMB) dando aplicabilidad a lo dispuesto en la modalidad de contratación correspondiente a la SBCC de acuerdo con las políticas de adquisición del BID (GN 2350-9), de acuerdo con el inciso segundo del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 y en las obligaciones adquiridas por la EMB en los contratos de crédito suscritos con el Banco, suscribieron el 2020-08-25, el Contrato de Interventoría No. 148 de 2020, cuyo objeto es:

El Interventor se obliga para con la EMB a realizar la Interventoría integral, técnica, económica, financiera, contable, jurídica, administrativa, operativa, predial, ambiental, social y de seguridad salud en el trabajo, en relación con las obligaciones adquiridas por el Concesionario a través del Contrato de Concesión que dicho Concesionario ejecute durante la vigencia de este Contrato.

Por consiguiente, el objeto del Contrato comprende, sin limitarse, a la verificación en forma presencial en los términos establecidos en el Contrato de Concesión y en lo no señalado por éste, en este Contrato de las obligaciones a cargo del Concesionario en relación con:

- i) La financiación, Estudios y Diseños de Detalle Principales y Otros Estudios y Diseños de Detalle, ejecución de las Obras de Construcción, Obras de la Fase Previa, Obras de Edificaciones, Obras para Redes a Cargo del Concesionario, Obras de Adecuación y Reparación de Desvíos, Obras para Intersección Especiales, la Gestión Social y Ambiental del Proyecto, así como la Operación y el Mantenimiento del Proyecto.
- ii) La financiación, diseño, instalación, suministro, pruebas individuales y de conjunto, Certificaciones y puesta en marcha, así como la Operación, reposición, Mantenimiento del Material Rodante y de los Sistemas Metro-Ferrovianos, y la prestación del servicio público de transporte masivo férreo de pasajeros en Bogotá a través de la PLMB.
- iii) La Reversión Parcial, la Reversión y liquidación del Contrato de Concesión, en el caso en que dichas actividades ocurran durante la vigencia del presente Contrato,
- iv) En general, verificar, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión y en este Contrato, el cumplimiento por parte del Concesionario de sus obligaciones contractuales.

Para el presente Contrato, aplicarán las cláusulas del BID quien junto con el BIRF y BEI hacen parte de la financiación integral del Proyecto a través de los préstamos 4572/OC-CO (BID), el 8901-CO (BIRF) y el 89993 (BEI), junto al Convenio de Cofinanciación de la Nación y el Distrito. Así mismo, se registrará por lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y demás Leyes Aplicables.

El plazo será de máximo once (11) años, contados a partir de la entrada en vigor del Contrato, o cuando el Precio del Contrato del que trata la sección 6.2 de estas CEC se agote, lo que suceda

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 8 de 104	

primero. Cualquier prórroga o adición del plazo de este Contrato deberá realizarse a través de un otrosí, previo cumplimiento de los trámites presupuestales y legales correspondientes por parte de la EMB. ii) El Interventor declara y manifiesta que conoce que las prestaciones del presente Contrato están asociadas a las Fases y Etapas del Contrato de Concesión. Por consiguiente, también declara y manifiesta que las fases y etapas del presente Contrato corresponderán a la duración efectiva de las Fases y Etapas del Contrato de Concesión, por lo que la suscripción de las respectivas actas por parte del Concesionario y la EMB para iniciar una Fase o Etapa del Contrato de Concesión se entenderá que dicha Fase y Etapa también inicie respecto de este Contrato. El acta de Inicio del Contrato de la Interventoría se suscribió el 2020-09-23, fecha en la cual entra en vigor el Contrato de Interventoría.

El informe técnico se presenta en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría, el CSPLMB presenta a la EMB, el **Informe Mensual No. 44**, correspondiente al desarrollo de las actividades del periodo, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice B - Requisitos para la Presentación de Informes, con el fin de describir las actividades realizadas por el Contratista, la Interventoría, el avance del proyecto, el control financiero, conclusiones y recomendaciones.

Durante el mes de abril de 2024 el Interventor hizo seguimiento al cumplimiento de las actividades financieras establecidas en el Contrato de Concesión y analiza y presenta en el siguiente informe, la información financiera del Patrimonio Autónomo correspondiente al mes de marzo de 2024.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 9 de 104	

1.2. Resumen Ejecutivo

1.2.1. Seguimiento Jurídico

REFERENCIA CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN
CLÁUSULA 4.2 LITERAL (A) DE LAS C.E.C. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Mediante comunicación L1T1-INT-CE-24-1595 de fecha 10 de abril de 2024, la Interventoría da alcance a la comunicación L1T1-INT-CE-24-1381 (EXT24-0005337), mediante la cual se solicitó el cambio de especialista COORDINADOR SEGUIMIENTO, presenta documentos para el análisis y evaluación del cumplimiento del perfil del candidato en el marco del cambio del COORDINADOR SEGUIMIENTO.
CLÁUSULA 4.2 LITERAL (A) DE LAS C.E.C. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Mediante comunicación L1T1-INT-CE-24-1644 de fecha 12 abril de 2024, se solicitó el cambio del INSPECTOR AMBIENTAL Y SST, y presentó candidato para el cargo precitado, de conformidad con lo establecido en el ítem 56 de la lista C-2 del Apéndice C del contrato de interventoría.
APÉNDICE A2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Mediante oficio L1T1-INT-CE-24-1689, se informó sobre la programación de transferencia de conocimiento a través de talleres y seminarios de formación para el primer semestre del año 2024.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 10 de 104		

1.2.2. Seguimiento Financiero

A continuación, se presenta los principales temas a los que se les hizo seguimiento.

El 19 de abril de 2024, el Fideicomiso recibió un nuevo Giro de Equity por valor de 107.366.370.257,28 constantes de diciembre de 2017, para un acumulado de COP \$ 340.804.175.466,21 constantes de diciembre de 2017, valor superior en un 5,38% al mínimo contractual para los primeros cuarenta y dos meses desde la fecha de inicio del Contrato de Concesión.

Adicionalmente, el Fideicomiso recibió dos desembolsos de crédito de las entidades bancarias Bancolombia S.A. y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A (Prestamistas registrados), por valor de COP 40.000.000 cada uno.

La rentabilidad de las cuentas de ahorro del grupo Bancolombia del 01 al 10 de marzo fue de 11.80 % EA, y a partir del 11 al 31 de marzo fue de 11.00 % EA. Conforme con lo previsto en el numeral 5.2 del contrato fiduciario y sección 5.2 (g) del Contrato de Concesión, los rendimientos del mes de febrero de 2024, de las Subcuentas Amigable Composición, Excedentes y TPEs, de la Cuenta EMB, fueron trasladados a la Subcuenta de Obras Menores.

En la Subcuenta Excedentes EMB, se evidencia el recibo del 60% de los ingresos girados por concepto del Aprovechamiento Económico del Espacio Público – AEEP, de acuerdo con la propuesta presentada por el Concesionario y aprobada por la EMB, dando cumplimiento a la sección 3.1 (j) del Contrato de Concesión.

Durante el período objeto del informe, se realizaron pagos por concepto de intereses de los créditos adquiridos por el fideicomitente por valor de COP \$ 16.898.158.006,78.

El Inventario de Activos de la Concesión, con corte a diciembre de 2023 ya se encuentra conciliado por las partes, suscrito por parte del Concesionario y en proceso de suscripción por parte de la EMB. No existió acuerdo entre el Concesionario y la Interventoría con respecto a la Retribución del primer trimestre de 2024. Una vez recibidos los cálculos del Concesionario, la Interventoría envió a la EMB el 18 de abril de 2024 un documento con los cálculos propuestos por el Concesionario y por la Interventoría, identificando los puntos en desacuerdo, conforme a la Sección 3.1 (k) del Contrato de Concesión. A la fecha de corte del presente informe, dicho documento se encuentra en revisión por parte de la EMB.

Tanto la Revisoría Fiscal del Concesionario como de Fiduciaria Bancolombia S.A., certificaron en el mes de marzo de 2024, que Metro Línea 1 S.A.S. y el Patrimonio autónomo, aplicaron los principios de causación para el registro de ingresos y gastos contemplados en el marco conceptual para la información financiera para aplicación de las NIIF.

1.2.3. Control de Calidad y Sistemas Integrados de Gestión

1.2.3.1 Estado de Implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG) a cargo de interventoría

En cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Interventoría No. 148 de 2020, Apéndice A2, Capítulo II, numeral 3, literal I), “Establecer, documentar y mantener un sistema integrado de gestión como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones y, como mínimo, deberá acogerse a lo dispuesto en las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, en sus versiones más recientes, y a los lineamientos establecidos por la EMB.”, durante el periodo de análisis, la interventoría continuo con la implementación, mantenimiento y mejora de su Sistema Integrado de Gestión (SIG) con el fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en las normas en sus versiones vigentes: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 teniendo claro que dicha implementación se ejecuta de manera transversal al desarrollo de todas las actividades que se ejecuten en virtud de la actuación misional de la interventoría.

Para el año 2024 se estableció el Plan Anual de Trabajo, avalado por la Dirección de Interventoría y cuyo seguimiento mensual se encuentra a cargo del Especialista en Sistemas Integrados de Gestión. Los resultados del seguimiento y cumplimiento del cronograma de trabajo anual hasta el presente período (Abril/2024) son los siguientes:

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	Acumulado al Cierre del período
NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	4	9	7	6	--	--	--	--	--	--	--	--	26
NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	4	9	7	6	--	--	--	--	--	--	--	--	26
% DE CUMPLIMIENTO X MES	100	100	100	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO HASTA EL MES DE ANÁLISIS	100	100	100	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--

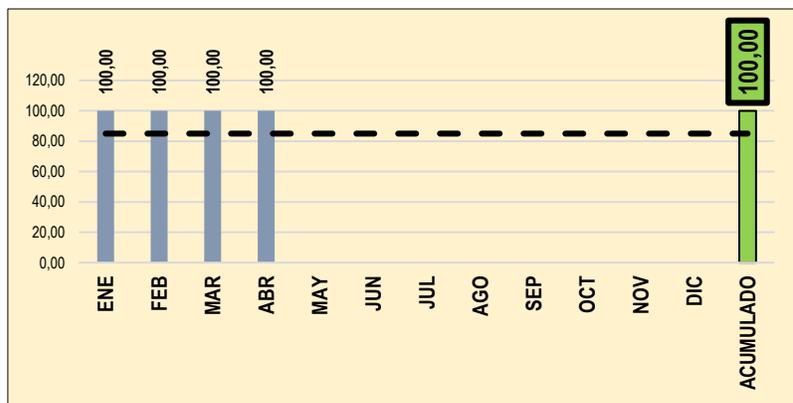


Tabla 1.2.3-1. Resultado del Seguimiento al Plan de Trabajo Anual del SGI - Interventoría

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 12 de 104	

Comentarios del resultado del indicador:

- % CUMPLIMIENTO ACUMULADO HASTA EL MES DE ANÁLISIS à **100%**: este resultado permite evidenciar el cumplimiento de la meta propuesta ($\geq 85\%$). Respecto al resultado en sí, este se presentó teniendo en cuenta que en el Plan de Trabajo 2024 se planificaron hasta el periodo de análisis 26 actividades y se han ejecutado las 26.

1.2.3.2 Seguimiento a la gestión de calidad del proyecto para las actividades ejecutadas por el Concesionario

Para verificar el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión No. 163 de 2019 por parte del Concesionario, entre las actividades correspondientes al periodo de análisis, el área de Calidad y Sistemas Integrados de Gestión desarrolló entre otras las siguientes actividades, las cuales se pueden observar en detalle en la sección 2.2.3 del presente informe:

- 1) Seguimiento a la implementación del Sistema Integrado de Gestión por parte del Concesionario
- 2) Seguimiento a la implementación del Plan Vigente de Gestión de la Calidad del Concesionario
- 3) Seguimiento a la implementación de los Planes de Inspección y Ensayo (PIE's), elaborados por el Concesionario para las actividades de construcción / fabricación
- 4) Gestión de No Conformidades identificadas
- 5) Secretaría técnica de los comités asociados al área de SIG-QA/QC
- 6) Seguimiento a la implementación y actualización de los planes de gestión y técnicos
- 7) Seguimiento a las actividades constructivas durante el período
- 8) Seguimiento a las actividades de pruebas de SMF / MR

1.2.3.3 Estado de implementación del laboratorio de Ensayos de Contraste de Interventoría

Una vez obtenida la gestión de verificación y aprobación por el Supervisor del Contrato, del laboratorio de ensayos CONCRESERVICIOS S.A.S., formalizada a través del oficio EXTS23-0002222 (2023/05/16), durante este periodo, el laboratorio continuo sus actividades, realizando toma de muestras para ejecución de ensayos en los frentes de obra de:

- Patio Taller
- Intercambiador Vial Calle 72
- Puentes Vehiculares de la Av.68
- WF1
- Pilotes PHC
- Vigas "U"

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 13 de 104	

Durante el presente periodo, se gestionó ante el cliente, el Acta No.011 correspondiente a Marzo/2024 (L1T1-INT-CE-24-1599 del 2024/04/10), la cual fue aprobada por parte el cliente mediante oficio EXTS24-0002601 del 23/03/2024.

1.2.3.4 Estado del Repositorio de formularios PMO

En cumplimiento a lo dispuesto en el Contrato de Interventoría No. 148 de 2020, y los requisitos incluidos en el Apéndice A2, Capítulo 2, Numeral 3 (k). *“Presentar para aprobación de la EMB, los formularios a ser utilizados durante la ejecución del Contrato, con base en los cuales el Interventor emitirá la no objeción, objeción o validación o seguimiento o control a los productos que el Concesionario deba entregar de acuerdo con las previsiones contenidas en el Contrato de Concesión”*; a continuación, en la siguiente tabla se presentan los formatos que a la fecha se acordaron incluir en el repositorio en mención y que ya se encuentran avalados por interventoría y EMB, aclarando que durante el presente período no se han presentado novedades:

CÓDIGO	NOMBRE	FRECUENCIA
CSPLMB-FT-LFG-001	Acta de reunión	Cuando se presente
CSPLMB-FT-LFG-006	Informe mensual de interventoría	Mensual
CSPLMB-FT-LFG-007	Informe semestral de interventoría	Semestre
CSPLMB-FT-LFG-008	Informe trimestral de interventoría	Trimestre
CSPLMB-FT-LFG-024	Trazabilidad de líneas base	Mensual
CSPLMB-FT-LFG-025	Seguimiento de hitos contractuales	Mensual
CSPLMB-FT-LFG-026	Seguimiento unidades de ejecución	Mensual
CSPLMB-FT-LFG-028	Seguimiento curva "S"	Mensual
CSPLMB-FT-LFG-029	Control y seguimiento de alertas tempranas	Mensual
CSPLMB-FT-LFG-030	Solicitud de modificación, prórroga o adición a los contratos de concesión e interventoría	Cuando se presente
CSPLMB-FT-LFG-031	Solicitud trámite controversias contractuales	Cuando se presente
CSPLMB-FT-LFG-032	Solicitud suspensión de contratos	Cuando se presente
CSPLMB-FT-LFG-034	Seguimiento de avance y pagos de contrato	Repositorio PMO
CSPLMB-FT-LFG-036	Acta de cálculo de retribución	Trimestral
CSPLMB-FT-LFG-079	Informe de interventoría cierre de Etapa-Fase	Cuando se presente
CSPLMB-FT-LFG-080	Informe de interventoría cierre financiero	Cuando se presente
CSPLMB-FT-LFG-087	Informe de interventoría respuesta de acciones correctivas Auditoria Seguridad Vial	Cuando se presente
CSPLMB- FT-OCI-005	Ficha de revisión de Estudios y Diseños (E&D) por componente entregados por el Concesionario	Cuando se presente
CSPLMB- FT-OCI-007	Memorando Técnico	Cuando se presente
CSPLMB-FT-OCI-008	Ficha de revisión de Planes de Gestión	Cuando se presente
CSPLMB-FT-OCI-030	Acta de terminación Unidades de Ejecución	Cuando termine UE
CSPLMB-FT-OCI-040	Ficha de verificación de Unidades de Ejecución	Cuando termine UE
CSPLMB- FT-OCI-041	Acta de cálculos consolidados componente "D"	Trimestral
CSPLMB- FT-OCI-047	Ficha de revisión solicitud de ajuste Especificaciones Técnicas	Cuando se presente
CSPLMB- FT-OCI-049	Acta de conciliación mensual de cantidades subcomponente "D"	Mensual
CSPLMB- FT-OCI-050	Ficha revisión solicitud inclusión ítems de obra no previstos	Cuando se presente
CSPLMB- FT-OCI-051	Acta de Causación del componente "E"	Trimestral
CSPLMB- FT-OCI-052	Ficha de revisión de Estudios y Diseños (E&D) asociados con redes a cargo del concesionario, adecuación y reparación de desvíos e intersecciones especiales.	Cuando se presente
CSPLMB-FT-OCI-053	Acta mensual de ensayos de laboratorio ejecutados por interventoría	Mensual

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 14 de 104		

CÓDIGO	NOMBRE	FRECUENCIA
CSPLMB-FT-OCI-056	Control de cantidades y valores consolidados ejecutados por el laboratorio de ensayos de interventoría	Mensual
CSPLMB-FT-OCI-059	Informe técnico de inspección y/o visita a campo por parte del especialista	Cuando se presente
CSPLMB-FT-OCI-060	Ayuda de memoria	Cuando se presente
CSPLMB-FT-OCI-061	Ficha de presentación y socialización de documentos para implementación (V01 en adelante) que no requieren concepto de “no objeción”	Cuando se presente
CSPLMB-FT-OCI-063	Ficha de revisión de documentos para implementación presentados por el concesionario, que no requieren concepto de “No objeción”	Cuando se presente
CSPLMB-FT-OCI-064	Ficha de chequeo y control para el acompañamiento de las pruebas FAI	Cuando se presente
CSPLMB-FT-OCI-065	Ficha de revisión de documentos ajustados / modificados presentados por el Concesionario, que requieren concepto de “No Objeción”	Cuando se presente
CSPLMB-FT-LFG-099	Informe de interventoría actividades mensuales del laboratorio de ensayos	Mensual

Tabla 1.2.3-2. Registros definidos a la fecha para el Repositorio de formularios PMO

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 15 de 104	

1.2.4. Seguimiento Predial

A partir del 20 de noviembre de 2020 y a la fecha El Concesionario asumió la responsabilidad de la guarda física y jurídica de los predios que le han sido puestos a su disposición, siendo responsable de la prevención de invasiones y/o afectaciones que afecten e imposibiliten la construcción del patio Taller y de igual forma la construcción de las Estaciones e Interestaciones del Proyecto Metro de Bogotá, sin presentar novedad alguna a la fecha.

De igual forma una vez puestos a disposición y aceptados por El Concesionario los predios y el espacio público, es el Concesionario bajo su cuenta y riesgo el único responsable de su custodia y mantenimiento, con actividades tales como limpieza, recolección de basuras y escombros, poda de césped, mantenimiento y cambio de cerramientos, mantenimiento de mobiliario urbano, vigilancia y custodia, entre otros.

A continuación, se relacionan las jordanas de entrega y puesta a disposición de predios y espacio público en estaciones e Interestaciones realizadas por parte de la EMB:

PERIODO	UBICACIÓN	PREDIOS PRIVADOS	ESPACIO PUBLICO
12 NOV 2020	PATIO TALLER	X	X
23 MAR 2021	PATIO TALLER	X	
10 SEP 2021	ESTACION 8		X
16 SEP 2021	INTERESTACION 16		X
12 OCT 2021	ESTACION 6	X	
13 OCT 2021	ESTACION 6		X
14 OCT 2021	ESTACION 1		X
2 DIC 2021	ESTACION 10		X
14 DIC 2021	ESTACION 10	X	
23 FEB 2022	ESTACION 2		X
23 FEB 2022	INTERESTACION 1		X
28 FEB 2022	ESTACION 16	X	
11 MAR 2022	ESTACION 3 ESTACION 4 ESTACION 5 INTERESTACION 6 ESTACION 9 ESTACION 11 ESTACION 14 ESTACION 15 ESTACION 16	X	
16 MAR 2022	ESTACION 7 INTERESTACION 9 INTERESTACION 10	X	

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA			
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.			
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	

PERIODO	UBICACIÓN	PREDIOS PRIVADOS	ESPACIO PUBLICO
18 MAR 2022	ESTACION 2 INTERESTACION 1		X
6 ABR 2022	INTERESTACION 3 ESTACION 16	X	
8 ABR 2022	ESTACION 2 INTERESTACION 1		X
11 ABR 2022	PREDIO ANTENA	X	
20 ABR 2022	ESTACION 3 ESTACION 4 ESTACION 5 ESTACION 7 ESTACION 11 ESTACION 15 ESTACION 16	X	
22 ABR 2022	ESTACION 12		X
6 MAY 2022	ESTACION 4 INTERESTACION 9		X
20 MAY 2022	ESTACION 4 ESTACION 5 ESTACION 11 ESTACION 13 ESTACION 14 ESTACION 15 ESTACION 16	X	
31 MAY 2022	INTERESTACION 13 INTERESTACION 14		X
1 JUN 2022	ESTACION 3		X
6 JUN 2022	ESTACION 3 ESTACION 11 ESTACION 13 ESTACION 14 ESTACION 15 ESTACION 16	X	
7 JUN 2022	INTERESTACION 2 INTERESTACION 11		X
10 JUN 2022	ESTACION 3 INTERESTACION 3	X	
24 JUN 2022	ESTACION 9 ESTACION 11 ESTACION 13 ESTACION 14 ESTACION 15 ESTACION 16	X	
28 JUN 2022	INTERESTACION 3 INTERESTACION 5		X
29 JUN 2022	INTERESTACION 4		Se cancela citación
11 JUL 2022	ESTACION 4 ESTACION 11 ESTACION 15	X	
18 JUL 2022	ESTACION 4 ESTACION 5	X	

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA			
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.			
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	

PERIODO	UBICACIÓN	PREDIOS PRIVADOS	ESPACIO PUBLICO
19 JUL 2022	INTERESTACION 3	X	
5 AGO 2022	ANTEJARDINES CLL 72		X
11 AGO 2022	INTERESTACION 6		X
18 AGO 2022	ESTACION 14		X
19 AGO 2022	ESTACION 7 INTERESTACION 9 INTERESTACION 10 ESTACION 11 ESTACION 14 ESTACION 16 ESTACION 5 INTERESTACION 7 ESTACION 13	X	
26 AGO 2022	INTERESTACION 17		X
16 AGO 2022	ESTACION 16	X	
30 AGO 2022	INTERESTACION 2 INTERESTACION 3 INTERESTACION 9		X
8 SEP 2022	ESTACION 13		X
9 SEP 2022	ESTACION 15		X
14 SEP 2022	INTERESTACION 3 ESTACION 5 ESTACION 7 INTERESTACION 10 ESTACION 11 ESTACION 12	X	
16 SEP 2022	INTERESTACION 15		X
23 SEP 2022	ESTACION 16		X
30 SEP 2022	ESTACION 12 INTERESTACION 7	X	X
10 OCT 2022	INTERESTACION 3		X
15 OCT 2022	INTERESTACION 7 INTERESTACION 15 INTERESTACION 16		X
3 NOV 2022	ESTACION 13 INTERESTACION 7 RAMAL TECNICO ANTEJARDINES CLL 72	X	
9 NOV 2022	ANTEJARDINES CLL 72	X	
10 NOV 2022	ESTACION 5 INTERESTACION 9 ESTACION 15	X	
11 NOV 2022	INTERESTACION 10 INTERESTACION 15 INTERESTACION 16		X
24 NOV 2022	ANTEJARDINES CLL 72 ESTACION 9 RAMAL TECNICO	X	

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA			
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.			
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	

PERIODO	UBICACIÓN	PREDIOS PRIVADOS	ESPACIO PUBLICO
28 NOV 2022	ESTACION 14 ESTACION 15		X
30 NOV 2022	ANTEJARDINES CLL 72	X	
21 DIC 2022	INTERESTACION 7 ESTACION 9 INTERESTACION 9 ESTACION 11 ESTACION 12 ESTACION 13 ESTACION 14 ESTACION 15 ESTACION 4	X	X
29 DIC 2022	INTERESTACION 8 INTERESTACION 9 ESTACION 12 ESTACION 14 ESTACION 15	X	
6 ENE 2023	INTERESTACION 9 INTERESTACION 10 ESTACION 14 ESTACION 15	X	
11 ENE 2023	INTERESTACION 8		X
25 ENE 2023	INTERESTACION 7		X
2 FEB 2023	ESTACION 9 ESTACION 11 ESTACION 13 ESTACION 14 ESTACION 15	X	
14 FEB 2023	RAMAL TECNICO	X	
24 FEB 2023	INTERESTACION 8 INTERESTACION 9 ESTACION 12	X	
1 MAR 2023	RAMAL TECNICO ESTACION 5 ESTACION 7 ESTACION 13 ESTACION 14 ESTACION 15 ESTACION 16	X	
3 MARZO 2023	RAMAL TECNICO	X	
9 MARZO 2023	ESTACION 11 ESTACION 13 ESTACION 15	X	
9 MAR 2023	ESTACION 7 ESTACION 9 ESTACION 10 INTERESTACION 13 ESTACION 14 INTERESTACION 14 INTERESTACION 15		X

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA			
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.			
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	

PERIODO	UBICACIÓN	PREDIOS PRIVADOS	ESPACIO PUBLICO
14 MAR 2023	RAMAL TECNICO ESTACION 5 ESTACION 7 ESTACION 13 ESTACION 14 ESTACION 15 ESTACION 16	X	
31 MAR 2023	INTERESTACION 5 ESTACION 7 ESTACION 9 INTERESTACION 9 INTERESTACION 10 ESTACION 12 ESTACION 15	X	
13 ABR 2023	RAMAL TECNICO/PARQUE GIBRALTAR (BOCA CALLES)		X
25 ABR 2023	ESTACION 7 ESTACION 9 INTERESTACION 9 ESTACION 12 ESTACION 13 ESTACION 14 ESTACION 16 ANTEJARDINES CLL 72	X	
15 MAY 2023	ESTACION 11 INTERESTACION 11		X
16 MAY 2023	INTERESTACION 7 INTERESTACION 9	X	
31 MAY 2023	INTERESTACION 3 ESTACION 11 INTERESTACION 9 ESTACION 13 ESTACION 15	X	X
30 JUN 2023	INTERESTACION 6 ESTACION 7 INTERESTACION 8	X	X
31 JUL 2023	INTERESTACION 16 ESTACION 15 ESTAION 16	X	X
25 AGO 2023	INTERESTACION 9 ESTACION 12 ANTEJARDONES CLL 72 (ID 1430)	X	
8 SEP 2023	INTERESTACION 6		X
8 SEP 2023	INTERESTACION 9 ESTACION 12 ESTACION 10 ESTACION 11 ESTACION 15	X	
29 SEP 2023	ESTACION 14	X	
13 OCT 2023	ESTACION 16	X	
30 OCT 2023	INTERESTACION 4		X

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA			
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.			
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	

PERIODO	UBICACIÓN	PREDIOS PRIVADOS	ESPACIO PUBLICO
	ESTACION 5 INTERESTACION 5		
3 NOV 2023	INTERESTACION 4 ESTACION 5 INTERESTACION 5		X
1 DIC 2023	INTERESTACION 9	X	
11 DIC 2023	INTERESTACION 9	X	
04 ENE 2024	INTERESTACIÓN 9 INTERESTACION 10	X	
12 ENE 2024	INTERESTACIÓN 9		X
15 ENE 2024	ESTACIÓN 16	X	
17 ENE 2024	ESTACIÓN 13	x	

Tabla 1.2.4-1. Resumen fechas puesta a disposición de predios y espacio publico

Por otra parte, se firmó el pasado 21 de julio de 2023 Acuerdo de Transacción No.1 del Contrato de Concesión 163 de 2019, suscrito entre la Empresa Metro de Bogotá S.A y Metro Línea 1 S.A.S.

Se suscribe acta de inicio de la fase de construcción del Contrato de Concesión el 25 de julio de 2023.

En el evento que el Concesionario considere, que las fechas de puesta a disposición no le permiten cumplir el plazo para la ejecución de las obras del Contrato, podrá activar el Amigable Compondor para que resuelva la controversia.

El Acuerdo de Transacción No.1 del Contrato de Concesión 163 de 2019, suscrito entre la Empresa Metro de Bogotá S.A y Metro Línea 1 S.A.S., establece las fechas de puesta a disposición de los siguientes predios:

ESTACION	FECHA PUESTA A DISPOSICION	ID PREDIO	ESTADO
E9	30/05/2024	503	PENDIENTE
IE9	30/12/2023	582, 634	CUMPLIDO
IE10*	30/12/2023	1549	PENDIENTE
E11**	30/05/2024	780	CUMPLIDO
E12	30/12/2023	800	CUMPLIDO
E13	30/12/2023	997	CUMPLIDO
E16	29/01/2024	1404	CUMPLIDO
E16	15/10/2023	1301,1303	CUMPLIDO
E16	30/10/2023	1305	CUMPLIDO
IE16	30/10/2023	1430	CUMPLIDO
IE4	31/10/2023	ESPACIO PUBLICO	CUMPLIDO
E5	31/10/2023	ESPACIO PUBLICO	CUMPLIDO
IE5	31/10/2023	ESPACIO PUBLICO	CUMPLIDO

Tabla 1.2.4-2 Resumen fechas entrega puesta a disposición Acuerdo Transacción

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA			
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.			
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	

Por lo cual esta Interventoría tendrá en cuenta las fechas establecidas en este Acuerdo de Transacción No. 1 para el control y supervisión de los compromisos allí establecidos.

Se notifica Acta de Acuerdo de Entrega de Predios Adicionales por la Empresa Metro de Bogotá S.A a Metro Línea 1 S.A.S., a través de oficio EXTS23-0006413 del 13/12/2023 donde la EMB informa las fechas en las que pondrá a disposición los 71 predios.

Componente	Lotes Faltantes por Disponer	Predios Faltantes por Disponer	Acta de Entrega de Predios del 15/03/2023		Sin Acuerdo			Observaciones	
			Cantidad de Predios	Plazo Puesta a Disposición	Cantidad de Predios	Plazo Puesta a Disposición	Cantidad de Predios		Plazo Puesta a Disposición
E9	1	1					1	30/05/2024	Predio con determinante ambiental ID 503 Se está a la espera de respuesta por parte de la SDA respecto al informe de resultados radicado bajo el No. 2024ER25980 del 31/01/2024. Adicionalmente, se continúa la revisión respecto a la posible necesidad de una Adición No. 3 manifestada por la Interventoría.
**IE10	1	1					1	30/12/2023	HOMI (BIC) IE10; Ambas áreas del HOMI, ya se encuentran a favor de la entidad, información que fue notificada a las entidades competentes, con el fin de adelantar la revocatoria como BIC y su respectiva desafectación para entregar al Concesionario. Las áreas del predio HOMI fueron puestos a disposición del Concesionario, quien en el mes de enero manifestó no suscribir el acta por encontrarse afectados al ser un bien de interés cultural – BIC.
E11	1	1			1	31/12/2023	1	30/05/2024	Determinante ambiental Estación de servicio Torogas: La Empresa Metro de Bogotá radicó mediante EXTS24- 0000401 del 24 de enero de 2024, informando que el contratista demolidor tiene programado realizar las actividades de remoción de suelo contaminado en los días 1 y 2 de febrero de

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 22 de 104	

Componente	Lotes Faltantes por Disponer	Predios Faltantes por Disponer	Acta de Entrega de Predios del 15/03/2023		Sin Acuerdo			Plazo Puesta a Disposición	Observaciones
			Cantidad de Predios	Plazo Puesta a Disposición	Cantidad de Predios	Plazo Puesta a Disposición	Cantidad de Predios		
									<p>2024, con el fin de cumplir con los requerimientos de la SDA, y en consecuencia proceder con el desmantelamiento y cierre de la actividad comercial que se desarrollaba en el predio.</p> <p>ID 735: TOROGAS Para el mes de este informe, del predio se removió el suelo contaminado y se está a la espera del cierre por parte de SDA.</p>
E12	1	1		30/10/2023	1		1	30/12/2023	<p>ID 832 BIC: Las actividades de campo relacionadas en el informe enviado mediante EXTS24-0000404 del 24 de enero de 2024, respecto a los levantamientos topográficos, exploraciones geotécnicas a nivel de patología y la toma de muestras de los tipos de mampostería, a la fecha se encuentran culminadas. En consecuencia, la Consultora "INDESCO" se encuentra adelantando los correspondientes ensayos y análisis de datos, con el fin de elaborar y presentar el primer informe estructura.</p> <p>Se está adelantando la consultoría para determinar la alternativa técnica que permita la demolición de la estructura colindante.</p> <p>La Consultora INDESCO a la fecha se encuentra realizando algunos ajustes a la alternativa de solución, los cuales deben ser aprobados por la EMB, con el fin de radicar el anteproyecto ante el IDPC.</p>
Tot	4	4	4		4		4		

Tabla 1.2.4. 2 Resumen seguimiento fechas entrega puesta a disposición Acuerdo Transacción

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 23 de 104		

De igual forma se han realizado veinte (20) mesas de trabajo correspondientes a la Gestión Predial las cuales tuvieron como objetivo el seguimiento a la adquisición y entrega de predios requeridos para el proyecto; Avance de las gestiones de EMB ante otras Entidades para la entrega del espacio público requerido para el inicio de la construcción de la calle 72 entre Carreras 13 y 17 (Deprimido y Redes), Predios no incluidos en el inventario predial que se requieren actualmente para la construcción del Deprimido de la Calle 72, Procedimiento para el Retiro de elementos de espacio público de mobiliario, seguridad, vigilancia y mantenimiento de los predios y espacio público puestos a disposición del Concesionario.

El Concesionario asumió la responsabilidad de la guarda física y jurídica de los predios puestos a su disposición, siendo responsable de la prevención de invasiones y/o afectaciones en estos predios que afecten e imposibiliten la construcción del patio Taller de igual forma que la construcción de Estaciones e Interestaciones del Proyecto Metro de Bogotá, sin presentar novedad alguna.

En el presente periodo se realizó recorrido los días 01, 08, 15, 22 y 29 de abril de 2024 por parte de la Interventoría, donde se verifico la atención dada por el Concesionario a las observaciones y novedades presentadas en el mes y el cumplimiento de los compromisos adquiridos correspondientes a la poda, mantenimiento de cerramientos en mal estado, recolección de escombros y basuras y la debida custodia y vigilancia de los predios y espacio públicos entregados a su disposición.

Para el mes de abril de 2024 se realizó recorrido conjunto entre la EMB, Interventoría y Concesionario los días 10 y 12 de abril de 2024, en donde se solicitó por parte de la EMB una revisión rigurosa frente a los planes de acción realizado por el Concesionario ML1 por la presencia estacionaria de habitantes de calle generalizada.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 24 de 104	

1.2.5. Seguimiento a la Gestión Ambiental

Durante el periodo la Gestión Ambiental ha estado enfocada en realizar los seguimientos a las obligaciones establecidas contractualmente en el Contrato de Concesión y en los Apéndices Técnicos 15 con su anexo 1. de acuerdo con lo enunciado numeral 2.9. Seguimiento a la gestión ambiental.

Dentro de la gestión desarrollada en el seguimiento ambiental se contiene las siguientes

- Se realiza seguimiento a los permisos y licencias ambientales ejecutadas en el presente periodo
- A la fecha el concesionario no ha utilizado mezcla asfáltica modificada con grano de caucho reciclado
- Se realiza seguimiento a cada uno de los instrumentos ambientales aprobados al presente periodo.
- El concesionario realizo el uso de cada uno de los formatos incluido en el manual de seguimiento y control ambiental
- Se verifican las cantidades de suministro de materiales e insumos de cada frente de obra.
- Se verifican el cumplimiento de unidades sanitarias portátiles en obra.
- Se verifican en campo las charlas y capacitaciones realizadas por el concesionario
- Se verifican las licencias y permisos de disposición final y suministro de material entregadas por el concesionario

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 25 de 104		

1.2.6. Seguimiento a la Gestión Social

Durante el periodo la Gestión Social se ha basado principalmente en realizar los seguimientos y verificación a las obligaciones establecidas contractualmente en el Contrato de Concesión y en los Apéndices Técnicos No. 14 y 15 con su anexo 1, por lo tanto, el seguimiento se está realizando con el plan de ejecución V11 y la matriz de seguimiento año 2024, de acuerdo con lo enunciado en el **literal b)** del numeral 2.10. Seguimiento a la gestión social.

A la fecha se tiene un avance del 90.63 % en las actividades de la gestión social, las actividades ejecutadas se han evaluado de acuerdo con el cronograma técnico, las actividades evaluadas durante el mes tienen que ver con:

- Actas de vecindad
- Distribución de volantes de inicio de obra
- Reunión de inicio
- Oficina de atención al ciudadano
- Permiso para intervención del espacio público con valor patrimonial
- Prospecciones de arqueología
- Informes mensuales

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 26 de 104		

1.2.7. Seguimiento a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

La interventoría realizó las siguientes actividades en el componente SST como metodología de supervisión a las actividades adelantadas por el concesionario para el periodo del presente informe:

Actividades del SG-SST de la Interventoría:

- Realización de inspecciones en cada frente y oficinas CSPLMB
- Verificación de charla de trabajo, conforme al riesgo identificado.
- Realización de capacitaciones
- Verificación de documentos de vehículos y conductores de la Interventoría
- Conceptos médicos y afiliaciones al sistema de seguridad social
- Reunión normativa del COPASST
- Entrega y reposición de elementos de protección personal

En el Seguimiento de las actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la normatividad vigente y numerales del contrato, se supervisan las actividades adelantadas por el Concesionario y la Interventoría, en desarrollo de las actividades en los frentes de obra de patio taller, en donde se ejecutan actividades específicas de prevención con el personal en el frente de obra, actividades de topografía, control de movimiento de maquinaria en el interior y exterior del proyecto, señalización de seguridad en el frente de obra, señalización de corredores seguros, mantenimiento vía de acceso, localización de puntos de emergencia, manejo de fauna, manejo de plagas, control actividades de capacitación de personal, control SST en la planta de PHC, supervisión de charlas de trabajo, ATS, preoperacionales, equipos para la atención de emergencias, inspección permanente a las actividades críticas en caliente, actividades automatizadas en la planta de concreto.

En el frente de obra de la WF6 se realiza supervisión de jornadas de orden, aseo y limpieza, izaje de cargas, para descargue y reubicación del acero, adecuación de campamento permanente, armado de parrillas en acero para los muros pantalla del costado occidental, inicio de las excavaciones en el costado oriental para la construcción de vigas cabezal, demoliciones manuales y mecánicas para la construcción de vigas cabezal, fundida de concreto de vigas cabezal, excavación central del intercambiador vial del costado occidental, construcción de vigas puntales en el costado oriental, cargue y retiro de rcd derivados de las excavaciones y demoliciones de manera permanente y segura, actividades de mejoramiento de suelos, capacitaciones sst, inspecciones de obra de acuerdo con el cronograma entre otros.

Para los frentes de obra de WF3, se verifica el cumplimiento de las actividades de prevención en señalización y delimitación de áreas, el cumplimiento de la normatividad vigente para alturas, equipos utilizados en trabajos de tareas críticas, certificados del personal competente, se realizan actividades de armado de hierro, actividades de redes secas, revisión de los equipos para atención de emergencias, inspección de senderos peatonales seguros, fundidas planeadas de estructura, acompañamiento a las actividades de armado viga cajón, amarre de acero, construcción de muros de dovelas y construcción de aproches para muros.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 27 de 104		

Para los frentes de obra activos del viaducto, se realiza verificación constante e inspección de las charlas de trabajo, máquinas de pilotes, documentos específicos en el inicio de actividad, durante y en cambios de turnos, certificados y competencias del personal que realiza la actividad, plan de izaje, mecanismos de emergencia utilizados, equipos de rescate en el áreas de hincado, charlas de trabajo, preoperacionales en el sitio de trabajo, utilización de los elementos de protección de personal acordes a las actividades específicas, se realiza la verificación de las medidas de seguridad en actividades de alto riesgo altura y manejo eficiente para excavaciones, realizadas por el Concesionario en el periodo del informe, de igual manera jornada de orden y aseo. Se presenta en el periodo del reporte las actividades propias de gestión del plan de trabajo SST, como gestión del seguimiento de actividades de entrenamiento de personal, inspecciones, comités, revisión de documentos normativos, control de vehículos para la movilización de personal del proyecto.

Para todos los frentes de obra del viaducto, esta Interventoría a lo largo de la ejecución realiza la supervisión permanente de las siguientes actividades:

- Instalaciones locativas en el frente de obra
- Cerramiento y protección de áreas en espacio público
- Cubrimiento y señalización de materiales pétreos en le frente de obra
- Equipos de emergencia, equipos de rescate
- Verificación de acompañamiento de auxiliares de tráfico en obra
- Verificación de orden y aseo
- Verificación de actividades criticas (ATS / PLAN DE IZAJE entre otros)
- Charlas de trabajo al inicio de las actividades
- Supervisión permanente SST de los profesionales de Interventoría y Concesionario

De igual manera durante el periodo se realizó la revisión de los documentos para validar las hojas de vida de personal SST: inspectores A-SST y residente SST.

Esta Interventoría realizó durante el periodo la revisión del informe de gestión SST mensual No. 07 del contratista (Etapa de Construcción) en versión VBB.

Asistir a los comités de seguimiento e integral Ambientales y SST del Contrato.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 28 de 104	

1.2.8. Redes Secas

En el periodo el Concesionario/ML1 desarrolló las actividades para los diferentes sectores que componen el proyecto presentadas en este reporte, tomando como línea base los requerimientos técnicos mínimos contenidos en el contrato de Concesión, el Apéndice Técnico 3 “Gestión de las Fases Previa, de Construcción, de Pruebas, Certificación y Puesta en marcha”, el Apéndice Técnico 4 (Anexo 10 “Alcance de los entregables en etapa de Diseños”) y el Apéndice 13 “Especificaciones técnicas de redes de servicios públicos” (Anexo 3. “Redes de servicios públicos”, Anexo 2 “Especificaciones técnicas Telefónica” y Anexo 1 “APU Redes”).

Respecto a las obligaciones específicas de la interventoría, se realizó el seguimiento al Concesionario en las correcciones a los documentos (planos e informes) relativos a los estudios fotométricos así como a los diseños definitivos de las redes de las Empresas de Servicios de Enel-Colombia, de ETB de Movistar, de Tigo-Une y de Vanti; los cuales se desarrollaron sobre la alternativa recomendada por el Concesionario; No Objetada por la interventoría y viabilizada por cada ESP para el traslado, protección, reubicación y/o gestión de redes secas (energía, telecomunicaciones y gas). A continuación, se hace un breve resumen de las actividades ejecutadas por el área de Redes Secas de la Interventoría durante el periodo comprendido entre el 2024/04/01 al 2024/04/30.

Patio Taller

Los diseños de redes secas para el Patio Taller ya están aprobados por Enel-Colombia, (única Empresa de Servicios Públicos con redes existentes en el área del Patio Taller); estos diseños cuentan con la No Objeción de la Interventoría. En la siguiente tabla se muestra el estado actual de los diseños de redes. El seguimiento detallado se presenta en el Capítulo 2.6. (a) Redes Secas. Los avances de obra en este sector a la fecha se presentan a detalle en el numeral 2.2.32.

TRANSMISIÓN ML1	CÓDIGO	VERSIÓN	NOMBRE	FECHA RECIBIDO	FECHA RESPUESTA	ESTADO	APROBACIÓN
EN MESA DE TRABAJO	L1T1-1500-100-CON-ED-ELM-MC-0001	V00	MEMORIA DE CALCULO PROYECTO SERIE 1 - PATIO TALLER	7/07/2021	14/07/2021	NO OBJETADO	En mesa de trabajo se dio la No Objeción y se solicitó el envío a Enel-Colombia para obtener la aprobación de Enel-Colombia.
ML1-TRN-001361	L1T1-1500-100-CON-ED-ELM-MC-0001	V00	MEMORIA DE CALCULO PROYECTO SERIE 1 - PATIO TALLER	18/08/2021	NO REQUIERE		Aprobado por ENEL-COLOMBIA con el No. 02948938

Tabla 1.2.8-1. Estado actual de los diseños respecto a las ESP.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA			
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.			
Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 29 de 104	

Intersección Calle 72 por Avenida Caracas

El Concesionario terminó todos los Estudios y diseños principales de redes de uso general de secas (energía eléctrica, telecomunicaciones y gas natural) los cuales cuentan con la No Objeción de la interventoría y con la aprobación de la Unidad Administradora Especial de Servicios Públicos (UAESP) y de las Empresas de Servicios públicos (Enel-Colombia, ETB, Movistar, Tigo – Une y Vanti). En la siguiente tabla se muestra el avance acumulado de los diseños de redes secas. Se dejan resaltados sobre fondo verde los productos No objetados por la Interventoría y/o aprobados por la UAESP o por la Empresa de Servicios Públicos, mientras que se dejan resaltados en color azul los productos que cuentan con la No Objeción de la Interventoría. Todos los diseños principales están firmados en señal de aprobación por las ESP y subidos en versión V00. El Concesionario está adelantando la finalización de los Proyectos Serie 4. El seguimiento detallado se presenta en el Capítulo 2.6. (a) Redes Secas. Los avances de obra en este sector a la fecha se presentan a detalle en el numeral 2.2.33.

TRANSMISION ML1	PRODUCTO	ESTADO ANTE EL CSPLMB	ESTADO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ESP/UAESP
ML1-TRN-001228	DISEÑO FOTOMETRICO INTERSECCION AVENIDA CARACAS CON CALLE 72	No Objetado	La UAESP con oficio 202114-000153781 emitió la Aprobación Proyecto fotométrico.
ML1-TRN-001570	Diseño de redes de Media Tensión contenido en el INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 1 INT. CALLE 72”	No Objetado	Enel-Colombia dio la Aprobación a los diseños con el consecutivo No. 15000572
ML1-TRN-003401	INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 3 INT. CALLE 72	No Objetado	Enel-Colombia dio la Aprobación a los diseños con el consecutivo No. 002473339
ML1-TRN-003402	INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 6 – SAP 12- INT CALLE 72	No Objetado	Enel-Colombia dio la Aprobación a los diseños con el consecutivo No. 00230581
ML1-TRN-001238	INFORME DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES – INT. CALLE 72.	No Objetado	Las ESP de telecomunicaciones dieron la aprobación así: ETB con oficio 2021-1627-GRD-ED -2021/11/08. Movistar con firma de planos el 2021/11/18. Tigo-Une con firma de planos el 2021/10/22
ML1-TRN-001480	DISEÑO DE RELOCALIZACION DE REDES DE GAS NATURAL INTERSECCION CALLE 72-V00	No Objetado	VANTI dio la Aprobación a los diseños con el consecutivo No. 02948938 del 2022/11/23.
L1T1-CON-CE-23-5523 ML1-TRN-021822	Intersección Av. Caracas con calle 72 - Serie 4_VDD	No Objetado	El 2023/11/16 Enel-Colombia solicitó a ML1 actualizar los diseños Serie 4 de acuerdo con la versión V01 del Proyecto Serie 1 y sus modificaciones que ha tenido en obra. A la fecha el Concesionario está actualizando los diseños.

Tabla 1.2.8-2. Estado actual de los diseños respecto a las ESP.

Intersección Avenida Carrera 68 con Avenida 1° de Mayo

El Concesionario terminó los diseños definitivos de los traslados y/o protección de redes secas principales (energía, telecomunicaciones y gas natural) de acuerdo con las alternativas recomendadas en el plan de traslado de redes. A la fecha el concesionario entregó los diseños principales de redes secas como se muestra en la siguiente tabla, se dejan resaltados sobre fondo verde los productos No objetados por la Interventoría y/o aprobados por la UAESP o por la Empresa

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 30 de 104	

de Servicios Públicos. Todos los diseños principales están firmados en señal de aprobación por las ESP y subidos en versión V00. El Concesionario está adelantando la finalización de los Proyectos Serie 4. El seguimiento detallado se presenta en el Capítulo 2.6. (a) Redes Secas. Los avances de obra en este sector a la fecha se presentan a detalle en numeral 2.2.34.

TRANSMISION ML1	FECHA	ASUNTO	RESPUESTA INTERVENTORIA	FECHA	RADICADO EMB	COMENTARIO
ML1-TRN-007895	24/08/2022	DISEÑO DE FOTOMETRIA DE ALUMBRADO PUBLICO – TRAMO 3_VEE	L1T1-INT-CE-22-2804	9/09/2022	EXT22-0012047	La UAESP con oficio 20224000 179601 emitió la Aprobación al Proyecto fotométrico-para el WF3
ML1-TRN-007418	29/07/2022	INFORME RELOCALIZACION DE REDES DE GAS NATURAL INTERSECCIÓN AV. 68 CON 1° DE MAYO_VDD	L1T1-INT-CE-22-2441	9/08/2022	EXT22-0010337	No Objetado
ML1-TRN-009259	16/10/2022	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 - INTERSECCION AV 68_VDD	L1T1-INT-CE-22-3364	25/10/2022	EXT22-0014584	No Objetado.
ML1-TRN-009261	16/10/2022	INFORME DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES – INTERSECCION AV.68_VDD	L1T1-INT-CE-22-3363	25/10/2022	EXT22-0014583	No Objetado.
ML1-TRN-009646	27/10/2022	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 - INTERSECCION AV 68_VDD				Producto no objetado con radicado EXT22-0014584
ML1-TRN-009651	17/11/2022	REPORTE DE CANTIDADES PROYECTO TELECOMUNICACIONES – INTERSECCION AV.68	L1T1-INT-CE-22-4107	15/12/2022	EXT22-0017770	No Objetado.
ML1-TRN-0164939	14/03/2023	INFORME DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES – INTERSECCION AV.68.	No requiere			Versión V00 Aprobado por las ESP de telecomunicaciones
ML1-TRN-017299	8/05/2023	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 - INTERSECCION AV 68.	No requiere			Versión V00 Aprobado por Enel – Colombia ESP con el consecutivo No. 1500200968
ML1-TRN-021812	12/09/2023	INTERSECCION AVENIDA 68 CON AVENIDA 1 MAYO INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 4 CD 751 – VCC y CD-744	L1T1-INT-CE-23-4172	29/09/2023	EXT23-0016317	No Objetado. El 2024/03/19 el Concesionario envió vía correo electrónico a Enel-Colombia los Proyectos Serie 4 de los CD-744 y CD-751

Tabla 1.2.8-3. Relación de las últimas transmisiones de diseños de redes secas.

En las siguientes dos (2) tablas se presenta el Estado actual de los diseños respecto a las ESP.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA			
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.			
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	

TRANSMISION ML1	PRODUCTO	ESTADO ANTE EL CSPLMB	ESTADO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ESP/UAESP
ML1-TRN-007895	DISEÑO DE FOTOMETRIA DE ALUMBRADO PUBLICO – TRAMO 3_VEE	No Objetado EXT22-0012047	La UAESP con oficio 20224000 179601 emitió la Aprobación al Proyecto fotométrico-para el Tramo 3.
ML1-TRN-007418	INFORME RELOCALIZACION DE REDES DE GAS NATURAL INTERSECCIÓN AV. 68 CON 1° DE MAYO_VDD	No Objetado EXT22-0010337	VANTI dio la Aprobación a los diseños con el consecutivo No. 10153620-1163-2022 del 2023/11/23.
ML1-TRN-009259	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 - INTERSECCION AV 68_VDD	No Objetado EXT22-0014584	El 2022/12/22 Enel-Colombia emitió la aprobación del Proyecto Serie 1 con el No. de Caso 1520200968, para la Factibilidad No. 1500117210.
ML1-TRN-009261	INFORME DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES – INTERSECCION AV.68_VDD	No Objetado EXT22-0014583	Las ESP de telecomunicaciones dieron la aprobación así: ETB con firma de planos 2022/11/09. Movistar con firma de planos el 2022/11/15. Tigo-Une no tiene redes en esta intersección.
ML1-TRN-018829	INTERSECCION AVENIDA 68 CON AVENIDA 1 MAYO INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 5 CD CD-716-VBB	Objetado EXT-0012806	El Concesionario no ha iniciado la radicación ante el Operador de Red, hasta tanto no consiga la No Objeción de la Interventoría. Los diseños están en proceso de ajustes por parte del Concesionario.
ML1-TRN-021812	INTERSECCION AVENIDA 68 CON AVENIDA 1 MAYO INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 4 CD 751_VCC y SERIE 4 CD-744_VCC	No Objetado EXT23-0016317	No Objetado. El 2024/03/19 el Concesionario envió vía correo electrónico a Enel-Colombia los Proyectos Serie 4 de los CD-744 y CD-751

Tabla 1.2.8-4. Estado actual de los diseños respecto a las ESP.

Entidad Distrital /Empresa de Servicio Público	Levantamiento, Inventario e investigación de redes (%)	Plan de traslado, protección, reubicación y/o gestión de redes (%)	Diseños definitivos de traslado de redes y estudios fotométricos (%)
UAESP (Estudio Fotométrico)	100	100	100
Enel-Colombia (Proyecto Serie 1)	100	100	100
Enel-Colombia (Proyecto Serie 3) *	100	100	2 proyectos sin entregar Estación Metro # 7
Enel-Colombia (Proyectos Serie 4) *	100	100	100
Enel-Colombia (Proyectos Serie 5)	100	100	100
Enel-Colombia (Proyectos Serie 6) *	---	---	Incluido en el WF3
ETB	100	100	100
Movistar	100	100	100
Tigo-Une	100	100	100
Vanti	100	100	100

Tabla 1.2.8-5. Avance acumulado diseños redes secas –discriminado por Entidad Distrital / ESP.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 32 de 104	

Aclaración: En la tabla anterior los productos identificados con el asterisco (*) corresponden a productos que no están identificados como Estudios y Diseños de Detalle Principales. De acuerdo con el Acta de Entendimiento No. 3 firmada por la EMB y el concesionario 2022/11/17.

Viaducto – ferroviario – Principal

La interventoría efectuó el acompañamiento al Concesionario en las mesas de trabajo programadas con la UAESP y con las Empresas de Servicios. Esto en desarrollo de los diseños definitivos de fotometría y de los traslados y/o protección de redes secas (energía, telecomunicaciones y gas natural) de acuerdo con las alternativas recomendadas en el plan de traslado de redes. El seguimiento detallado se presenta en el Capítulo 2.6 (a) Redes Secas. Los avances de obra en los tramos WF1, WF2, WF3, WF4, WF5 y WF6; con corte a la presentación de este informe mensual se muestran a detalle en los numerales 2.2.35, 2.2.36, 2.3.37, 2.2.38, 2.2.39 y 2.240.

En la tabla siguiente se muestra el estado actual de los diseños de redes secas. Se dejan resaltados sobre fondo verde los productos No objetados por la Interventoría y/o aprobados por la UAESP o por la Empresa de Servicios Públicos. Mientras que se muestran resaltadas en fondo azul los productos No Objetados por la Interventoría.

TRANSMISIÓN ML1	FECHA	ASUNTO	NO OBJECCIÓN INTERVENTORIA	FECHA	RADICADO EMB	ESTADO RESPECTO A LA ESP
ML1-TRN-007895	24/08/2022	DISEÑO DE FOTOMETRIA DE ALUMBRADO PUBLICO – TRAMO 3_VEE	L1T1-INT-CE-22-2804	9/09/2022	EXT22-0012047	La UAESP con oficio 20224000 179601 emitió la Aprobación.
ML1-TRN-009247	15/10/2022	DISEÑO DE FOTOMETRIA DE ALUMBRADO PUBLICO – TRAMO 1_VDD	L1T1-CON-CE-22-3530	8/11/2022	EXT22-0015355	La UAESP con oficio 20224000 225071 emitió la Aprobación.
ML1-TRN-010635	16/11/2022 18/11/2022	DISEÑO DE FOTOMETRIA DE ALUMBRADO PUBLICO TRAMO 2. - VEE	L1T1-CON-CE-22-3717	24/11/2022	EXT22-0016299	La UAESP con oficio 20224000241471 emitió la Aprobación.
ML1-TRN-011202	18/11/2022	INFORME DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES TRAMO2_VCC	L1T1-CON-CE-22-4037	12/12/2022	EXT22-0017433	Planos firmados en señal de Aprobación por: a) ETB el 12/12/2022, b) Movistar 10/07/2023, c) TIGO el 07/03/2023.
ML1-TRN-014856	11/03/2023	TRAMO 1 - ENERGIA SERIE 1 - INFORME DE PROYECTO_VEE	L1T1-INT-CE-23-1510	28/03/2023	EXT23-0005336	Aprobado por Enel – Colombia ESP. Con No Objeción Condicionada. Comunicado 1500234964
ML1-TRN-014910	14/03/2023	TELECOMUNICACIONES - INFORME DE DISEÑO DE REDES_VEE – TRAMO 1	L1T1-INT-CE-23-1530	30/03/2023	EXT23-0005470	Planos firmados en señal de Aprobación por ETB el 25/11/2022.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 33 de 104	

TRANSMISIÓN ML1	FECHA	ASUNTO	NO OBJECIÓN INTERVENTORIA	FECHA	RADICADO EMB	ESTADO RESPECTO A LA ESP
						MOVISTAR no tiene redes en el tramo. TIGO-UNE no tiene redes en el tramo.
ML1-TRN-015029	18/03/2023	DISEÑO DE FOTOMETRIA DE ALUMBRADO PUBLICO – TRAMO 5_SUBTRAMO NO PRIORIZADO-VCC.	L1T1-INT-CE-23-1709	11/09/2023	EXT23-0006028	La UAESP con oficio 20234000092931 emitió la Aprobación.
ML1-TRN-015269	20/03/2023	DISEÑO DE FOTOMETRIA DE ALUMBRADO PUBLICO – TRAMO 5 SUBTRAMO PRIORIZADO-VEE	L1T1-INT-CE-23-1736	12/04/2023	EXT23-0006124	La UAESP con oficio 20234000092931 emitió la Aprobación.
ML1-TRN-015029	18/03/2023	DISEÑO DE FOTOMETRIA DE ALUMBRADO PUBLICO – TRAMO 5 – SUBTRAMO NO PRIORIZADO-VCC	L1T1-INT-CE-23-1709	11/04/2023	EXT23-0006028	La UAESP con oficio 20234000106611 emitió la Aprobación.
ML1-TRN-015285	21/03/2023	TRAMO 6 - INFORME DISEÑO DE FOTOMETRÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO – SUBTRAMO PRIORIZADO-VEE	L1T1-INT-CE-23-1759	13/04/2023	EXT23-0006219	La UAESP con oficio 20234000087241 emitió la Aprobación.
ML1-TRN-015286	21/03/2023	TRAMO 6 - SUBTRAMO NO PRIORIZADO - INFORME DE DISEÑO DE FOTOMETRIA DE ALUMBRADO PUBLICO-VCC	L1T1-INT-CE-23-1884	19/04/2023	EXT23-0006518	La UAESP con oficio 202340000 98881 emitió la Aprobación
ML1-TRN-015339	21/03/2023	DISEÑO DE FOTOMETRIA DE ALUMBRADO PUBLICO – TRAMO 4- VEE	L1T1-INT-CE-23-1693	10/04/2023	EXT23-0005975	La UAESP con oficio 202340000 98871 emitió la Aprobación
ML1-TRN-01578	24/03/2023	TRAMO 1 – GAS NATURAL - DISEÑO DE REDES - MODELO DE DISEÑO-VDD	L1T1-INT-CE-23-1810	14/04/2023	EXT23-0006325	Aprobado Vanti con el comunicado 10153620-1320-2023.
ML1-TRN-016796	24/04/2023	INFORME DE DISEÑOS DE LAS OBRAS DE GAS NATURAL PARA LA PRIMERA LINEA DEL SISTEMA METRO - TRAMO 2-VDD	L1T1-INT-CE-23-2433	24/05/2023	EXT23-0008673	VANTI dio la aprobación el 2023/08/14 con el comunicado 10153620-1535-2023.
ML1-TRN-017023	3/05/2023	TRAMO 3 – REDES SECAS – ENERGIA SERE 1 INFORME DE PROYECTO-VEE	L1T1-INT-CE-23-2279	11/05/2023	EXT23-0007952	ENEL envió carta de No Objeción condicionada el 2023/07/28 factibilidad 1500117210 caso 1500268437 2023-02-15

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 34 de 104	

TRANSMISIÓN ML1	FECHA	ASUNTO	NO OBJECCIÓN INTERVENTORIA	FECHA	RADICADO EMB	ESTADO RESPECTO A LA ESP
ML1-TRN-017009	5/05/2023	TRAMO 3 INFORME DE DISEÑOS DE LAS OBRAS DE GAS NATURAL PARA LA PRIMERA LINEA DEL SISTEMA METRO - TRAMO 3-VCC	L1T1-INT-CE-23-2150	4/05/2023	EXT23-0007453	VANTI dio la aprobación el 2023/08/14 con el comunicado 10153620-1536-2023.
ML1-TRN-017110	9/05/2023	INFORME DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES - TRAMO 3 – VEE	L1T1-INT-CE-23-2399	18/05/2023	EXT23-0008409	Planos firmados en señal de Aprobación por: a) ETB el 23/06/2023, b) Movistar 11/07/2023, c) TIGO-UNE el 29/06/2023.
ML1-TRN-017443	11/05/2023	TRAMO 4 – REDES DE GAS - INFORME DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS-VDD	L1T1-INT-CE-23-2499	26/05/2023	EXT23-0008919	Aprobado Vanti mediante comunicado 10153620-1673-2023.
ML1-TRN-017568	16/05/2023	TRAMO 2 - REDES SECAS - ENERGIA SERIE 1 - INFORME DE PROYECTO- VEE	1T1-INT-CE-23-2434	24/05/2023	EXT23-0008675	No Objeción condicionada por Enel-Colombia No. 1500116674 – 2023-07-28.
ML1-TRN-017671	16/05/2023	TRAMO 4 - REDES SECAS - INFORME DE DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES – VEE	L1T1-INT-CE-23-2655	8/06/2023	EXT23-0009810	Planos firmados en señal de Aprobación por a) ETB el 10/07/2023, b) Movistar 23/01/2024, c) TIGO-UNE el 23/01/2024
ML1-TRN-016765 ML1-TRN-017800	18/05/2023	TRAMO 5 – REDES SECAS - SUBTRAMO NO PRIORIZADO - INFORME DE DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES – VCC	L1T1-INT-CE-23-2293 L1T1-INT-CE-23-2842	12/05/2023 21/06/2023	EXT23-0008036 EXT23-0010587	ENEL envió carta de aprobación EL 2023/12/14 FACTIBILIDAD 15000000548 CASO 1500412199-2023-12-14
ML1-TRN-016293 ML1-TRN-017796	18/05/2023	REDES SECAS – TRAMO 5.1 SUBTRAMO PRIORIZADO – PROYECTO SERIE 1- VDD	L1T1-INT-CE-23-2817	21/06/2023	EXT23-0010526	ENEL-COLOMBIA dio aprobación el 2023/11/23 factibilidad 1500000548 CASO 15004062492023-11-23
ML1-TRN-013616 ML1-TRN-017801	23/05/2023 19/05/2023	TRAMO 5 – REDES SECAS - SUBTRAMO PRIORIZADO - INFORME DE DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES – VCC	L1T1-INT-CE-23-0873 L1T1-INT-CE-23-2681	22/02/2023 9/06/2023	EXT23-0002908 EXT23-0009915	Planos firmados en señal de Aprobación por: a) ETB el 27/10/2023, b) Movistar 23/01/2024, c) TIGO-UNE el 23/01/2024.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 35 de 104	

TRANSMISIÓN ML1	FECHA	ASUNTO	NO OBJECCIÓN INTERVENTORIA	FECHA	RADICADO EMB	ESTADO RESPECTO A LA ESP
						Versión V00 en Aconex.
ML1-TRN-016765	24/04/2023	TRAMO 5 – REDES SECAS - SUBTRAMO NO PRIORIZADO	L1T1-INT-CE-23-2293	12/05/2023	EXT23-0008036	Planos firmados en señal de Aprobación por a) ETB el 27/10/2023, b) Movistar 23/01/2024, c) TIGO-UNE el 23/01/2024.
ML1-TRN-017805	19/05/2023	- INFORME DE DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES – VCC	L1T1-INT-CE-23-2877	26/06/2023	EXT23-0010797	
ML1-TRN-017898	19/05/2023	TRAMO 5 SUBTRAMO PRIORIZADO - REDES DE GAS - DISEÑO DE REDES - VCC	L1T1-INT-CE-23-2639	7/06/2023	EXT23-0009703	Aprobado Vanti mediante comunicado 10153620-1673-2023
ML1-TRN-017898 Y ML1-TRN-012187	19/05/2023	TRAMO 5 SUBTRAMO NO PRIORIZADO - REDES DE GAS - DISEÑO DE REDES - VCC	L1T1-INT-CE-23-2668	8/06/2023	EXT23-0009825	Aprobado Vanti mediante comunicado 10153620-1673-2023
ML1-TRN-018260	29/05/2023	REDES SECAS - INFORME DE DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES TRAMO 6 – SUBTRAMO PRIORIZADO-VDD	L1T1-INT-CE-23-2762	16/06/2023	EXT23-0010345	Planos firmados en señal de Aprobación por: a) ETB el 18/10/2023. b) Movistar 23/01/2024, c) TIGO-UNE el 23/01/2024.
ML1-TRN-018265	30/05/2023	TRAMO 6 - REDES SECAS - SUBTRAMO NO PRIORIZADO - INFORME DE DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES-VDD	L1T1-INT-CE-23-2880	26/06/2023	EXT23-0010803	Planos firmados en señal de Aprobación por: a) ETB el 18/10/2023. b) Movistar 23/01/2024, c) TIGO-UNE el 23/01/2024.
ML1-TRN-016709	29/05/2023	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 - TRAMO 6 – SUBTRAMO NO PRIORIZADO-VCC	L1T1-INT-CE-23-2899	26/06/2023	EXT23-0010868	Enel-Colombia emitió la aprobación de la Versión V00 con la factibilidad 1500116674. caso 1500410366 2023-12-27
ML1-TRN-018267						
ML1-TRN-016534	13/04/2023	TRAMO 6 SUBTRAMO PRIORIZADO – INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1	L1T1-INT-CE-23-2101	28/04/2023	EXT23-0007173	Enel- Colombia envió carta de aprobación el 2023/12/12. Factibilidad 1500116674 - Caso 150041037.
ML1-TRN-019015	14/06/2023		L1T1-INT-CE-23-2848	22/06/2023	EXT23-0010654	

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 36 de 104	

TRANSMISIÓN ML1	FECHA	ASUNTO	NO OBJECIÓN INTERVENTORIA	FECHA	RADICADO EMB	ESTADO RESPECTO A LA ESP
ML1-TRN-018397 ML1-TRN-012188	1/06/2023	INFORME DE DISEÑOS DE LAS OBRAS DE GAS NATURAL PARA LA PRIMERA LINEA DEL SISTEMA METRO - TRAMO 6 – SUBTRAMO NO PRIORIZADO – VCC	L1T1-INT-CE-23-2851	22/06/2023	EXT23-0010671	Vanti firmo planos en señal de aprobación el 2023/12/11
ML1-TRN-018397 ML1-TRN-013681	1/06/2023	TRAMO 6 - GAS NATURAL - INFORME DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS - SUBTRAMO PRIORIZADO - VCC	L1T1-INT-CE-23-2908	27/06/2023	EXT23-0011017	Vanti firmo planos en señal de aprobación el 2023/12/11
ML1-TRN-019649	30/06/2023	TRAMO 4 - INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1-VFF	L1T1-INT-CE-23-3045	06/07/2023	EXT23-0011506	Aprobado por Enel-Colombia. Caso 1500403935-2023-12-22.
ML1-TRN-022356	3/10/2023	TRAMO 2 - INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 6 SAP 2-VCC	L1T1-INT-CE-23-4559	26/10/2023	EXT23-0017895	Objetado
ML1-TRN-022360	3/10/2023	TRAMO 2 - INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 6 SAP 3-VCC	L1T1-INT-CE-23-4560	23/10/2023	EXT23-0017897	Objetado
ML1-TRN-022246	28/09/2023	DISEÑO DE FOTOMETRIA INTERSECCION CARRERA 50 CON AVENIDA 1 DE MAYO	L1T1-INT-CE-23-4462	19/10/2023	EXT23-0017453	Objetado
ML1-TRN-022846	23/10/2023	REDES DE ENERGIA ELECTRICA TRAMO 2_VCC Proyectos Serie 4	L1T1-INT-CE-23-4922	29/11/2023	EXT23-0019562	(8 CD) Objetados
ML1-TRN-022846	23/10/2023	REDES DE ENERGIA ELECTRICA TRAMO 2_VCC Proyectos Serie 4	L1T1-INT-CE-23-4932	30/11/2023	EXT23-0019603	(11 CD) No Objetados
ML1-TRN-023007	23/10/2023	INTERSECCION CARRERA 50 CON AVENIDA 1 DE MAYO - REDES DE GAS - INFORME DE DISEÑO	L1T1-INT-CE-23-4909	22/11/2023	EXT23-0019491	Objetado
ML1-TRN-024389	14/12/2023	INTERSECCION CARRERA 50 CON AVENIDA 1 DE MAYO - REDES SECAS - INFORME DE DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES - VBB	L1T1-INT-CE-24-0188	18/01/2024	EXT24-0000815	Objetado
ML1-TRN-025026	12/01/2024	CON-INT_TRAMO 3 -REDES SECAS - ENERGIA -SERIE 4 Y SERIE 5_VCC	L1T1-INT-CE-24-0363	29/01/2024	EXT24-0001549	No Objetado
ML1-TRN-026411	27/02/2024	TRAMO 3 - DISEÑO REDES SECAS SERIE 3_VCC	L1T1-INT-CE-24-1129	12/03/2024	EXT24-0004506	No Objetado

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 37 de 104	

TRANSMISIÓN ML1	FECHA	ASUNTO	NO OBJECIÓN INTERVENTORIA	FECHA	RADICADO EMB	ESTADO RESPECTO A LA ESP
ML1-TRN-026412	27/02/2024	TRAMO 2 - DISEÑO REDES SECAS SERIE 3_VCC	L1T1-INT-CE-24-1284	20/03/2024	EXT24-0005038	5 proyecto No Objetados por la Interventoría
ML1-TRN-026412	27/02/2024	TRAMO 2 - DISEÑO REDES SECAS SERIE 3_VCC	L1T1-INT-CE-24-1275	20/03/2024	EXT24-0004994	1 proyecto Objetado por la Interventoría.
ML1-TRN-026959	21/03/2024	TRAMO 1 - REDES SECAS – ALUMBRADO PUBLICO - INFORME DE DISEÑO DE FOTOMETRIA_V01	N.A.	N.A.		La UAESP con oficio 20224000 225071 emitió la Aprobación
ML1-TRN-026962	21/03/2024	DISEÑO DE FOTOMETRIA DE ALUMBRADO PUBLICO – TRAMO 2_V00	N.A.	N.A.		La UAESP con oficio 20224000241471 emitió la Aprobación.
ML1-TRN-027013	21/03/2024	TRAMO 3 - REDES SECAS – ALUMBRADO PUBLICO - INFORME DE DISEÑO DE FOTOMETRIA-V00	N.A.	N.A.		La UAESP con oficio 20224000 179601 Aprobó el Proyecto fotométrico.
ML1-TRN-027015	26/03/2024	TRAMO 4 - REDES SECAS - INFORME DE DISEÑO DE FOTOMETRIA DE ALUMBRADO PUBLICO-V00	N.A.	N.A.		La UAESP con oficio 202340000 98871 emitió la Aprobación.
ML1-TRN-027016	26/03/2024	TRAMO 5 - REDES SECAS - INFORME DISEÑO DE FOTOMETRIA DE ALUMBRADO PUBLICO - SUBTRAMO PRIORIZADO-V00	N.A.	N.A.		La UAESP con oficio 20234000092931 emitió la Aprobación.
ML1-TRN-027018	26/03/2024	TRAMO 5 – REDES SECAS – INFORME DE DISEÑO DE FOTOMETRIA DE ALUMBRADO PUBLICO - SUBTRAMO NO PRIORIZADO -V00	N.A.	N.A.		La UAESP con oficio 20234000092931 emitió la Aprobación.
ML1-TRN-027019	26/03/2024	TRAMO 6 – REDES SECAS – INFORME DE DISEÑO DE FOTOMETRIA DE ALUMBRADO PUBLICO - SUBTRAMO NO PRIORIZADO-V00	N.A.	N.A.		La UAESP con oficio 202340000 98881 emitió la Aprobación.
ML1-TRN-027014	26/03/2024	TRAMO 6 - REDES SECAS – ALUMBRADO PUBLICO - INFORME DE DISEÑO DE FOTOMETRIA – SUBTRAMO PRIORIZADO-V00	N.A.	N.A.		La UAESP con oficio 20234000087241 emitió la Aprobación.
ML1-TRN-027134	03/04/2023	DISEÑO DE FOTOMETRIA INTERSECCION CARRERA 50 CON AVENIDA 1 DE MAYO	L1T1-INT-CE-24-1569	09/04/2024	EXT24-0006074	La UAESP con oficio 20244000014321 emitió la Aprobación.
ML1-TRN-027498	16/04/2024	REDES DE ENERGIA ELECTRICA TRAMO 2_VDD	En revisión			

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 38 de 104	

TRANSMISIÓN ML1	FECHA	ASUNTO	NO OBJECCIÓN INTERVENTORIA	FECHA	RADICADO EMB	ESTADO RESPECTO A LA ESP
ML1-TRN-027504	16/04/2024	TRAMO 3 -REDES SECAS - ENERGIA -SERIE 4_VBB	No Objetado	En trámite		
ML1-TRN-027622	19/04/2024	REDES DE ENERGIA ELECTRICA SERIE 4 WF5_VBB	En revisión			
ML1-TRN-027628	19/04/2024	INTERSECCION CARRERA 50 CON AVENIDA 1 DE MAYO - REDES DE GAS - INFORME DE DISEÑO	En revisión			
ML1-TRN-027975	26/04/2024	CON-INT_REDES SECAS ENERGIA ELECTRICA SERIE 1 INTERSECCION CARRERA 50_VBB	En revisión			

Tabla 1.2.8-6. Estado actual de los diseños respecto a las ESP.

Avances Redes Secas en Diseño

En el periodo el Concesionario/ML1 desarrolló las actividades para los diferentes tramos que componen el proyecto presentadas en este reporte, esto tomando como línea base los requerimientos técnicos mínimos contenidos en el contrato de Concesión, el Apéndice Técnico 3, el Apéndice Técnico 4 Anexo y el Apéndice 13. Para los tramos 1 al 6 del viaducto ferroviario principal; de acuerdo con lo referido en la tabla anterior; la interventoría ejercida por el CSPLMB hizo el seguimiento a los diseños.

En la siguiente tabla se informa sobre el avance que se observa a los diseños principales de redes de infraestructura de obra civil para: a) Protección y Traslado de redes de gas natural y b) Protección, Traslado y/o soterramiento de redes secas (energía, telecomunicaciones) contenida en i) Proyectos Serie 1 de Enel-Colombia, ii) Proyectos de redes de ETB, iii) Proyectos de redes de Movistar y iv) Proyectos de redes de Tigo-Une.

ACTIVIDAD	DISEÑOS PRINCIPALES DE REDES SECAS	AVANCE (%)
WF1(K0+000 - K3+642). Según Plan de Ejecución V11. Entrega de diseños P-163090		
Estudio Fotométrico	Versión VDD-No Objetado EXT22-0015355. Aprobado UAESP el 30/09/2022 con radicado 20224000225071. Versión V01 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-026959. El Concesionario está tramitando la revalidación.	100
Proyecto Serie 1	Versión VEE- No Objetado EXT23-0005336.No Objeción condicionada por Enel-Colombia No. Caso 1500264964 – 14-03-2023. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-01746. En trámite entrega a Enel-Colombia para recibir la Aprobación de la ESP.	100

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 39 de 104	

ACTIVIDAD	DISEÑOS PRINCIPALES DE REDES SECAS	AVANCE (%)
Telecomunicaciones	Versión VEE - No Objetado- EXT23-0005740. Cuenta con Aprobación de las ESP (ETB-MOVISTAR Y TIGO-UNE). Planos firmados en señal de Aprobación por ETB el 25/11/2022. MOVISTAR no tiene redes en el tramo. TIGO-UNE no tiene redes en el tramo. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-017593.	100
VANTI (Gas Natural)	Versión VDD – No Objetado. EXT23-0006325. Aprobado Vanti el 08/03/2023 con el comunicado 10153620-1320-2023. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-020630.	100
WF2(K3+642 - K7+830). Según Plan de Ejecución V11. Entrega de diseños P-163190		
Estudio Fotométrico	Versión VEE-No Objetado EXT22-0016299. Aprobado UAESP el 30/09/2022 con radicado 20224000241471. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-026962.	100
Proyecto Serie 1	Versión VEE- No Objetado EXT23-0008675. No Objeción condicionada por Enel-Colombia No. 1500116674 – 2023-07-28. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-020751. En trámite entrega a Enel-Colombia para recibir la Aprobación de la ESP.	100
Telecomunicaciones	Versión VCC - No Objetado- EXT23-0017433. Cuenta con Aprobación de las ESP (ETB-MOVISTAR Y TIGO-UNE). Planos firmados en señal de Aprobación por: a) ETB el 12/12/2022, b) Movistar 10/07/2023, c) TIGO el 07/03/2023. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-020743.	100
VANTI (Gas Natural)	Versión VDD – No Objetado. EXT23-0008673. Aprobado Vanti el 14/08/2023 con el comunicado 10153620-1535-2023. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-020874.	100
WF3(K7+830 - K12+033). Según Plan de Ejecución V11. Entrega de diseños P-165630		
Estudio Fotométrico	Versión VEE-No Objetado EXT22-0012047. Aprobado por la UAESP el 10/08/2022 con radicado 20224000179601. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-027013. Para la intersección Carrera 50 con Avenida 1° de Mayo, la Versión VBB enviada por ML1 con la transmisión ML1-TRN-022246. Fue Objetada por la interventoría con el radicado EXT23-0017423.	100
Proyecto Serie 1	Versión VEE- No Objetado EXT23-0007952. No Objeción Condicionada por Enel-Colombia Caso No. 1500268437 – 2023-07-28. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-021613. En trámite entrega a Enel-Colombia para recibir la Aprobación de la ESP. El Proyecto Serie 1 de la intersección Carrera 50 con Avenida 1° de Mayo, está en proceso de entrega en su versión VBB por parte del Concesionario.	100
Telecomunicaciones	Versión VEE - No Objetado- EXT23-0008409. Cuenta con Aprobación de las ESP (ETB-MOVISTAR Y TIGO-UNE). Planos firmados en señal de Aprobación por: ETB el 23/06/2023, b) Movistar 11/07/2023, c) TIGO-UNE el 29/06/2023. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-020723. El Proyecto redes de telecomunicaciones en versión VBB de la intersección Carrera 50 con Avenida 1° de Mayo enviado por ML1 con la transmisión ML1-TRN- 024389. Este fue objetado por la interventoría con radicado EXT24-0000815.	100

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 40 de 104	

ACTIVIDAD	DISEÑOS PRINCIPALES DE REDES SECAS	AVANCE (%)
VANTI (Gas Natural)	Versión VCC – No Objetado. EXT23-0007453. Aprobado por Vanti el 14/08/2023 con el comunicado 10153620-1536-2023. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-021647. El Proyecto redes de gas natural en versión VBB de la intersección Carrera 50 con Avenida 1° de Mayo, fue objetado por la interventoría con el radicado EXT23-0019491.	100
WF4(K12+033 - K16+374). Según Plan de Ejecución V11. Entrega de diseños P-163350		
Estudio Fotométrico	Versión VEE-No Objetado EXT23-0005975. Aprobado UAESP el 26/04/2023 con radicado 20234000098871. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-027015.	100
Proyecto Serie 1	Versión VFF- No Objetado EXT23-0011506. Enel-Colombia envió carta de Aprobación el 2023/12/22. Factibilidad 1500116587, caso 1500403935-2023-12-22. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-025862	100
Telecomunicaciones	Versión VEE - No Objetado- EXT23-0009810. Cuenta con Aprobación de las ESP (ETB-MOVISTAR Y TIGO-UNE). Planos firmados por a) ETB el 10/07/2023, b) Movistar 23/01/2024, c) TIGO-UNE el 23/01/2024. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-025885.	100
VANTI (Gas Natural)	Versión VDD – No Objetado. EXT23-0008919. Aprobado Vanti el 20/11/2023 mediante comunicado 10153620-1673-2023. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-022869.	100
WF5(K16+374 - K19+830). Según Plan de Ejecución V11. Entrega de diseños P-163430		
Estudio Fotométrico	WF5-1. Versión VEE- No Objetado EXT23-0006214. Aprobado UAESP el 19/04/2023 con radicado 20234000092931. Versión V00 en plataforma Aconex con transmisión ML1-TRN-027016. WF5-2. Versión VCC-No Objetado EXT23-0006028. Aprobado UAESP el 28/04/2023 con radicado 20234000106611. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-027018.	100
Proyecto Serie 1	WF5-1. Versión VDD No Objetado EXT23-0010526. Enel-Colombia envió carta de aprobación el 2023/11/23 vía correo electrónico para la factibilidad 1500000548. Caso 1500406249. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-025954. WF5-2. Versión VCC No Objetado EXT23-0010587. Enel-Colombia envió carta de Aprobación el 2023/12/14. Factibilidad 1500000548. Caso 1500412199. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-025958.	100
Telecomunicaciones	WF5-1. No Objetado- EXT23-0009915. Cuenta con Aprobación de las ESP (ETB-MOVISTAR Y TIGO-UNE). Planos firmados por: a) ETB el 27/10/2023, b) Movistar 23/01/2024, c) TIGO-UNE el 23/01/2024. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-025948. WF5-2. No Objetado- EXT23-0010797. Cuenta con Aprobación de las ESP (ETB-MOVISTAR Y TIGO-UNE). Planos firmados por a) ETB el 27/10/2023, b) Movistar 23/01/2024, c) TIGO-UNE el 23/01/2024. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-025951.	100

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA			
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.			
Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 41 de 104	

ACTIVIDAD	DISEÑOS PRINCIPALES DE REDES SECAS	AVANCE (%)
VANTI (Gas Natural)	WF5-1. Versión VCC – No Objetado EXT23-0009703. Aprobado Vanti el 08/08/2023 mediante comunicado 10153620-1673-2023. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-022894. WF5-2. Versión VCC – No Objetado EXT23-0009825. Aprobado Vanti el 08/08/2023 mediante comunicado 10153620-1673-2023. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-022894.	100
WF6(K19+830 - K23+864). Según Plan de Ejecución V11. Entrega de diseños P-163510		
Estudio Fotométrico	WF6-1. Versión VCC- No Objetada EXT23-0006518. WF6-1. Aprobado UAESP el 26/04/2023 oficio 20234000098881. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-027019. WF6-2. Versión VEE-No Objetado EXT23-0006219. Aprobado UAESP el 13/04/2023 con oficio 20234000087241. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-027014.	100
Proyecto Serie 1	WF6-1. Versión VCC No Objetado EXT23-0010868. Enel- Colombia envió carta de aprobación el 2023/12/27. Factibilidad 1500116674 - Caso 1500410366. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-026016. WF6-2. Versión VDD No Objetado EXT23-0010654. Enel- Colombia envió carta de aprobación el 2023/12/12. Factibilidad 1500116674 - Caso 150041037. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-026053.	100
Telecomunicaciones	WF6-1. No Objetado- EXT23-0010803. Cuenta con Aprobación de las ESP (ETB-MOVISTAR Y TIGO-UNE). Planos firmados por: a) ETB el 18/10/2023, b) Movistar 23/01/2024, c) TIGO-UNE el 23/01/2024. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-026024. WF6-2. No Objetado- EXT23-0010345. Cuenta con Aprobación de las ESP (ETB-MOVISTAR Y TIGO-UNE). Planos firmados por ETB el 18/10/2023. b) Movistar 23/01/2024, c) TIGO-UNE el 23/01/2024. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-026054.	100
VANTI (Gas Natural)	WF6-1. Versión VBB – No Objetado EXT23-0010671. Vanti firmo planos en señal de aprobación el 2023/12/11. Pendiente envío del Oficio de aprobación de Vanti. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-026131. WF6-2. Versión VCC – No Objetado EXT23-0011017. Vanti firmo planos en señal de aprobación el 2023/12/11. Pendiente envío del Oficio de aprobación de Vanti. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-026131.	100

Tabla 1.2.8-7. Avance diseños redes secas, seguimiento según el Plan de Ejecución V11- discriminado por tramo.

Los Proyectos Serie 1 listados en la tabla anterior deben ser actualizados por el Concesionario de acuerdo al comunicado del CSPLMB código L1T1-INT-CE-24-0201 con radicado EXT24-0000912; en el que se solicitó a ML1 la actualización de los Proyectos Serie 1, incluyendo los requerimientos de expansiones realizados por Enel-Colombia; usando las líneas base del urbanismo actualizadas atendiendo las observaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y del Instituto Distrital de

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 42 de 104	

Patrimonio Cultural (IDPC, sin estas actualizaciones en los diseños impliquen un costo adicional que deba ser asumido por la EMB.

En la siguiente tabla se informa sobre el avance que se observa en los diseños de redes eléctricas para Enel-Colombia. Los proyectos Serie 3, Serie 4, Serie 5 y Serie 6 (SAP) los cuales está finiquitando el Concesionario con arreglo a la No objeción por parte de la Interventoría para tramitar ante Enel-Colombia la aprobación de los Proyectos Serie 1. La entrega oficial de estos diseños al Operador de Red la efectuará el Concesionario una vez Enel-Colombia de la Aprobación o la No objeción Condicionada a los Proyectos Serie 1 para cada tramo. No Obstante, el Concesionario está programando mesas de trabajo con el Operador de Red y con la Interventoría para presentar los avances de estos diseños.

ACTIVIDAD	DISEÑOS DE REDES ELECTRICAS PARA SE APROBADAS POR ENEL-COLOMBIA	AVANCE (%)
WF1(K0+000 - K3+642)		
Proyecto Serie 1	Versión VEE- No Objetado EXT23-0005336. No Objeción condicionada por Enel-Colombia No. 1500264964 – 2023-01-20. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-01746.	100
Enel-Colombia (Proyecto Serie 3) *	Están pendiente de entrega por ML1 los Proyectos Serie 3 para las Estaciones de la PLMB.	90
Enel-Colombia (Proyectos Serie 4) *	En el WF1 no se requiere elaborar proyectos Serie 4. Está pendiente por definir con el IPES si efectivamente se instalarán quioscos del Programa REDEP-IPES.	N.A.
Enel-Colombia (Proyectos Serie 5) *	En el WF1 no se requiere elaborar proyectos Serie 5.	N.A.
Enel-Colombia (Proyectos Serie 6) *	Versión VBB del Proyecto SAP1. Objetada por la interventoría el 11/04/2023 con radicado EXT23-0006036.El Concesionario está corrigiendo los diseños de acuerdo con consultas que está haciendo con la UAESP para revalidar el Estudio Fotométrico por cambios en urbanismo.	100
WF2(K3+642 - K7+830)		
Proyecto Serie 1	Versión VEE- No Objetado EXT23-0008675. No Objeción condicionada por Enel-Colombia No. 1500116674 – 2023-07-28. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-020751.	100
Enel-Colombia (Proyecto Serie 3) *	El Concesionario el 27/02/2024 con la Transmisión ML1-TRN-026412 hizo entrega de la Versión VCC de los Proyectos Serie 3. los diseños de acuerdo con la revalidación del Serie 1. La Interventoría Emitió la No Objeción a 5 Proyectos Serie 3 y objeto 1 Proyecto Serie 3 con los radicados EXT24-0005038 y EXT24-0004994. Solo están pendiente de entrega por ML1 los Proyectos Serie 3 para las BRT y para las Estaciones de la PLMB	100
Enel-Colombia (Proyectos Serie 4) *	La interventoría objetó la versión VCC del de ocho (8) proyectos el 23/11/2023 con radicado EXT23-0019562. El Concesionario está corrigiendo los diseños.	100

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 43 de 104	

ACTIVIDAD	DISEÑOS DE REDES ELECTRICAS PARA SE APROBADAS POR ENEL-COLOMBIA	AVANCE (%)
	La interventoría emitió la No Objeción a once (11) proyectos el 23/11/2023 con radicado EXT23-0019603.	
Enel-Colombia (Proyectos Serie 5) *	En el WF2 no se requiere elaborar proyectos Serie 5.	N.A.
Enel-Colombia (Proyectos Serie 6) *	Versión VCC del SAP 2 objetada por la interventoría el 26/10/2023 con radicado EXT23-0017895. Versión VCC del SAP3 objetada por la interventoría el 26/10/2023 con radicado EXT230017897. El Concesionario está corrigiendo los diseños de acuerdo con consultas que está haciendo con la UAESP para revalidar el Estudio Fotométrico por cambios en urbanismo.	100
WF3(K7+830 - K12+033)		
Proyecto Serie 1	Versión VEE- No Objetado EXT23-0007952. No Objeción Condicionada por Enel-Colombia No. 1500268437 – 2023-02-15. Versión V00 en plataforma Aconex con la transmisión ML1-TRN-021613.	100
Proyecto Serie 1 Carrera 50	El 26/04/2024 el Concesionario radicó Proyecto Serie1 para la carrera 50 con transmisión ML1-TRN-027975. La interventoría está en proceso de revisión	100
Enel-Colombia (Proyecto Serie 3) *	La interventoría emitió la No Objeción a la versión VCC del proyecto con radicados EXT24-0004506 y EXT24-0004506. El Concesionario está en proceso de radicar ante Enel-Colombia diseños. Solo están pendiente de entrega por ML1 los Proyectos Serie 3 para las BRT y para las Estaciones de la PLMB.	100
Enel-Colombia (Proyecto Serie 4) *	La interventoría el 29/01/2024 emitió la No objeción a la versión VCC del proyecto con el radicado EXT24-0001549. El Concesionario está corrigiendo los diseños.	100
Enel-Colombia (Proyecto Serie 5) *	La interventoría objetó la versión VBB del proyecto EL 18/10/2023 con radicado EXT23-0017322. El Concesionario está corrigiendo los diseños.	100
Enel-Colombia (Proyecto Serie 6) *	La interventoría objetó la versión VBB del SAP 4 y del SAP 5, el 11/04/2023 con radicado EXT23-0006025. El Concesionario está corrigiendo los diseños de acuerdo con consultas que está haciendo con la UAESP para revalidar el Estudio Fotométrico por cambios en urbanismo.	100
WF4(K12+033 - K16+374)		
Proyecto Serie 1	Versión VEE- No Objetado EXT23-0011506. Enel-Colombia envió carta de Aprobación el 2023/12/22. Factibilidad 1500116587, caso 1500403935-2023-12-22. La Versión V00 en plataforma Aconex pendiente.	100
Enel-Colombia (Proyecto Serie 3) *	De acuerdo con la Aprobación del Serie 1 emitida por Enel-Colombia; el Concesionario está terminando de ajustar los diseños para la entrega de la versión VBB a la interventoría.	90
Enel-Colombia (Proyecto Serie 4) *	De acuerdo con la Aprobación del Serie 1 emitida por Enel-Colombia; el Concesionario está terminando de ajustar los diseños para la entrega de la versión VBB a la interventoría.	90
Enel-Colombia (Proyecto Serie 5) *	En el WF4 no se requiere elaborar proyectos Serie 5.	N.A.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 44 de 104	

ACTIVIDAD	DISEÑOS DE REDES ELECTRICAS PARA SE APROBADAS POR ENEL-COLOMBIA	AVANCE (%)
Enel-Colombia (Proyecto Serie 6) *	De acuerdo con la Aprobación del Serie 1 emitida por Enel-Colombia; el Concesionario está terminando de ajustar los diseños para la entrega de la versión VBB a la interventoría.	90
WF5(K16+374 - K19+830)		
Proyecto Serie 1	WF5-1. Versión VDD No Objetado EXT23-0010526. Enel Colombia emitió carta de aprobación el 2023/11/23 para el Proyecto Serie 1 al que le correspondió la factibilidad 1500000548 y el número de caso 15004062492023-11-23. La Versión V00 en plataforma Aconex pendiente. WF5-2. Versión VCC No Objetado EXT23-0010587. Enel-Colombia envió carta de Aprobación el 2023/12/14. Factibilidad 1500000548. Caso 1500412199-2023-12-14. La Versión V00 en plataforma Aconex pendiente.	100
Enel-Colombia (Proyecto Serie 3) *	De acuerdo con la Aprobación del Serie 1 emitida por Enel-Colombia; el Concesionario está terminando de ajustar los diseños para la entrega de la versión VBB a la interventoría.	90
Enel-Colombia (Proyecto Serie 4) *	El 19/04/2024 el Concesionario radicó Proyecto Serie 4 con transmisión ML1-TRN-027622. La interventoría está en proceso de revisión	100
Enel-Colombia (Proyecto Serie 5) *	En el WF4 no se requiere elaborar proyectos Serie 5.	N.A.
Enel-Colombia (Proyecto Serie 6) *	De acuerdo con la Aprobación del Serie 1 emitida por Enel-Colombia; el Concesionario está terminando de ajustar los diseños para la entrega de la versión VBB a la interventoría.	90
WF6(K19+830 - K23+864)		
Proyecto Serie 1	WF6-1. Versión VCC No Objetado EXT23-0010868. Enel- Colombia envió carta de aprobación el 2023/12/27. Factibilidad 1500116674 - caso 1500410366-2023-12-27. La Versión V00 en plataforma Aconex pendiente. WF6-2. Versión VDD No Objetado EXT23-0007173. Enel- Colombia envió carta de aprobación el 2023/12/12. Factibilidad 1500116674 - caso 1500410377-2023-12-12. La Versión V00 en plataforma Aconex pendiente.	100
Enel-Colombia (Proyecto Serie 3) *	De acuerdo con la Aprobación del Serie 1 emitida por Enel-Colombia; el Concesionario está terminando de ajustar los diseños para la entrega de la versión VBB a la interventoría.	90
Enel-Colombia (Proyecto Serie 4) *	De acuerdo con la Aprobación del Serie 1 emitida por Enel-Colombia; el Concesionario está terminando de ajustar los diseños para la entrega de la versión VBB a la interventoría.	90
Enel-Colombia (Proyecto Serie 5) *	En el WF4 no se requiere elaborar proyectos Serie 5.	N.A.
Enel-Colombia (Proyecto Serie 6) *	De acuerdo con la Aprobación del Serie 1 emitida por Enel-Colombia; el Concesionario está terminando de ajustar los diseños para la entrega de la versión VBB a la interventoría.	90

Tabla 1.2.8-8. Avance acumulado Proyectos Serie 1, Serie 3, Serie 4, Serie 5 y Serie 6.

Aclaración: En la tabla anterior los productos identificados con el asterisco (*) corresponden a productos que no están identificados como Estudios y Diseños de Detalle Principales. De acuerdo con el Acta de Entendimiento No. 3 firmada por la EMB y el concesionario 2022/11/17.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 45 de 104		

Los diseños eléctricos (resaltados con un asterisco) presentados en la tabla anterior corresponden a los diseños diferentes de los de traslado de redes principales y hacen referencia a los traslados o subterranización de redes de baja tensión, así como de las acometidas a subestaciones eléctricas, y a las acometidas a predios. Los diseños de redes de telecomunicaciones (conductores de cable y conductores de fibra óptica) los elaboran las ESP de telecomunicaciones. Mientras que los proyectos: a) Serie 6 (Alumbrado público), b) Serie 3 (Subestaciones eléctricas por traslado de redes y Subestaciones eléctricas para acometidas a Estaciones BRT y para Estaciones de la PLMB), c) Serie 4 (Redes de baja tensión) y d) Serie 5 (Proyectos de traslado de transformadores) están en elaboración por parte del Concesionario.

En cuanto a los diseños para garantizar las acometidas eléctricas en baja tensión a los predios vecinos al Tramo 2, Tramo 3 y al Tramo 5; en la tabla anterior se muestran el estado actualizado de estos diseños. El seguimiento detallado se presenta en el Capítulo 2.6. (a) Redes Secas. Los avances de obra en los tramos WF1, WF2, WF3, WF4, WF5 y WF6; con corte a la presentación de este informe mensual se muestran a detalle en los numerales 2.2.35, 2.2.36, 2.3.37, 2.2.38, 2.2.39 y 2.240.

Informe detallado de Avance de los Proyectos Serie 1 para los tramos WF1 a WF6 y para las obras complementarias Intercambiador vial de la Calle 72 y puentes de la Avenida 68.

En la siguiente tabla se informa sobre el avance que se observa a los diseños de los Proyectos Serie 1 para los tramos WF1 a WF6, el Patio Taller y para las obras complementarias Intercambiador vial de la Calle 72 y puentes de la Avenida 68. Se resaltan en color azul la versión que recibió la No Objeción de la interventoría y en color verde los Proyectos Serie 1 que cuentan con la Aprobación de Enel-Colombia. En la columna de comentarios se muestra para los Proyectos Serie 1 No Objetados por la Interventoría, el estado en el que se encuentran en la revisión que ejecuta Enel-Colombia durante los procesos de revisión y de Aprobación por parte de la ESP.

TRANSMISION ML1	FECHA	NOMBRE	RESPUESTA INTERVENTORIA	FECHA	RADICADO EMB	COMENTARIO
ML1-TRN-001109	7/07/2021	MEMORIA DE CALCULO PROYECTO SERIE 1 - PATIO TALLER -VBB	L1T1-INT-CE-21-0496	12/07/2021	EXT23-0004736	Objetado por no cumplir con BIM pese a que en diseño de redes eléctricas cumple.
EN MESA DE TRABAJO		MEMORIA DE CALCULO PROYECTO SERIE 1 - PATIO TALLER	-----	14/07/2021	-----	En mesa de trabajo se dio la No Objeción y se solicitó el envío a Enel-Colombia para obtener la aprobación de Enel-Colombia.
ML1-TRN-001361		MEMORIA DE CALCULO PROYECTO SERIE 1 - PATIO TALLER- V00	-----	NO REQUIERE	-----	Aprobado por ENEL-COLOMBIA con el No. 02948938
ML1-TRN-001421	5/08/2021	MEMORIA DE CALCULO PROYECTO SERIE 1 - PATIO TALLER -VBB (VCC y VDD para algunos archivos BIM).	L1T1-INT-CE-21-0939	21/09/2021	EXT23-0007618	No Objetado por cumplir con el componente BIM

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 46 de 104	

TRANSMISION ML1	FECHA	NOMBRE	RESPUESTA INTERVENTORIA	FECHA	RADICADO EMB	COMENTARIO
ML1-TRN-000750	8/06/2021	INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 1 CALLE 72-VBB	CSPLMB-FT-OCI-005_L1T1-6220-541-CON-ED-ELM-IN-0001_VBB	8/06/2021	-----	Objetado
ML1-TRN-001131	12/07/2021	INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 1 CALLE 72-VCC	L1T1-INT-CE-21-0570	27/07/2021	EXT23-0005204	Objetado
ML1-TRN-001418	25/08/2021	INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 1 CALLE 72-VDD	L1T1-INT-CE-21-0798	28/08/2021	EXT23-0006636	Objetado
ML1-TRN-001509	7/09/2021	INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 1 CALLE 72-VEE	L1T1-INT-CE-21-0881	10/09/2021	EXT23-0007148	No Objetado
ML1-TRN-001570	17/09/2021	INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 1 CALLE 72-V00	-----	NO REQUIERE	-----	Aprobado por ENEL-COLOMBIA con el número 15000572 fechado el 2021/10/11
ML1-TRN-008678	29/09/2022	INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 1 CALLE 72-V01	-----	NO REQUIERE	-----	
ML1-TRN-007433	2/08/2022	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 - INTERSECCION AV 68_VBB	L1T1-INT-CE-22-2491	16/08/2022	EXT22-0010642	Objetado.
ML1-TRN-008324	15/09/2022	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 - INTERSECCION AV 68_VCC	L1T1-INT-CE-22-3099	3/10/2022		Objetado.
ML1-TRN-009259	16/10/2022	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 - INTERSECCION AV 68_VDD	L1T1-INT-CE-22-3364	25/10/2022	EXT22-0014584	No Objetado.
ML1-TRN-017299	8/05/2023	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 - INTERSECCION AV 68. V00	No requiere	-----	-----	Aprobado por Enel – Colombia ESP. Comunicado 1500200968
ML1-TRN-005996	1/06/2022	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 - TRAMO 3_VBB	L1T1-INT-CE-22-1969	29/06/2022	EXT22-0008482	Objetado.
ML1-TRN-007518	5/08/2022	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 - TRAMO 3_VCC	L1T1-INT-CE-22-2634	29/08/2022	EXT22-0011278	Objetado.
ML1-TRN-006064	10/06/2022	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 - TRAMO 1_VBB	L1T1-INT-CE-22-1994	5/07/2022	EXT22-0008634	Objetado.
ML1-TRN-007528	4/08/2022	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 – TRAMO 2_VBB	L1T1-INT-CE-22-2693	1/08/2022	EXT22-001151	Objetado.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 47 de 104	

TRANSMISION ML1	FECHA	NOMBRE	RESPUESTA INTERVENTORIA	FECHA	RADICADO EMB	COMENTARIO
ML1-TRN-008099	5/09/2022	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 – TRAMO 1_VCC	L1T1-INT-CE-22-3100	3/10/2022	EXT22-0013366	Objetado.
ML1-TRN-009078	10/10/2022	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 - TRAMO 4	L1T1-CON-CE-22-3529	8/11/2022	EXT22-0015354	Objetado.
ML1-TRN-009080	10/10/2022	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 – TRAMO 5 –SUBTRAMO PRIORIZADO 5-1_VBB	L1T1-CON-CE-22-3513	4/11/2022	EXT22-0015264	Objetado
ML1-TRN-009081	10/10/2022	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 – TRAMO 6.2– SUBTRAMO PRIORIZADO_VBB	L1T1-CON-CE-22-3574	11/11/2022	EXT22-0015607	Objetado
ML1-TRN-010948	15/11/2022	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 – TRAMO 2_VCC	L1T1-CON-CE-22-4166	20/12/2022	EXT22-0018150	Objetado.
ML1-TRN-012062	9/12/2022	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 – TRAMO 1	1T1-INT-CE-22-04373	29/12/2022	EXT22-0018874	Objetado.
ML1-TRN-012049	9/12/2022	SUBTRAMO NO PRIORIZADO 5-2 – INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1_VBB	L1T1-INT-CE-23-0177	11/01/2023	EXT23-0000496	Objetado.
ML1-TRN-012058	9/12/2022	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 - TRAMO 6 – SUBTRAMO NO PRIORIZADO 6-1_VBB	L1T1-INT-CE-23-0247	16/01/2023	EXT23-0000716	Objetado.
ML1-TRN-012082	9/12/2022	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 – TRAMO 3_VDD	L1T1-INT-CE-23-0068	4/01/2023	EXT23-0000217	Objetado.
ML1-TRN-013405	20/01/2023	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 – TRAMO 5 –SUBTRAMO PRIORIZADO_VCC	L1T1-INT-CE-23-0694	10/02/2023	EXT23-0002220	Objetado.
ML1-TRN-013592	26/01/2023	TRAMO 6 – SUBTRAMO PRIORIZADO – INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE1	L1T1-INT-CE-23-0790	16/02/2023	EXT23-0002581	Objetado.
ML1-TRN-014856	11/03/2023	TRAMO 1 - ENERGIA SERIE 1 - INFORME DE PROYECTO_VEE	L1T1-INT-CE-23-1510	28/03/2023	EXT23-0005336	No Objetado. Enel – Colombia dio No Objeción Condicionada. Comunicado identificado con el caso No. 1500234964

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 48 de 104	

TRANSMISION ML1	FECHA	NOMBRE	RESPUESTA INTERVENTORIA	FECHA	RADICADO EMB	COMENTARIO
ML1-TRN-015251	20/03/2023	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 – TRAMO4	L1T1-INT-CE-23-1941	21/04/2023	EXT23-0006311	OBJETADO. Con Viabilidad
ML1-TRN-015605	27/03/2023	TRAMO 2 - ENERGIA SERIE 1 - INFORME DE PROYECTO	L1T1-INT-CE-23-0006856	25/04/2023	EXT23-0006856	OBJETADO. Con Viabilidad
ML1-TRN-016288	5/05/2023	TRAMO 5 – SUBTRAMO NO PRIORIZADO – INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE1	L1T1-INT-CE-23-1979	24/04/2023	EXT23-0006776	OBJETADO. Con Viabilidad
ML1-TRN-016534	13/04/2023	TRAMO 6 SUBTRAMO PRIORIZADO – INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE1	L1T1-INT-CE-23-2101	28/04/2023	EXT23-0007173	OBJETADO. Con Viabilidad
ML1-TRN-016293	10/04/2023	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 – TRAMO 5 –SUBTRAMO PRIORIZADO	L1T1-INT-CE-23-2119	2/05/2023	EXT23-0007559	OBJETADO. Con Viabilidad
ML1-TRN-016709	19/04/2023	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 - TRAMO 6 – SUBTRAMO NO PRIORIZADO-VCC	L1T1-INT-CE-23-2305	8/05/2023	EXT23-0008109	OBJETADO. Con Viabilidad
ML1-TRN-017023	3/05/2023	TRAMO 3 – REDES SECAS – ENERGIA SERE 1 INFORME DE PROYECTO-VEE	L1T1-INT-CE-23-2279	11/05/2023	EXT23-0007952	NO OBJETADO. El 2023/07/28 Enel-Colombia emitió la No Objeción Condicionada identificada con el caso No. 1500268437 – 2023-02-15.
ML1-TRN-017446	10/05/2023	TRAMO 1 -REDES SECAS- ENERGIA - INFORME DE PROYECTO SERIE 1.- V00	No Requiere	14/03/2023	-----	NO OBJETADO. Enel – Colombia dio No Objeción Condicionada. Comunicado identificado con el caso No. 1500234964
ML1-TRN-017568	16/05/2023	TRAMO 2 - REDES SECAS - ENERGIA SERIE 1 - INFORME DE PROYECTO- VEE	1T1-INT-CE-23-2434	24/05/2023	EXT23-0008675	NO OBJETADO. El 28/07/2023 Enel-Colombia emitió la No Objeción condicionada por Enel-Colombia. Identificada con el caso No. 1500116674
ML1-TRN-017670	17/05/2023	TRAMO 4 - INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1-VEE	L1T1-INT-CE-23-2654	8/06/2023	EXT23-0009810	Objetado con Viabilidad
ML1-TRN-017800	18/05/2023	REDES SECAS – TRAMO 5 SUBTRAMO 5.2 NO PRIORIZADO REPORTE DE CANTIDADES PROYECTO SERIE 1-VCC	L1T1-INT-CE-23-2842	21/06/2023	EXT23-0010587	No Objetado. Aprobado por Enel-Colombia Factibilidad 1500000548 Caso No. 1500412199 - 2023-12-14

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 49 de 104	

TRANSMISION ML1	FECHA	NOMBRE	RESPUESTA INTERVENTORIA	FECHA	RADICADO EMB	COMENTARIO
ML1-TRN-016293 ML1-TRN-017796	18/05/2023	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 – TRAMO 5 –SUBTRAMO PRIORIZADO_VDD	L1T1-INT-CE-23-2119 L1T1-INT-CE-23-2817	21/06/2023	EXT23-0007259 EXT23-0010526	No Objetado. Enel Colombia emitió carta de aprobación el 2023/11/23; le correspondió la factibilidad 1500000548 y el número de caso 15004062492023-11-23.
ML1-TRN-018267	29/05/2023	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 - TRAMO 6 – SUBTRAMO NO PRIORIZADO 6.1 - VCC	L1T1-INT-CE-23-2899	26/06/2023	EXT23-0010868	No Objetado. Enel-Colombia emitió la aprobación de la Versión V00 con la factibilidad 1500116674. caso 1500410366 2023-12-27
ML1-TRN-018272 ML1-TRN-019015	30/05/2023	TRAMO 6 – REDES SECAS SUBTRAMO PRIORIZADO 6.2 – INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 - VDD	L1T1-INT-CE-23-2848	22/06/2023	EXT23-0010654	No Objetado. Enel-Colombia emitió la aprobación de la Versión V00 con la factibilidad 1500116674. caso 1500410377 2023-12-12.
ML1-TRN-019649	30/06/2023	TRAMO 4 - INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1-VFF	L1T1-INT-CE-23-3045	6/07/2023	EXT23-0011506	No Objetado. Aprobado por Enel-Colombia No. 1500116587 – 2023-12-22.

Tabla 1.2.8-9. Avance de los diseños de los Proyectos Serie 1

Informe detallado de Avance de los Proyectos Serie 3, Serie 6 (SAP), Serie 4 y Serie 5 para los tramos WF1 a WF6 y para las obras complementarias Intercambiador vial de la Calle 72 y puentes de la Avenida 68.

TRANSMISION ML1	FECHA	NOMBRE	RESPUESTA INTERVENTORIA	FECHA	RADICADO EMB	COMENTARIO
ML1-TRN-002520	4/01/2022	“INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 3 INT. CALLE 72-VBB	L1T1-INT-CE-22-0133	20/01/2022	EXT22-0000684	Objetado.
ML1-TRN-003401	15/02/2022	“INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 3 INT. CALLE 72-VCC	L1T1-INT-CE-22-0597	25/02/2022	EXT22-0002672	No Objeción. Aprobado por ENEL-COLOMBIA con el consecutivo No. 00230581 fechado el 2022/03/31
ML1-TRN-003402	15/02/2022	INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 6 SAP 12 CALLE 72”	L1T1-INT-CE-22-0627	1/03/2022	EXT22-0002850	No Objeción. Aprobado por ENEL-COLOMBIA con el consecutivo N°00230581 fechado el 2022/03/31

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 50 de 104	

TRANSMISION ML1	FECHA	NOMBRE	RESPUESTA INTERVENTORIA	FECHA	RADICADO EMB	COMENTARIO
ML1-TRN-012438	23/12/2022 15/05/2023	INTERSECCIÓN AV. CARACAS CON CALLE 72 - SERIE 4_VBB INTERSECCIÓN AV. CARACAS CON CALLE 72 - SERIE 4_VCC	L1T1-INT-CE-23-0358 L1T1-INT-CE-23-3429	3/01/2023 28/07/2023	EXT-0001042 EXT-0012884	Objetado.
ML1-TRN-017574 ML1-TRN-018593	6/06/2023	ALCANCE INTERSECCIÓN AV. CARACAS CON CALLE 72 - SERIE 4_VCC	L1T1-INT-CE-23-3429	28/07/2023	EXT23-0012884	Objetado.
ML1-TRN-021822	13/09/2023	INTERSECCIÓN AV. CARACAS CON CALLE 72 - SERIE 4_VDD	L1T1-INT-CE-23-4174	29/09/2023	EXT23-0016335	No Objetado El 2023/11/16 Enel-Colombia solicitó a ML1 actualizar los diseños Serie 4 de acuerdo a la versión V01 del Proyecto Serie 1 y sus modificaciones que ha tenido en obra. A la fecha el Concesionario está actualizando los diseños.
ML1-TRN-018829	9/06/2023	INTERSECCION AVENIDA 68 CON AVENIDA 1 MAYO INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 4 CD 751 Y CD-744-VBB	L1T1-INT-CE-23-3400	27/07/2023	EXT-0012806	Objetado.
ML1-TRN-018829	9/06/2023	INTERSECCION AVENIDA 68 CON AVENIDA 1 MAYO INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 5 CD CD-716-VBB	L1T1-INT-CE-23-3400	27/07/2023	EXT-0012806	Objetado. El Serie 5 está incluido en la transmisión ML1-TRN-018829 del Serie 4
ML1-TRN-021812	12/09/2023	INTERSECCION AVENIDA 68 CON AVENIDA 1 MAYO INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 4 CD 751 Y CD-744-VCC	L1T1-INT-CE-23-4172	28/09/2023	EXT23-0016317	No Objetado. El 2024/03/19 el Concesionario envió vía correo electrónico a Enel-Colombia los Proyectos Serie 4 de los CD-744 y CD-751.
ML1-TRN-015024	16/03/2023	TRAMO 1 - INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 6 SAP 1-VBB	L1T1-INT-CE-23-1711	10/04/2023	EXT23-0006036	Objetado.
ML1-TRN-015028	16/03/2023	TRAMO 2 - INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 6 SAP 2-VBB	L1T1-INT-CE-23-2294	12/05/2023	EXT23-0008044	Objetado.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 51 de 104	

TRANSMISION ML1	FECHA	NOMBRE	RESPUESTA INTERVENTORIA	FECHA	RADICADO EMB	COMENTARIO
ML1-TRN-015034	16/03/2023	TRAMO 2 - INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 6 SAP 3-VBB	L1T1-INT-CE-23-2432	24/05/2023	EXT23-0008672	Objetado.
ML1-TRN-022356	3/10/2023	TRAMO 2 - INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 6 SAP 2-VBB	L1T1-INT-CE-23-4559	26/10/2023		Objetado.
ML1-TRN-022360	3/10/2023	TRAMO 2 - INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 6 SAP 3-VBB	L1T1-INT-CE-23-4560	26/10/2023		Objetado.
ML1-TRN-015035	16/03/2023	TRAMO 3 INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 6 SAP 4 Y SAP 5	L1T1-INT-CE-23-1708	11/04/2023	EXT23-0006025	Objetado.
ML1-TRN-020627	28/07/2023	REDES DE ENERGIA ELECTRICA TRAMO 2_VBB (PROYECTOS SERIE 4)	L1T1-INT-CE-23-3805	1/09/2023	EXT23-0014694	Objetado.
ML1-TRN-021648	7/09/2023	TRAMO 2 - REDES SECAS PROYECTO SERIE 3_VBB	L1T1-INT-CE-23	11/10/2023	EXT23-0017025	Objetado
ML1-TRN-021715	11/09/2023	TRAMO 3 - DISEÑO REDES SECAS SERIE 3_VBB	L1T1-INT-CE-23-4352	11/10/2023	EXT23-0017028	Objetado
ML1-TRN-021876	14/09/2023	TRAMO 3 - REDES SECAS PROYECTO SERIE 4 Y SERIE 5_VBB	L1T1-INT-CE-23-4436	18/10/2023	EXT23-0017322	Objetado.
ML1-TRN-022846	23/10/2023	REDES DE ENERGIA ELECTRICA TRAMO 2_VCC (PROYECTOS SERIE 4)	L1T1-INT-CE-23-4922 L1T1-INT-CE-23-4932	29/11/2023 30/11/2023	EXT23-0019491	8 proyectos Objetados 11 proyectos No Objetados
ML1-TRN-025026	12/01/2024	TRAMO 3 -REDES SECAS - ENERGIA - SERIE 4 Y SERIE 5_VCC	L1T1-INT-CE-24-0363	29/01/2024	EXT24-0001549	No Objetado
ML1-TRN-026411	27/02/2024	TRAMO 3 - DISEÑO REDES SECAS SERIE 3_VCC	L1T1-INT-CE-24-1129	12/03/2024	EXT24-0004506	No Objetado
ML1-TRN-026412	27/02/2024	TRAMO 2 - DISEÑO REDES SECAS SERIE 3_VCC	L1T1-INT-CE-24-1284	20/03/2024	EXT24-0005038	5 proyecto No Objetados por la Interventoría
ML1-TRN-026412	27/02/2024	TRAMO 2 - DISEÑO REDES SECAS SERIE 3_VCC	L1T1-INT-CE-24-1275	20/03/2024	EXT24-0004994	1 proyecto Objetado por la Interventoría.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 52 de 104	

TRANSMISION ML1	FECHA	NOMBRE	RESPUESTA INTERVENTORIA	FECHA	RADICADO EMB	COMENTARIO
ML1-TRN-027498	16/04/2024	REDES DE ENERGIA ELECTRICA TRAMO 2_VDD	En revisión			
ML1-TRN-027504	16/04/2024	TRAMO 3 -REDES SECAS - ENERGIA - SERIE 4_VBB	No Objetado	En trámite		
ML1-TRN-027622	19/04/2024	REDES DE ENERGIA ELECTRICA SERIE 4 WF5_VBB	En revisión			
ML1-TRN-027975	26/04/2024	CON-INT_REDES SECAS ENERGIA ELECTRICA SERIE 1 INTERSECCION CARRERA 50_VBB	En revisión			

Tabla 1.2.8-10. Avance de los diseños de los Proyectos Serie 3, Serie 4, Serie 5 y Serie 6

La Interventoría informa que los diseños Serie 1 para los tramos a) WF1, WF2 y WF3 cuentan con la No Objeción Condicionada otorgada por Enel – Colombia ESP y b) WF4, WF5-1, WF5-2, WF6-1 y WF6-2 cuentan con la Aprobación de Enel – Colombia. La Interventoría hará seguimiento de las entregas de los Proyectos Serie 3, Serie 4 Serie 5 y Serie 6 según el cronograma de entregas que está preparando el Concesionario para la entrega de estos proyectos.

En el siguiente cuadro se presentan los diseños (para todo el corredor ferroviario) por frente que están NO OBJETADOS por la interventoría PLMB y su estado de aprobación por parte de las Empresas de Servicios Públicos para su respectiva trazabilidad.

TRANSMISION ML1	NOMBRE	ESTADO/ FECHA/ RADICADO	REQUIERE APROBACIÓN DE LA ESP/UAESP	ESTADO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ESP/UAESP
ML1-TRN-001361	MEMORIA DE CALCULO PROYECTO SERIE 1 - PATIO TALLER -V00	No Objetado 24/07/2021	SI	Enel-Colombia dio la Aprobación a los diseños el 24/07/2021 con el consecutivo No. 02948938.
ML1-TRN-001228	DISEÑO FOTOMETRICO INTERSECCION AVENIDA CARACAS CON CALLE 72.	No Objetado 27/07/2021 EXT21-0005465	SI	La UAESP el 17/08/2021 con oficio 202114-000153781 emitió la Aprobación Proyecto fotométrico.
ML1-TRN-001570	DISEÑO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN CONTENIDO EN EL "INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 1 INT. CALLE 72"	No Objetado 10/09/2021 EXT21-007148	SI	Enel-Colombia dio la Aprobación a los diseños el 11/10/2021 con el consecutivo No. 15000572

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 53 de 104	

TRANSMISION ML1	NOMBRE	ESTADO/ FECHA/ RADICADO	REQUIERE APROBACIÓN DE LA ESP/UAESP	ESTADO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ESP/UAESP
ML1-TRN-003401	INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 3 INT. CALLE 72	No Objetado 25/02/2022 EXT22-0002672	SI	Enel-Colombia el 27/04/2022 dio la Aprobación a los diseños con el consecutivo No. 002473339
ML1-TRN-003402	INFORME DE DISEÑO PROYECTO SERIE 6 – SAP 12- INT CALLE 72	No Objetado 01/03/2022 EXT22-0002850	SI	Enel-Colombia dio la Aprobación a los diseños el 31/03/2022 con el consecutivo No. 00230581
ML1-TRN-001238	INFORME DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES – INT. CALLE 72.	No Objetado 03/08/2021	SI	Las ESP de telecomunicaciones dieron la aprobación así: ETB con oficio 2021-1627-GRD-ED -2021/11/08. Movistar con firma de planos el 2021/11/18. Tigo-Une con firma de planos el 2021/10/22
ML1-TRN-001480	DISEÑO DE RELOCALIZACION DE REDES DE GAS NATURAL INTERSECCION CALLE 72	No Objetado 27/07/2021 EXT21-0005257	SI	VANTI el 23/11/2022 dio la Aprobación a los diseños con el consecutivo No. 02948938
ML1-TRN-009646	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 - INTERSECCION AV 68	No Objetado 25/10/2022 EXT22-0014584	SI	Enel-Colombia dio la Aprobación a los diseños el 21/12/2022 con el consecutivo No. 1500200968
ML1-TRN-009261	INFORME DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES – INTERSECCION AV.68	No Objetado 25/10/2022 EXT22-0014583	SI	Las ESP de telecomunicaciones dieron la aprobación así: ETB con firma de planos el 2022/11/09. Movistar con firma de planos el 2022/11/15. Tigo-Une no tiene infraestructura en el sector.
ML1-TRN-007418	INFORME RELOCALIZACION DE REDES DE GAS NATURAL INTERSECCIÓN AV. 68 CON 1° DE MAYO_VDD	No Objetado 09/10/2022 EXT22-0010337	SI	VANTI dio la Aprobación a los diseños el 23/11/2022 con el consecutivo No. 101533620
ML1-TRN-0009247	DISEÑO DE FOTOMETRIA DE ALUMBRADO PUBLICO – TRAMO 1_VDD.	No Objetado 08/11/2022 EXT22-0015355	SI	La UAESP el 30/09/2022 con oficio 20224000 225071 emitió la Aprobación Proyecto fotométrico-para el Tramo 1. El Concesionario está en proceso de revalidación.
ML1-TRN-010635	DISEÑO DE FOTOMETRIA DE ALUMBRADO PUBLICO – TRAMO 2_VEE.	No Objetado 24/11/2022 EXT22-0016299	SI	La UAESP el 19/10/2022 con oficio 20224000241471 emitió la Aprobación Proyecto fotométrico-para el Tramo 2. El Concesionario solicitará revalidación.
ML1-TRN-007895	DISEÑO DE FOTOMETRIA DE ALUMBRADO PUBLICO – TRAMO 3_VEE.	No Objetado 08/09/2022 EXT22-0012047	SI	La UAESP el 10/08/2022 con oficio 20224000 179601 emitió la Aprobación Proyecto fotométrico-para el Tramo 3. El Concesionario está en proceso de revalidación.
ML1-TRN-015339	DISEÑO DE FOTOMETRIA DE ALUMBRADO PUBLICO – TRAMO 4_VEE.	No Objetado 10/04/2023 EXT23-0005975	SI	La UAESP el 26/04/2023 con oficio 202340000 98871 emitió la Aprobación Proyecto fotométrico-para el Tramo 4. El Concesionario está en proceso de revalidación.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 54 de 104	

TRANSMISION ML1	NOMBRE	ESTADO/ FECHA/ RADICADO	REQUIERE APROBACIÓN DE LA ESP/UAESP	ESTADO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ESP/UAESP
ML1-TRN-015269	DISEÑO DE FOTOMETRIA DE ALUMBRADO PUBLICO – TRAMO 5_SUBTRAMO PRIORIZADO-VEE.	No Objetado 12/04/2023 EXT23-0006124	SI	La UAESP el 19/04/2023 con oficio 20234000092931 emitió la Aprobación Proyecto fotométrico-para el Tramo 5-1. El Concesionario solicitará revalidación.
ML1-TRN-015029	DISEÑO DE FOTOMETRIA DE ALUMBRADO PUBLICO – TRAMO 5_SUBTRAMO NO PRIORIZADO-VEE.	No Objetado 11/04/2023 EXT23-0006028	SI	La UAESP con oficio 2023400010661 emitió la Aprobación Proyecto fotométrico-para el Tramo 5-2. El Concesionario está en proceso de revalidación.
ML1-TRN-015285	DISEÑO DE FOTOMETRIA DE ALUMBRADO PUBLICO – TRAMO 6_SUBTRAMO PRIORIZADO-VEE.	No Objetado 13/04/2023 EXT23-0006219	SI	La UAESP el 13/04/2023 con oficio 20234000087241 emitió la Aprobación Proyecto fotométrico-para el Tramo 6-2.
ML1-TRN-015286	DISEÑO DE FOTOMETRIA DE ALUMBRADO PUBLICO – TRAMO 6_SUBTRAMO NO PRIORIZADO-VEE.	No Objetado 19/04/2023 EXT23-0006518	SI	La UAESP el 26/04/2023 con oficio 20234000098881 emitió la Aprobación Proyecto fotométrico-para el Tramo 6-1
ML1-TRN-014856	TRAMO 1 - ENERGIA SERIE 1 - INFORME DE PROYECTO_VEE	No Objetado 28/03/2023 EXT23-0005336	SI	Enel – Colombia ESP el 14/03/2023 emitió la No Objeción Condicionada. Comunicado 1500234964
ML1-TRN-017568	TRAMO 2 - REDES SECAS - ENERGIA SERIE 1 - INFORME DE PROYECTO-VEE	No Objetado 24/05/2023 EXT23-0008675	SI	Enel–Colombia ESP el 28/07/2023 emitió la No Objeción Condicionada. Factibilidad 1500116674 caso 1500263439
ML1-TRN-017023	TRAMO 3 - REDES SECAS - ENERGIA SERIE 1 - INFORME DE PROYECTO-VEE	No Objetado 11/05/2023 EXT23-0007952	SI	Enel–Colombia ESP el 28/07/2023 emitió la No Objeción Condicionada. Factibilidad 1500117210 caso 1500268437.
ML1-TRN-019649	TRAMO 4 - INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1-VFF	No Objetado 06/07/2023 EXT23-0011506	SI	Aprobado por Enel – Colombia ESP el 22/12/2023 con Factibilidad No. 1500116587.
ML1-TRN-012688 ML1-TRN-017800	REDES SECAS – TRAMO 5.2 SUBTRAMO NO PRIORIZADO –PROYECTO SERIE 1- VCC	No Objetado 21/06/2023 EXT23-0010587	SI	Aprobado por Enel-Colombia el 14/12/2023 con factibilidad 1500000548 Caso No. 1500412199.
ML1-TRN-016293 ML1-TRN-017796	REDES SECAS – TRAMO 5.1 SUBTRAMO PRIORIZADO –PROYECTO SERIE 1- VDD	No Objetado 21/06/2023 EXT23-0010526	SI	Enel Colombia emitió carta de aprobación el 2023/11/23 para el Proyecto Serie 1 al que le correspondió la factibilidad 1500000548 y el número de caso 150040624920.
ML1-TRN-018267	INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 - TRAMO 6.1 – SUBTRAMO NO PRIORIZADO-VCC	No Objetado 26/06/2023 EXT23-0010868	SI	Enel-Colombia el 27/12/2023 emitió la aprobación de la Versión V00 con la factibilidad 1500116674. caso 1500410366.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA			
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.			
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	

TRANSMISION ML1	NOMBRE	ESTADO/ FECHA/ RADICADO	REQUIERE APROBACIÓN DE LA ESP/UAESP	ESTADO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ESP/UAESP
ML1-TRN-018272 ML1-TRN-019015	TRAMO 6.2 – REDES SECAS – SUBTRAMO PRIORIZADO – INFORME DE DISEÑO DE PROYECTO SERIE 1 -VDD	No Objetado 22/06/2023 EXT23-0010654	SI	Enel-Colombia el 12/12/2023 emitió la aprobación de la Versión V00 con la factibilidad 1500116674. caso 1500410377.
ML1-TRN-014910	TELECOMUNICACIONES - INFORME DE DISEÑO DE REDES_VEE – TRAMO 1	No Objetado 30/03/2023 EXT23-0005470	SI	Planos firmados en señal de Aprobación por ETB el 25/11/2022. MOVISTAR no tiene redes en el tramo. TIGO-UNE no tiene redes en el tramo.
ML1-TRN-011202	TELECOMUNICACIONES - INFORME DE DISEÑO DE REDES_VEE – TRAMO 2	No Objetado 12/12/2022 EXT22-0017433	SI	Planos firmados en señal de Aprobación por: a) ETB el 12/12/2022, b) Movistar 10/07/2023, c) TIGO el 07/03/2023.
ML1-TRN-017110	INFORME DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES - TRAMO 3 – VEE	No Objetado 18/05/2023 EXT23-0008409	SI	Planos firmados en señal de Aprobación por: ETB el 23/06/2023, b) Movistar 11/07/2023, c) TIGO-UNE el 29/06/2023.
ML1-TRN-017671	TRAMO 4 - REDES SECAS - INFORME DE DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES - VEE	No Objetado. 08/06/2023 EXT23-0009808	SI	Planos firmados por a) ETB el 10/07/2023, b) Movistar 23/01/2024, c) TIGO-UNE el 23/01/2024.
ML1-TRN-013616 ML1-TRN-017801	TRAMO 5.1 – REDES SECAS – TELECOMUNICACIONES – SUBTRAMO PRIORIZADO-VCC	No Objetado. 09/06/2023 EXT23-0009915	SI	Planos firmados por: a) ETB el 27/10/2023, b) Movistar 23/01/2024, c) TIGO-UNE el 23/01/2024.
ML1-TRN-016765 ML1-TRN-017805	TRAMO 5.2 – REDES SECAS – SUBTRAMO NO PRIORIZADO –REDES DE TELECOMUNICACIONES-VCC	No Objetado. 26/06/2023 EXT23-0010797	SI	Planos firmados por a) ETB el 27/10/2023, b) Movistar 23/01/2024, c) TIGO-UNE el 23/01/2024.
ML1-TRN-018260	TRAMO 6.2 REDES SECAS - INFORME DE DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES – SUBTRAMO PRIORIZADO-VDD	No Objetado. 16/06/2023 EXT23-0010345	SI	Planos firmados en señal de Aprobación por ETB el 18/10/2023. b) Movistar 23/01/2024, c) TIGO-UNE el 23/01/2024.
ML1-TRN-018265	TRAMO 6.1 - REDES SECAS - SUBTRAMO NO PRIORIZADO - INFORME DE DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES-VDD	No Objetado. 26/06/2023. EXT23-0010803	SI	Planos firmados en señal de Aprobación por: a) ETB el 18/10/2023, b) Movistar 23/01/2024, c) TIGO-UNE el 23/01/2024.
ML1-TRN-015781	TRAMO 1 – GAS NATURAL - DISEÑO DE REDES - MODELO DE DISEÑO	No Objetado. 14/04/2023 EXT23-0006325	SI	VANTI dio la aprobación el 2023/03/08 con el comunicado 10153620-1320-2023. Planos en V00 en Aconex.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 56 de 104	

TRANSMISION ML1	NOMBRE	ESTADO/ FECHA/ RADICADO	REQUIERE APROBACIÓN DE LA ESP/UAESP	ESTADO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ESP/UAESP
ML1-TRN-016796	INFORME DE DISEÑOS DE LAS OBRAS DE GAS NATURAL PARA LA PLMB-TRAMO 2	No Objetado. 24/05/2023 EXT23-0008673	SI	VANTI dio la aprobación el 2023/08/14 con el comunicado 10153620-1535-2023. Planos en V00 en Aconex.
ML1-TRN-017009	TRAMO 3 INFORME DE DISEÑOS DE LAS OBRAS DE GAS NATURAL PARA LA PLMB.	No Objetado. 13/04/2023 EXT23-0006245	SI	VANTI dio la aprobación el 2023/08/14 con el comunicado 10153620-1536-2023. Planos en V00 en Aconex.
ML1-TRN-017443	TRAMO 4 – REDES DE GAS - INFORME DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS-VDD	No Objetado. 26/05/2023 EXT23-0008919	SI	VANTI dio la aprobación el 2023/08/08 con el comunicado 10153620-1673-2023. Planos en V00 en Aconex.
ML1-TRN-017898	TRAMO 5 SUBTRAMO PRIORIZADO - REDES DE GAS - DISEÑO DE REDES - MODELO DE DISEÑO	No Objetado. 07/07/2023 EXT23-0009703	SI	VANTI dio la aprobación el 2023/08/08 con el comunicado 10153620-1673-2023. Planos en V00 en Aconex.
ML1-TRN-017898 Y ML1-TRN-012187	TRAMO 5 SUBTRAMO NO PRIORIZADO - REDES DE GAS - DISEÑO DE REDES - VCC	No Objetado. 08/06/2023 EXT23-0009825	SI	VANTI dio la aprobación el 2023/08/08 con el comunicado 10153620-1673-2023. Planos en V00 en Aconex.
ML1-TRN-018397 ML1-TRN-012188	INFORME DE DISEÑOS DE LAS OBRAS DE GAS NATURAL PARA LA PLMB - TRAMO 6 – SUBTRAMO NO PRIORIZADO – VCC	No Objetado. 22/06/2023 EXT23-0010671	SI	Vanti firmo planos en señal de aprobación el 2023/12/11. Pendiente envío del Oficio de aprobación de Vanti. La Versión V00 en plataforma Aconex Pendiente.
ML1-TRN-018397 ML1-TRN-013681	TRAMO 6 - GAS NATURAL - INFORME DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS - SUBTRAMO PRIORIZADO - VCC	No Objetado. 27/06/2023. EXT23-0011017	SI	Vanti firmo planos en señal de aprobación el 2023/12/11. Pendiente envío del Oficio de aprobación de Vanti. La Versión V00 en plataforma Aconex Pendiente.
ML1-TRN-022846	REDES DE ENERGIA ELECTRICA TRAMO 2_VCC (PROYECTOS SERIE 4)	No Objetados (11) - 23/11/2023 EXT0019603	SI	El Concesionario está en proceso de envío a la ESP los diseños No Objetados, previa actualización del Serie1.
ML1-TRN-022846	REDES DE ENERGIA ELECTRICA TRAMO 2_VCC (PROYECTOS SERIE 4)	Objetados (8) 23/11/2023 EXT23-0019562	SI	El Concesionario está en proceso de ajustes para el envío a Enel-Colombia.
ML1-TRN-025026	TRAMO 3 -REDES SECAS - ENERGIA -SERIE 4 Y SERIE 5_VCC	No Objetado. 29/01/2024 EXT24-0001549	SI	El Concesionario está en proceso de envío a la ESP los diseños No Objetados, previa actualización del Serie1.

Tabla 1.2.8-11. Diseños No Objetados por la interventoría y su estado de aprobación por las ESP o por la UAESP.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 57 de 104	

A continuación, se presenta el estado actual de los productos en versión V00, para los Diseños de las Redes Secas a lo largo del Corredor, realizando el seguimiento del cumplimiento de las fechas establecidas en el PET V11.

FRENTE DE TRABAJO	ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	INICIO PROGRAMADO	FIN PROGRAMADO	ESTADO NO OBJETADO CON VERSIÓN V00 / TRANSMISIONES
WF1	P-164560	Transmisión de V01 en Aconex	2023/05/12	2023/06/08	Fotométrico: ML1-TRN-026959. Serie 1: ML1-TRN-01746. Telecomunicaciones: ML1-TRN-017593. Vanti: ML1-TRN-020630.
WF2	P-165600	Transmisión de V00 en Aconex	2023/05/12	2023/06/08	Fotométrico: ML1-TRN-026962. Serie 1: ML1-TRN-020751. Telecomunicaciones: ML1-TRN-020743. Vanti: ML1-TRN-020874.
WF3	P-165640	Transmisión de V00 en Aconex	2023/05/12	2023/06/08	Fotométrico: ML1-TRN-027013. Serie 1: ML1-TRN-021613. Telecomunicaciones: ML1-TRN-020723. Vanti: ML1-TRN-021647.
WF4	P-165680	Transmisión de V00 en Aconex	2023/05/12	2023/06/08	Fotométrico: ML1-TRN-027015. Serie 1: ML1-TRN-025862. Telecomunicaciones: ML1-TRN-025885. Vanti: ML1-TRN-022869.
WF5	P-165720	Transmisión de V00 en Aconex	2023/05/12	2023/06/08	Priorizado: Fotométrico: ML1-TRN-027016. Serie 1: ML1-TRN-025954. Telecomunicaciones: ML1-TRN-025948. Vanti: ML1-TRN-022894. No Priorizado: Fotométrico: ML1-TRN-027018. Serie 1: ML1-TRN-025958. Telecomunicaciones: ML1-TRN-025951. Vanti: ML1-TRN-022894.
WF6	P-165760	Transmisión de V00 en Aconex	2023/05/12	2023/06/08	Priorizado: Fotométrico: ML1-TRN-027014. Serie 1: ML1-TRN-026016. Telecomunicaciones: ML1-TRN-026024. Vanti: ML1-TRN-026131. No Priorizado: Fotométrico: ML1-TRN-027019. Serie 1: ML1-TRN-026053. Telecomunicaciones: ML1-TRN-026054. Vanti: ML1-TRN-026131.

Tabla 1.2.8-12 Estado de Cumplimiento de entregables Redes Secas en V00 según PET V11.

Aclaración: Los Proyectos Serie 1 de los Tramos WF1, WF2 y WF3 tienen No Objeción por parte de Enel-Colombia los demás Proyectos Principales de redes que aparecen en la tabla anterior están Aprobados por las ESP correspondientes.

El resumen de los productos de redes secas (energía eléctrica) pendientes por obtener la No Objeción por parte de la Interventoría; así como los productos de redes secas (energía, telecomunicaciones y gas natural) pendientes por obtener la Aprobación por parte de las Empresas de Servicios Públicos se presenta en el Capítulo 2.6. (a) Redes Secas.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA			
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.			
Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 58 de 104	

La metodología que la Interventoría está utilizando para que se agilicen los trámites de aprobación de los diseños por parte de las Empresas de Servicios Públicos (ESP); es el de acompañar al Concesionario a todas las mesas de trabajo que se efectúan entre las ESP y el Concesionario (Quien se encarga de levantar y hacer firmar las actas de estas mesas de trabajo para anexarlas a los documentos a radicar ante cada ESP). Estas mesas de trabajo son solicitadas por el Concesionario para presentar las soluciones a las diferentes observaciones que las ESP hacen a los diseños previamente No Objetados por la Interventoría. Con esta metodología se agiliza la obtención de las aprobaciones por parte de las ESP pues cuando el concesionario hace la radicación de los diseños ya se han concertado la mayoría de las soluciones a las observaciones de las ESP y así las aprobaciones de los diseños por parte de las ESP se obtienen de forma más expedita.

Respecto a las fechas de posible aprobación de los diseños de redes que están en proceso de revalidación, el CSPLMB no puede precisarla en razón a que el Concesionario está atendiendo las Observaciones de la SDM y del IDPC a los proyectos de Geometría y de Urbanismo. Además de esto los tiempos de revisión están dados por las ESP de acuerdo con las fechas de radicaciones que efectúe el Concesionario.

A continuación, se presenta un resumen de las mesas de trabajo celebradas en el periodo del presente informe mensual.

FECHA	PROGRAMADA POR	MESA DE TRABAJO	TEMA
03/04/2024	CONCESIONARIO – CSPLMB	Mesa de trabajo virtual	<p>Revisión de la atención por parte de ML1 a las observaciones del CSPLMB a los diseños de redes de telecomunicaciones para la intersección de la Carrera 50 por Av. 1° de Mayo.</p> <p>Una vez revisadas las respuestas de ML1 a las observaciones Se concluyó que el Concesionario enviará al CSPLMB los diseños actualizados durante la cuarta semana del mes de abril de 2024.</p>
15/04/2024	CONCESIONARIO – ENEL-COLOMBIA - CSPLMB	Mesa de trabajo virtual	<p>Revisar la posible a la interferencia de las canalizaciones y redes Construidas por Enel-Colombia en la intersección de la Avenida NQS con la calle 8 sur. Pues ML1 (construcciones) no cuenta con los planos récord de esta obra la cual aparece en los planos Serie 1 No Objetados por el CSPLMB y Aprobados por Enel-Colombia.</p> <p>Una vez revisados los planos se observa que aparentemente las canalizaciones construidas por Enel-Colombia no hacen interferencia con la Pila S10-7. Se concluyó que Enel-Colombia enviará los planos récord de la obra a ML1 con copia al CSPLMB el 2024/04/16.</p>

Tabla 1.2.8-13. Relación mesas de trabajo celebradas durante el periodo

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 59 de 104		

1.2.9. Redes Húmedas

En el mes de abril del 2024, el Concesionario desarrolló las actividades para los diferentes sectores que componen el proyecto presentadas en este reporte, tomando como línea base los requerimientos técnicos mínimos contenidos en el contrato de Concesión, el Apéndice Técnico 3 “Gestión de las Fases Previa, de Construcción, de Pruebas, Certificación y Puesta en marcha”, el Apéndice 13 “Especificaciones técnicas de redes de servicios públicos” (Anexo 3. “Redes de servicios públicos” y Anexo 2 “Normas EAAB”), el Apéndice Técnico 4 (Anexo 10 “Alcance de los entregables en etapa de Diseños”) y el Anexo 11. “Procedimiento presentación de planos”.

Patio Taller

En el sector del Patio Taller, respecto al producto PATIO TALLER (EXTERIOR) – REDES HUMEDAS – ACUEDUCTO – INFORME DE DISEÑO DE OBRA en versión VEE, que contiene los diseños de las redes externas de Acueducto y las redes internas y externas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial para la fase operativa correspondiente a la tercera entrega en la etapa del 90%, fue recibido mediante plataforma de Aconex el día 2024/02/26 con Transmitall ML1-TRN-026186, estos diseños fueron objetados mediante comunicado L1T1-INT-CE-24-1488 el día 2024/04/03.

Intersección Calle 72 por Avenida Caracas

En el sector de la Intersección Av. Calle 72 con Av. Caracas, el Concesionario ha realizado los estudios y diseños necesarios para dar cumplimiento a los hitos de la fase previa estipulados en el Contrato de Concesión. Por tal razón, los Estudios y Diseños correspondientes a las Redes de Acueducto y Alcantarillado tanto Combinado como Pluvial (Drenaje del Deprimido), se encuentran No Objetados en su totalidad desde el 2021/10/26. Dado esto, los avances de este sector a la fecha se presentan a detalle en el Capítulo de Construcción.

A continuación, se relacionan de modo informativo, los radicados a EMB de los comunicados de No objeción emitidos por la presente Interventoría para los diseños de Acueducto y Alcantarillado del presente sector.

PRODUCTO	COMUNICADO	FECHA	RADICADO EMB
DISEÑO DE RELOCALIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO INTERSECCION CALLE 72	L1T1-INT-CE-21-0697	2021/08/13	EXT21-0006033
DISEÑO DE RELOCALIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO INTERSECCION CALLE 72	L1T1-INT-CE-21-0725	2021/08/19	EXT21-0006178
DISEÑO DRENAJE PLUVIAL - INTERSECCION CALLE 72	L1T1-INT-CE-21-0870	2021/09/09	EXT21-0007107

Tabla 1.2.9-1. Comunicados de No Objeción Diseños RHU – Int. Calle 72, con radicados a EMB.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA			
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.			
Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 60 de 104	

Intersección Avenida Carrera 68 con Avenida 1° de Mayo

Los productos correspondientes al INFORME DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA PRIMERA LINEA DEL SISTEMA METRO – INTERSECCION AV. 68 en versión V00 se encuentran firmados por Interventoría y No Objetado condicionado por la EAAB ESP, estos diseños fueron cargados por el Concesionario a la Plataforma de Aconex en V00 el día 2022/12/26. Dado esto, los avances de este sector a la fecha se presentan a detalle en el Capítulo de Construcción.

A continuación, se relacionan de modo informativo, los radicados a EMB de los comunicados de No objeción emitidos por la presente Interventoría para los diseños de Acueducto y Alcantarillado del presente sector.

PRODUCTO	COMUNICADO	FECHA	RADICADO EMB
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS DE REDES HUMEDAS ACUEDUCTO PARA LA PRIMERA LINEA DEL SISTEMA METRO INTERSECCION AV 68	L1T1-INT-CE-22-3413	2022/10/28	EXT22-0014836
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS DE REDES HUMEDAS ALCANTARILLADO PARA LA PRIMERA LINEA DEL SISTEMA METRO INTERSECCION AV 68	L1T1-INT-CE-22-3414	2022/10/28	EXT22-0014837

Tabla 1.2.9-2. Comunicados de No Objeción Diseños RHU – Av. 68, con radicados a EMB.

Viaducto – ferroviario – Principal

Respecto al Plan de Traslado de Redes, el Concesionario transmitió el día 2022/08/23 mediante la plataforma de Aconex el producto correspondiente a PLAN DE TRASLADO, PROTECCION, REUBICACION Y/O GESTIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO TRAMOS 1 AL 6 en versión V00. Dicho documento cuenta con las firmas de Interventoría y corresponde a la versión No Objetada mediante la cual actualmente el Concesionario se encuentra trabajando en los Diseños de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado (Sanitario, Combinado y Pluvial) de los diferentes frentes de trabajo. Cabe resaltar que este producto se encuentra No Objetado, los avances actualmente corresponden a la etapa de Diseño.

En cuanto al INFORME EJECUTIVO - PLAN DE TRASLADO, PROTECCIÓN, REUBICACIÓN Y/O GESTIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VERSIÓN V00, no ha sido cargado por el Concesionario a la Plataforma de Aconex.

Avances Redes Húmedas en Diseño

En el mes de abril del 2024, el Concesionario y su Contratista de Diseño WSP desarrollaron las actividades para los diferentes tramos que componen el proyecto presentadas en este reporte, esto tomando como línea base los requerimientos técnicos mínimos contenidos en el contrato de

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA			
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.			
Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 61 de 104	

Concesión, el Apéndice Técnico 3 y sus anexos, el Apéndice Técnico 4 “Anexo 10” y el Apéndice Técnico 13.

De acuerdo con lo referido en los párrafos anteriores, así como lo presentado en las tablas contenidas en el Capítulo 2. 6.a.1.4) Viaducto ferroviario – Corredor Principal, para cada uno de los tramos, se menciona que, si bien el Concesionario trabajó en la atención de las observaciones de la EAAB ESP e Interventoría para los diferentes frentes de trabajo, este no presentó de manera oportuna y según los plazos estipulados en el Contrato de Concesión y el Acta de Entendimiento No. 3, Anexo 1, las versiones V00 de la totalidad de los productos No Objetados, atendiendo las observaciones menores pendientes por ajustar en las V00 respectivas.

En cuanto a los Diseños Finales, es importante mencionar que los productos remitidos por el Concesionario correspondiente a los diseños finales de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Pluvial del WF1 (V00), WF2 (V00) , el WF3 (V00), WF4 (V00) , WF5 (V00 – No Priorizado) y el WF6 (V00 – Priorizado y No Priorizado), se encuentran No objetados y cargados en Aconex, en cuanto los diseños del WF5 (V00 – Priorizado) y Ramal Técnico (V00) se encuentran firmados por parte de Interventoría y pendientes por carga a Aconex por parte del Concesionario.

A continuación, se relacionan los radicados a EMB de los comunicados de No objeción emitidos por la presente Interventoría para los Diseños de Acueducto y Alcantarillado, los cuales fueron recibidos dentro de un mismo Transmittal para el componente de Redes Húmedas en cada uno de los frentes de trabajo que hacen parte del Corredor Principal.

PRODUCTO	COMUNICADO	FECHA	RADICADO EMB
DISEÑOS DE RELOCALIZACION DE REDES HUMEDAS DEL WF1	L1T1-INT-CE-23-0951	2023/02/28	EXT23-0003264
DISEÑOS DE RELOCALIZACION DE REDES HUMEDAS DEL WF2	L1T1-INT-CE-23-1829	2023/04/17	EXT23-0006391
DISEÑOS DE RELOCALIZACION DE REDES HUMEDAS DEL WF3	L1T1-INT-CE-23-2234	2023/05/08	EXT23-0007702
DISEÑOS DEL PLAN DE RELOCALIZACION REDES HUMEDAS WF4	L1T1-INT-CE-23-2727	2023/06/14	EXT23-0010104
DISEÑOS DE RELOCALIZACION DE REDES HUMEDAS DEL TRAMO 5 NO PRIORIZADO DEL WF5	L1T1-INT-CE-23-3686	2023/08/23	EXT23-0014147
DISEÑOS DE RELOCALIZACION DE REDES HUMEDAS DEL TRAMO 5 PRIORIZADO DEL WF5	L1T1-INT-CE-23-3671	2023/08/23	EXT23-0014078
DISEÑOS RELOCALIZACION DE REDES HUMEDAS OBRAS NO PRIORIZADAS WF6	L1T1-INT-CE-23-4499	2023/10/23	EXT23-0017635
DISEÑOS RELOCALIZACION DE REDES HUMEDAS OBRAS NO PRIORIZADAS WF6	L1T1-INT-CE-23-4513	2023/10/24	EXT23-0017686
DISEÑOS ALCANTARILLADO RAMAL TECNICO	L1T1-INT-CE-23-3802	2023/09/01	EXT23-0014660

Tabla 1.2.9-3. Comunicados de No Objeción Diseños RHU - Corredor Principal, con radicados a EMB.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 62 de 104	

En la siguiente tabla, se presentan los frentes de trabajo No objetados por Interventoría y su estado de gestión ante la EAAB, de acuerdo con lo reportado por el Concesionario al presente corte.

PRODUCTOS	ESTADO	¿REQUIERE APROBACION DE LA EAAB?	ESTADO ANTE LA ESP
DISEÑOS DEL PLAN DE RELOCALIZACION REDES HUMEDAS DE LA CALLE 72	NO OBJETADO	SI	Mediante comunicado 3050001 S-2021-248498 del 2021/08/23 la ESP mencionó que: <i>"La zona 2 de la Empresa, mediante comunicación 3231001-2021-0079, emitió concepto de No Objeción a la propuesta de traslado de redes locales de acueducto y alcantarillado deprimido Calle 72"</i> .
DISEÑOS DEL PLAN DE RELOCALIZACION REDES HUMEDAS DE LA AV. 68	NO OBJETADO	SI	Mediante comunicado S-2022-251733 del 2022/09/19 la ESP mencionó que: <i>"(...) De esta manera para la valoración final de Los Diseños de acueducto y alcantarillado Intersección de la Avenida 68 con Avenida Primera de Mayo del PLMB, Acuerdo Específico No. 4 del Acuerdo Marco No. 9-07-30100-1478-2021 se EMITE CONCEPTO POSITIVO DE NO-OBJECCIÓN CONDICIONADA"</i>
DISEÑOS DEL PLAN DE RELOCALIZACION REDES HUMEDAS WF1_VEE	NO OBJETADO	SI	Mediante comunicado S-2024-064177 del 2024/03/04 la ESP mencionó que: <i>"La EAAB-ESP manifiesta que al ser atendidas las observaciones correspondientes al traslado de la red matriz Av. Villavicencio -Tramo II de 27", emite concepto técnico de NO OBJECCIÓN a los diseños de redes de acueducto y alcantarillado del Frente de Trabajo 1 (WF1)."</i>
DISEÑOS DEL PLAN DE RELOCALIZACION REDES HUMEDAS WF2_VDD	NO OBJETADO	SI	Mediante comunicado S-2024-068643 del 2024/03/07 la ESP mencionó que: <i>"(...) emite concepto técnico de NO OBJECCIÓN a los diseños de redes de acueducto y alcantarillado del Frente de Trabajo 2 (WF2)"</i>
DISEÑOS DE LA RELOCALIZACION DE REDES HUMEDAS DEL WF3_VDD	NO OBJETADO	SI	Mediante comunicado S-2023-148913 radicada al Concesionario el 2023/09/25 la ESP mencionó que: <i>"(...) quedan en estado de No objeción condicionada desde el punto de vista hidráulico"</i>
DISEÑOS DE LA RELOCALIZACION DE REDES HUMEDAS DEL WF4_VDD	NO OBJETADO	SI	La EAAB ESP, remitió comunicado S-2023-342936 del 2023/12/20 concluyendo que: <i>"se encuentran estado de NO OBJECCIÓN CONDICIONADA para redes menores de acueducto y con NO OBJECCIÓN CONDICIONADA para redes locales de alcantarillado en las interferencias con pilas y estaciones de la PLMB (interpretese como solo traslado para la Fase 1) desde el punto de vista hidráulico en la etapa de revisión"</i> .
DISEÑOS RELOCALIZACIÓN DE REDES HÚMEDAS OBRAS PRIORIZADAS y NO PRIORIZADAS WF5_VCC/VDD.	NO OBJETADO	SI	La EAAB ESP, remitió comunicado S-2023-342942 del 2023/12/20 concluyendo que: <i>"se encuentran estado de NO OBJECCIÓN para redes menores de acueducto y con NO OBJECCIÓN CONDICIONADA para redes locales de alcantarillado en las interferencias con pilas y estaciones de la PLMB (interpretese como solo traslado para la Fase 1) desde el punto de vista hidráulico en la etapa de revisión"</i> . Por otra parte, el día 2024/01/30 mediante comunicado S-2024-023937 la EAAB manifestó: <i>"Una vez finalizada"</i>

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 63 de 104	

PRODUCTOS	ESTADO	¿REQUIERE APROBACION DE LA EAAB?	ESTADO ANTE LA ESP
			<i>la revisión de la documentación, no es posible para la Dirección Red Troncal de Alcantarillado emitir la No Objeción Técnica al proyecto. La DRTA solicita, se remita oficio con respuesta a cada una de las observaciones pendientes relacionadas en el presente memorando con el fin de agilizar la revisión”.</i>
DISEÑOS RELOCALIZACIÓN DE REDES HÚMEDAS OBRAS PRIORIZADAS y NO PRIORIZADAS WF6_VCC/VDD	NO OBJETADO	SI	<p>La EAAB ESP, remitió comunicado S-2023-313566 del 2023/11/22 concluyendo que: “la EAAB-ESP reitera su posición respecto a la necesidad de llevar a cabo la separación de sistemas de alcantarillado combinado, para los Frentes de Trabajo 4, 5 y 6, y queda a la espera de la presentación de los diseños de redes separadas de alcantarillado sanitario y pluvial para su respectiva revisión.”</p> <p>Por otra parte, el día 2024/03/18 mediante comunicado S-2024-080054 la DRTA de la EAAB manifestó: “se encuentran en estado Pendiente para redes troncales de alcantarillado, hasta que sean atendidas las observaciones presentadas por parte de la de la Dirección Red Troncal Alcantarillado en su memorando No. 25510-2024-00298”.</p>
DISEÑOS ALCANTARILLADO RAMAL TECNICO_VCC	NO OBJETADO	SI	Pendiente pronunciamiento definitivo por parte de la EAAB ESP.

Tabla 1.2.9-4. Estado de gestión de los productos ante la EAAB ESP.

Como se mencionó en ocasiones anteriores, la metodología adoptada por Interventoría para que se agilicen los trámites de aprobación de los diseños por parte de las Empresas de Servicios Públicos (ESP); es acompañar al Concesionario en las mesas de trabajo que se efectúan entre la EAAB ESP y el Concesionario, solicitadas por el mismo para presentar las soluciones a las diferentes observaciones que la ESP realiza a los diseños previamente No objetados por la Interventoría. Es de aclarar, que las mesas de trabajo realizadas con la EAAB surgen a raíz de la necesidad del Contratista de Diseños WSP y del Concesionario de resolver inquietudes frente a la atención de los requerimientos realizados por la empresa según su incorporación en los Diseños, en el marco del Contrato de Concesión, capítulo “2.2. Obligaciones del Concesionario”, Literales (b) y (c), el cual estipula, “El Concesionario deberá tramitar y obtener ante las Autoridades Gubernamentales, las Licencias y Permisos necesarios para la ejecución de las Obras para Redes a Cargo del Concesionario”. No obstante, desde Interventoría se está llevando a cabo el respectivo seguimiento y acompañamiento en este proceso, según se defina entre la EAAB ESP y el Concesionario a fin de lograr los acuerdos y aprobaciones correspondientes.

Las fechas de posible aprobación por parte de la EAAB ESP a los diseños de redes están en proceso de ajuste, debido a que no es posible para la Interventoría reportar, teniendo en cuenta que los tiempos de revisión están dados por las ESP de acuerdo con las fechas de radicaciones que efectúe el Concesionario. Aunado a ello y como se ha reiterado por la presente Interventoría la solicitud de la

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 64 de 104	

EAAB ESP en la separación de las redes de alcantarillado combinado podrá generar impacto en la aprobación de los diseños por parte de la empresa y los tiempos estipulados para la ejecución del PLMB.

Es de aclarar, que en el presente corte no se llevaron a cabo mesas de trabajo con la EAAB ESP, el Concesionario se encuentra trabajando en los requerimientos de la empresa para la aprobación de los diseños en el marco del alcance del Contrato de Concesión.

En cumplimiento del seguimiento de Plan de Trabajo en V11, a continuación, se listan los frentes de trabajo y su estado actual de acuerdo con los plazos estipulados para la culminación de la actividad “Transmisión de V00 en Aconex”, es de resaltar que la fecha máxima para la terminación dicha actividad para todos los Frentes de Trabajo fue el 2023/06/08, la cual se culminó sin que el Concesionario presentará completitud los diseños de las Redes Húmedas.

FRENTE DE TRABAJO	ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	INICIO PROGRAMADO	FIN PROGRAMADO	Estado Interventoría	Estado con ESP
WF1	P-165580	Transmisión de V00 en Aconex	2023/05/12	<u>2023/06/08</u>	No Objetado con V00 en Aconex Transmitall: ML1-TRN-018701.	“NO OBJETADO”
WF2	P-165620	Transmisión de V00 en Aconex	2023/05/12	<u>2023/06/08</u>	No Objetado con V00 en Aconex Transmitall: ML1-TRN-021100.	“NO OBJETADO”
WF3	P-165660	Transmisión de V00 en Aconex	2023/05/12	<u>2023/06/08</u>	No Objetado con V00 en Aconex Transmitall: ML1-TRN-022256.	“NO OBJETADO CONDICIONADO”
WF4	P-165700	Transmisión de V00 en Aconex	2023/05/12	<u>2023/06/08</u>	No Objetado y firmado por Interventoría en V00. Pendiente Cargue a Aconex por parte del Concesionario.	“NO OBJETADO CONDICIONADO”
WF5	P-165740	Transmisión de V00 en Aconex	2023/05/12	<u>2023/06/08</u>	No Objetado y firmado por Interventoría en V00. Pendiente Cargue a Aconex por parte del Concesionario.	“NO OBJETADO CONDICIONADO”
WF6	P-165780	Transmisión de V00 en Aconex	2023/05/12	<u>2023/06/08</u>	No Objetado y firmado por Interventoría en V00. Pendiente Cargue a Aconex por parte del Concesionario.	Con observaciones

Tabla 1.2.9-5. Estado de Cumplimiento de entregables RHU en V00 según PET V11.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 65 de 104	

1.2.10. Diseño Geométrico Ferroviario

La información relacionada a los fabricantes que serán los responsables de suministrar los elementos de vía férrea como riel, cambiavías y sistema de fijación fue dado a conocer por parte de El Concesionario; así mismo, el fabricante del tercer riel será una única empresa responsable de suministrar todos los elementos, accesorios y componentes en general. Todo lo anterior con la presentación del plan de pruebas y ensayos, documento parcial que está en proceso de revisión por parte de Interventoría.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 66 de 104	

1.2.11. RAMS

La interventoría ha trabajado en la revisión de documentación (de la segunda ronda de revisión de la etapa del 90%) dando respuesta sobre documentos RAMS del subsistema de Señalización (CBTC) y en la revisión del grado de cumplimiento de las obligaciones del concesionario respecto a los planes de gestión. Ver detalle en: 2.6 (k) Descripción de las actividades y gestiones realizadas por el interventor.

La interventoría ha celebrado en el periodo mensual dos comités técnicos RAMS, cuyo contenido puede consultarse en el Anexo 2.6 (g) Actas de reunión RAMS.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 67 de 104	

1.2.12. Sistema Metro - Ferroviario y MR

En este mes, se emitieron los documentos indicados a continuación:

Material Rodante

- RESPUESTA A LA TRANSMISIÓN ML1-TRN-025926 CON ASUNTO L1T1-3110-600-CON-CN-MER-IN-0008_V00 INFORME DE LA PRUEBA TIPO DE LA CAJA DE CAMBIOS DEL MATERIAL RODANTE.
- RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN L1T1-CON-CE-24-1878 CON ASUNTO ACLARACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS EN SITIO DEL MATERIAL RODANTE.
- RESPUESTA A LA TRANSMISIÓN ML1-TRN-026700, CON ASUNTO L1T1-3110-600-CON-CN-MER-IN-0001_V00 - INFORME DE LA PRUEBA TIPO DEL COLECTOR DE CORRIENTE DEL MATERIAL RODANTE.
- RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN L1T1-CON-CE-24-2073 CON ASUNTO RESPUESTA A COMUNICACIONES L1T1-INT-CE-23-4967 Y L1T1-INT-CE-24-0807 SOBRE CONDICIONES PARA LAS PRUEBAS EN SITIO DEL PRIMER TREN.

Sistema de Peaje y Control de Acceso

- NO OBJECCIÓN A LOS EYD DEL COMPONENTE DE SISTEMAS DE PEAJE Y CONTROL DE ACCESO. ENTREGA FINALIZADA MEDIANTE LA TRANSMISIÓN ML1-TRN-026718 DE FECHA 13/03/2024.
- SOLICITUD DEL PROGRAMA DE PRUEBAS EN FABRICA DE LOS SISTEMAS DE PEAJE/CONTROL DE ACCESO Y CCTV PARA DETECTAR Y CONTABILIZAR LA EVASION.

Sistema de Señalización y Control de Trenes (CBTC)

- ESTADO ACTUAL DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO Y OTORGAMIENTO DE UN PERIODO DE CURA, RELATIVO A LA ENTREGA Y TRANSMISIÓN EN ACONEX DE LAS VERSIONES V00 DEL COMPONENTE SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRENES CBTC - EXTS23-0006418.

Sistema SCS

- DOSIER DOCUMENTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA: SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN (SCS) VERSIÓN V01.

Sistemas de Telecomunicaciones y Radiocomunicaciones

- RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN: L1T1-CON-CE-24-1236, CON ASUNTO: RESPUESTA A SU COMUNICACIÓN L1T1-INT-CE-24-0607 SOBRE ENTREGA DE V00 DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACIONES.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 68 de 104	

- RESPUESTA A LA TRASMISION ML1-TRN-024028, CON ASUNTO PLANES DE TELECOMUNICACIONES VCC ETAPA 100% REV 02.

Sistema de Puertas de Andén y Plataforma

- DOSSIER DOCUMENTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA: SISTEMA DE PUERTAS DE ANDÉN Y PLATAFORMA (PDAP).

Diversas

- REITERACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LOS ENTREGABLES DE CANALIZACIONES (CNL).

Se recibieron los siguientes documentos:

Material Rodante

- RESPUESTA A COMUNICACIONES L1T1-IN-CE-23-4967 Y L1T1-INT-CE-24-0807 SOBRE CONDICIONES PARA LAS PRUEBAS EN SITIO DEL PRIMER TREN.
- CON-INT_L1T1-3126-600-CON-CN-MER-IN-0001_V00 - INFORME DE LA PRUEBA TIPO DEL SISTEMA DE INFORMACION AL PASAJERO DEL MATERIAL RODANTE.
- CON-INT_L1T1-3100-600-CON-CN-MER-PC-0016_V00 - PROTOCOLO DE PRUEBA TIPO DE LA RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL TREN.
- CON-INT_L1T1-3100-600-CON-CN-MER-PC-0020_V00 - PROTOCOLO DE PRUEBA DE RUTINA DEL SISTEMA DE ILUMINACION.
- CON-INT_L1T1-3100-600-CON-CN-MER-PC-0021_V00 - PROTOCOLO DE PRUEBA DE RUTINA DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.
- CON-INT_L1T1-3100-600-CON-CN-MER-PC-0024_V00 - PROTOCOLO DE PRUEBA DE RUTINA DEL SISTEMA DE DETECCION DE OBSTACULOS.
- CON-INT_L1T1-3100-600-CON-CN-MER-PC-0027_V00 - PROTOCOLO DE PRUEBA DE RUTINA DE LA INTERACCION RUEDA-RIEL.
- CON-INT_L1T1-3100-600-CON-CN-MER-PR-0004_V00 - PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE RUTINA DE LA INTERACCION RUEDA-RIEL.
- CON-INT_L1T1-3100-600-CON-ED-MER-PR-0017_V01 - PROCEDIMIENTO DE PRUEBA TIPO DE LA RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL TREN.
- CON-INT_L1T1-3100-600-CON-ED-MER-PR-0023_V01 - PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE RUTINA DEL SISTEMA DE ILUMINACION.
- CON-INT_L1T1-3100-600-CON-ED-MER-PR-0024_V01 - PROCEDIMIENTO DE PRUEBA RUTINA DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.
- CON-INT_L1T1-3100-600-CON-ED-MER-PR-0027_V01 - PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE RUTINA DEL SISTEMA DE DETECCION DE OBSTACULOS.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 69 de 104		

- CON-INT_L1T1-3110-600-CON-CN-MER-PC-0004_V00 - PROTOCOLO DE PRUEBA DE RUTINA DE EQUIPOS Y COMPONENTES DE TRACCION.
- CON-INT_L1T1-3110-600-CON-ED-MER-PR-0004_V01 - PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE RUTINA DE EQUIPOS Y COMPONENTES DE TRACCION.
- CON-INT_L1T1-3126-600-CON-CN-MER-PC-0003_V00 - PROTOCOLO DE PRUEBA DE RUTINA DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN.
- CON-INT_L1T1-3126-600-CON-ED-MER-PR-0003_V01 - PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE RUTINA DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN.
- CON-INT_L1T1-3130-600-CON-CN-MER-PC-0003_V00 - PROTOCOLO DE PRUEBA DE RUTINA DE ENGRASE DE LAS PESTAÑAS DE LA RUEDA.
- CON-INT_L1T1-3130-600-CON-ED-MER-PR-0003_V01 - PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE RUTINA DE ENGRASE DE LAS PESTAÑAS DE LA RUEDA.
- CON-INT_L1T1-3142-600-CON-CN-MER-PC-0002_V00 - PROTOCOLO DE PRUEBA DE RUTINA DEL CARGADOR DE BATERIAS.
- CON-INT_L1T1-3142-600-CON-ED-MER-PR-0002_V01 - PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE RUTINA DEL CARGADOR DE BATERIAS.
- CERTIFICADOS DE LABORATORIO Y EQUIPOS PARA PRUEBAS A LAS CAJAS DEL MATERIAL RODANTE.
- CON-INT_L1T1-3130-600-CON-CN-PIE-PN-0002_V00 - PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO DEL ENSAMBLAJE DEL BOGIE DEL MATERIAL RODANTE.
- CON-INT_L1T1-3110-600-CON-CN-MER-IN-0004_V00 - INFORME DE PRUEBA TIPO DE LA CONVERTIDOR DE TRACCION DEL MATERIAL RODANTE.
- CON-INT_L1T1-3110-600-CON-CN-MER-IN-0004_V00 - INFORME DE PRUEBA TIPO DE LA CONVERTIDOR DE TRACCION DEL MATERIAL RODANTE.
- CON-INT_L1T1-3100-600-CON-CN-MER-PN-0002_V00 - PROGRAMA DE CAPACITACION DE MATERIAL RODANTE.
- CRONOGRAMA UNIDAD DE EJECUCIÓN 580 Y 582.
- CON-INT_L1T1-3100-600-CON-CN-MER-PC-0010_V00 - PROTOCOLO DE PRUEBA TIPO DE INTELIGIBILIDAD DEL HABLA DEL SISTEMA DE RADIODIFUSION.
- CON-INT_L1T1-3100-600-CON-CN-MER-PC-0014_V00 - PROTOCOLO DE PRUEBA TIPO DEL GALIBO DINAMICO.
- CON-INT_L1T1-3100-600-CON-CN-MER-PC-0028_V00 - PROTOCOLO DE PRUEBA DE RUTINA DE ACELERACION Y DESACELERACION DEL TREN EN MODO NORMAL Y DEGRADADO.
- CON-INT_L1T1-3100-600-CON-CN-MER-PC-0029_V00 - PROTOCOLO DE PRUEBA DE RUTINA DEL RUIDO DINAMICO DEL TREN.
- CON-INT_L1T1-3100-600-CON-CN-MER-PR-0005_V00 - PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE RUTINA DE ACELERACION Y DESACELERACION DEL TREN EN MODO NORMAL Y DEGRADADO.
- CON-INT_L1T1-3100-600-CON-CN-MER-PR-0006_V00 - PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE RUTINA DEL RUIDO DINAMICO DEL TREN.
- CON-INT_L1T1-3100-600-CON-ED-MER-PR-0011_V01 - PROCEDIMIENTO DE PRUEBA TIPO DE INTELIGIBILIDAD DEL HABLA DEL SISTEMA DE RADIODIFUSION.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 70 de 104	

- CON-INT_L1T1-3100-600-CON-ED-MER-PR-0015_V01 - PROCEDIMIENTO DE PRUEBA TIPO DEL GALIBO DINAMICO.
- CON-INT_L1T1-3110-600-CON-CN-MER-PC-0005_V00 - PROTOCOLO DE PRUEBA DE RUTINA DEL FROTADOR DE CORRIENTE.
- CON-INT_L1T1-3110-600-CON-CN-MER-PR-0001_V00 - PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE RUTINA DEL FROTADOR DE CORRIENTE.
- CON-INT_L1T1-3130-600-CON-CN-MER-PC-0002_V00 - PROTOCOLO DE PRUEBA TIPO DEL SISTEMA DE ENGRASE DE LA PESTAÑA DE LAS RUEDAS.
- CON-INT_L1T1-3130-600-CON-ED-MER-PR-0002_V01 - PROCEDIMIENTO DE PRUEBA TIPO DEL SISTEMA DE ENGRASE DE LA PESTAÑA DE LAS RUEDAS.
- CON-INT_L1T1-3170-600-CON-CN-MER-PC-0002_V00 - PROTOCOLO DE PRUEBA DE RUTINA DEL SISTEMA DE VENTILACION.
- CON-INT_L1T1-3170-600-CON-ED-MER-PR-0002_V01 - PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE RUTINA DEL SISTEMA DE VENTILACION.

Sistema de Radiocomunicaciones y Telecomunicaciones

- CON-INT_L1T1-5405-000-CON-ED-INS-IN-0001_V00 - INFORME DEFINITIVO DE DISEÑO Y ESPECIFICACIONES - SISTEMA DE RED MULTISERVICIOS (RMS).
- CON-INT_L1T1-5430-100-CON-ED-INS-IN-0002_V00 - SISTEMA DE RED DE BANDA ANCHA (RBA) - DISEÑO DE SIMULACION DEL PATIO TALLER.
- CON-INT_L1T1-5430-000-CON-ED-INS-IN-0001_V00 - INFORME DEFINITIVO DE DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE RED DE BANDA ANCHA (RBA).
- CON-INT_L1T1-5430-200-CON-ED-INS-IN-0002_V00 - SISTEMA DE RED DE BANDA ANCHA (RBA) - DISEÑO DE SIMULACION DE INTER ESTACIONES.
- RESPUESTA A REVISIÓN PRIMERA RODA DOCUMENTOS 100% TELECOMUNICACIONES (L1T1-INT-CE-23-4269).

Sistema de Puertas de Andén y Plataforma (PDAP)

- CON-INT_L1T1-5300-300-CON-CN-MEC-IN-0003_V00 - INFORME DE PRUEBA ACELERADA DEL PROTOTIPO PDAP.

Sistema de Señalización y Control de Trenes CBTC

- CON-INT_L1T1-5200-600-CON-CN-MER-PC-0001_V00 - PROTOCOLO DE PRUEBA EN FABRICA DEL EQUIPO DE DETECCION DE ROTURA DE RIELES MONTADO SOBRE VEHICULO.
- CON-INT_L1T1-5200-600-CON-CN-PIE-PN-0001_V00 - PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO DEL EQUIPO DE DETECCION DE ROTURA DE RIEL.
- CON-INT_L1T1-5200-600-CON-CN-MER-PR-0001_V00 - PROCEDIMIENTO DE PRUEBA EN FABRICA DEL EQUIPO DE DETECCION DE ROTURA DE RIELES MONTADO SOBRE VEHICULO.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 71 de 104	

- CON-INT_L1T1-5200-000-CON-ED-INS-HW-0027_V00 - DIAGRAMAS DE GABINETES RRS.
- CON-INT_L1T1-5200-000-CON-ED-INS-PL-0001_V00 - ESQUEMATICOS COMUNICACIONES TREN – VIA.
- CON-INT_L1T1-5200-000-CON-ED-INS-PL-0002_V00 - ESQUEMATICOS SISTEMA DE TRANSMISION DE DATOS.
- CON-INT_L1T1-5200-000-CON-ED-INS-HW-0020_V00 - DIAGRAMAS DE LOS ARMARIOS RATC.
- CON-INT_L1T1-5200-000-CON-ED-INS-PL-0006_V00 - ESQUEMAS DE SEÑALIZACION A BORDO.
- CON-INT_L1T1-5200-000-CON-ED-INS-HW-0021_V00 - DIAGRAMAS DE LOS ARMARIOS ATS.
- CON-INT_L1T1-5200-000-CON-ED-INS-HW-0022_V00 - DIAGRAMAS DE GABINETES OCS.
- CON-INT_L1T1-5200-000-CON-ED-INS-HW-0023_V00 - DIAGRAMAS DE GABINETE DCC/BEC.
- CON-INT_L1T1-5200-000-CON-ED-INS-HW-0024_V00 - DIAGRAMAS DE GABINETES OTS.
- CON-INT_L1T1-5200-000-CON-ED-INS-PL-0003_V00 - PLANO GENERAL DE VIA.
- CON-INT_L1T1-5200-000-CON-ED-INS-HW-0025_V00 - DIAGRAMAS DE GABINETES DCS.
- CON-INT_L1T1-5200-000-CON-ED-INS-PL-0007_V00 - ESQUEMAS DE SEÑALIZACION A BORDO DE VEHICULOS DE MANTENIMIENTO.

Sistema de Peaje y Control de Acceso

- ALCANCE DEL CONCESIONARIO ML1 PARA INSTALACIONES MEP PARA EL SISTEMA INTEROPERABLE DE RECAUDO-SIR.
- CON-INT_L1T1-5600-000-CON-ED-INS-PN-0001_VDD - PLAN DE ENTRENAMIENTO Y OPERACION - PEA.

Sistema de Alimentación de Energía

- CON-INT_NOTIFICACION DOC_ML1-TRN-027987_SUMINISTRO DE ENERGIA SER 1 PATIO TALLER - DISEÑO CIVIL_VEE.
- PROYECTO DE CARGA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ-PLMB SUBESTACIÓN SER 1 60 MW ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA PARA RESERVA DE CAPACIDAD RESOLUCIÓN CREG 075-2021.
- PROYECTO DE CARGA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ-PLMB SUBESTACIÓN SER 2 60 MW - ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA PARA RESERVA DE CAPACIDAD - RESOLUCIÓN CREG 075-2021.

Diversas

- CON-INT_L1T1-CON-DPY-IN-0011_V00 - INFORME DE GESTION DEL PROYECTO – FEBRERO 2024.
- COMUNICADOS: EXT24-0004336 INFORME MENSUAL 42 VBB; EXT24-0005524 INFORME MENSUAL 42 VCC, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024.
- LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y LISTADO DE AUTORIDADES Y FIRMAS TECNICAS A ABRIL 1 DE 2024.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 72 de 104		

- CON-INT_L1T1-1500-000-CON-ED-CNL-MC-0001_VDD - GENERAL PATIO TALLER - CANALIZACIONES - MEMORIAS DE CALCULO.
- CON-INT_L1T1-CON-GGP-IN-0032_V00 - MEMORIA TECNICA DEL PROYECTO PLMB - PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE MARZO HASTA 30 DE MARZO 2024.
- CUESTIONARIO MIEMBRO INDEPENDIENTE JUNTA DIRECTIVA.
- SOLICITUD INFORME EJECUTIVO – INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 73 de 104	

1.2.13. Seguimiento Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos

Una vez realizado el seguimiento a las actividades del componente de tránsito durante el mes de abril de 2024, se continúan con mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Movilidad (en adelante SDM), Empresa Metro de Bogotá (en adelante EMB), PMO, Concesionario Metro Línea 1 (en adelante Concesionario) y Consorcio Supervisor PLMB (en adelante interventoría) para los Planes de Manejo de Tránsito (en adelante PMT) específicos del alto impacto de la Primera Línea Metro de Bogotá (en adelante PLMB), comités de tránsito para el seguimiento de los Planes de Manejo de Tránsito y comités de seguimiento del componente de tránsito.

Igualmente, se emite concepto de No objeción a los PMT presentados por el Concesionario para la etapa de construcción del viaducto, demolición de estaciones BRT de Transmilenio, construcción de patio taller, ramal técnico, parque Gibraltar, intercambiador vial de la Avenida Caracas por Avenida Calle 72, traslado de redes, actividades de tratamiento silvicultural y construcción de los puentes vehiculares de la Avenida Primero de Mayo (AC 26 Sur) por Avenida Congreso Eucarístico (AK 68) para posterior aprobación por parte de la SDM – Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito de dichos PMT en el Consolidado de Obras de Infraestructura (en adelante COI).

El estudio de tránsito del corredor de la PLMB se encuentra No objetado por parte de la interventoría, el tomo I fue validado por la SDM mediante comunicado SI- 202222409179791 el 7 de octubre de 2022, el tomo II y III (parte A) emite concepto técnico favorable mediante comunicado SI- 202322415915251 el 28 de noviembre de 2023 y para el tomo II y III (parte B) el Concesionario atiende las observaciones emitidas por la SDM del comunicado SI-202322418324091 emitido por la SDM el pasado 21 de diciembre de 2023 y radica ante la misma entidad el 26 de enero de 2024 mediante radicado SDM-202461200392282 el tomo II y III (parte B) emite concepto técnico favorable mediante comunicado SI- 202422404205421 el 30 de marzo de 2024.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 74 de 104	

1.3. Información legal del Contrato

a) Número del Contrato

Contrato de Interventoría N.º. 148 de 2020

b) Objeto

El Interventor se obliga para con la EMB a realizar la Interventoría integral, técnica, económica, financiera, contable, jurídica, administrativa, operativa, predial, ambiental, social y de seguridad salud en el trabajo, en relación con las obligaciones adquiridas por el Concesionario a través del Contrato de Concesión que dicho Concesionario ejecute durante la vigencia de este Contrato.

Por consiguiente, el objeto del Contrato comprende, sin limitarse, a la verificación en forma presencial en los términos establecidos en el Contrato de Concesión —y en lo no señalado por éste, en este Contrato— de las obligaciones a cargo del Concesionario en relación con:

- i)* La financiación, Estudios y Diseños de Detalle Principales y Otros Estudios y Diseños de Detalle, ejecución de las Obras de Construcción, Obras de la Fase Previa, Obras de Edificaciones, Obras para Redes a Cargo del Concesionario, Obras de Adecuación y Reparación de Desvíos, Obras para Intersección Especiales, la Gestión Social y Ambiental del Proyecto, así como la Operación y el Mantenimiento del Proyecto.
- ii)* La financiación, diseño, instalación, suministro, pruebas individuales y de conjunto, Certificaciones y puesta en marcha, así como la Operación, reposición, Mantenimiento del Material Rodante y de los Sistemas Metro-Ferrovios, y la prestación del servicio público de transporte masivo férreo de pasajeros en Bogotá a través de la PLMB.
- iii)* La Reversión Parcial, la Reversión y liquidación del Contrato de Concesión, en el caso en que dichas actividades ocurran durante la vigencia del presente Contrato,
- iv)* En general, verificar, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión y en este Contrato, el cumplimiento por parte del Concesionario de sus obligaciones contractuales”.

c) Fecha de suscripción del Contrato

2020-08-25

d) Fecha de inicio del Contrato

2020-09-23

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 75 de 104	

e) Fecha Máxima de terminación del Contrato

2031-09-22

f) Plazo, prórrogas, suspensiones y reiniciación en sus diferentes fases

Máximo once (11) años, contados a partir de la entrada en vigor del Contrato, o cuando el precio del Contrato del que trata la sección 6.2 de estas CEC se agote, lo que suceda primero. El acta de Inicio del Contrato de la Interventoría se suscribió el 2020-09-23 fecha en la cual entra en vigor el Contrato de Interventoría.

g) Valor del Contrato, adiciones y modificaciones

El Precio del Contrato corresponde a la suma de doscientos veintitrés mil trescientos dieciocho millones ochocientos treinta y seis mil cincuenta y tres pesos con sesenta centavos (COP 223.318.836.053,60) de diciembre de 2017, IVA incluido. De acuerdo con los valores contenidos en la Propuesta del Interventor y las condiciones establecidas en este Contrato, por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el mismo y en los documentos del Proceso de Selección del Interventor.

El porcentaje de participación de la Interventoría se encuentra distribuido de la siguiente manera:

<i>EMPRESA</i>	<i>Participación (%)</i>
<i>AYESA México S.A de C.V.</i>	<i>25</i>
<i>AYESA ingeniería y arquitectura SAU, Sucursal Colombia</i>	<i>15</i>
<i>MAB Ingeniería de Valor S.A.</i>	<i>20</i>
<i>MM S.P.A.</i>	<i>15</i>
<i>ITALFERR S.P.A.</i>	<i>25</i>

Tabla 1.3-1. Porcentaje de participación, Consorcio Supervisor PLMB.

En el mes de marzo de 2023 se surtió modificación al Contrato de Interventoría, a saber, así:

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 76 de 104	

No. DE MODIFICACIÓN	FECHA	MODIFICACION REALIZADA
Modificación No. 1	10 de marzo de 2023	<p>El 10 de marzo de 2023, las partes suscribieron el modificadorio 1, el ajustando las siguientes cláusulas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numerales 1 y 2 de la Cláusula 6.4, romanito XVI de las CEC del contrato de interventoría - Literal k, del numeral 1, Sección II del Apéndice A2 contrato de interventoría - Literal o, al numeral 1 del Apéndice A2 del contrato de interventoría - Cláusula 6.4 romanito VII numerales 1 y 3 de las CEC del contrato de interventoría - Cláusula 6.4 romanito VIII numerales 1 y 3 de las CEC del contrato de interventoría - Cláusula 3.4, literal b) de las CEC del contrato de interventoría

h) Supervisor del Contrato

Gerente Ejecutiva PLMB (E) – Yolanda Cristina Restrepo Gualteros

i) Informe en relación con el estado de las garantías:

En el presente literal se muestra información general sobre las garantías constituidas en el Contrato de interventoría 148 de 2020 sección III '*Condiciones Especiales del contrato CEC*'.

- Se actualizaron las Garantías Contractuales del Contrato de Interventoría conforme al inicio de la Fase de Construcción surtida el 25 de julio de 2023, las cuales fueron aprobadas por la EMB mediante oficio EXTS23-0004681.
- Mediante oficio L1T1-INT-CE-24-0649 (EXT24-0002719) la Interventoría remitió para revisión y aprobación de la EMB las Garantías Contractuales actualizadas conforme la variación del IPC 2024, las cuales fueron aprobadas por la EMB mediante oficio EXTS24-00015530.

A continuación, se muestran las Garantías Contractuales aprobadas por la EMB.

I. ACTUALIZACIÓN IPC 2024

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:

Contrato No.	148 de 2020
Objeto de la póliza	AMPARA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES CAUSADOS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (ASEGURADO), LOS CUALES REPRESENTEN LESIÓN O MUERTE A PERSONAS Y/O EL DETERIORO O DESTRUCCIÓN DE BIENES DE TERCEROS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 148 DE 2020: 'EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA CON LA EMB A REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO, EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL CONCESIONARIO A TRAVÉS DEL CONTRATO DE

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA			
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.			
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 77 de 104

Contrato No.	148 de 2020	
	CONCESIÓN QUE DICHO CONCESIONARIO EJECUTE DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO.	
Contratista	CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	
Tomador/Afianzado	CONSORCIO SUPERVISOR PLMB NIT 901404612-0 CONFORMADO POR: AYESA MÉXICO SA DE CV IDENTIFICADO CON NUMERO RFC AME031128173(25%) AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAU SUCURSAL COLOMBIA NIT. 900494141-4 (15%) MAB INGENIERÍA DE VALOR SA NIT. 900139110-5 (20%) MM SPA IDENTIFICADO CON NÚMERO 01742310152 (15%) ITALFERR SPA IDENTIFICADO CON NÚMERO 06770620588 (25%)	
Asegurados de la Póliza	CONSORCIO SUPERVISOR PLMB NIT 901404612-0 Y/O EMPRESA METRO DE BOGOTA SA NIT 901038962-3 Y/O CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	
Beneficiarios	TERCEROS AFECTADOS Y/O EMPRESA METRO DE BOGOTA SA NIT 901038962-3 Y/O CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	
Compañía Aseguradora	Seguros del Estado S. A	
Nº de póliza	15-40-101089677 (Anexo 1)	
Fecha de expedición	2024-02-14	
Riesgos asegurados (Amparos)	Vigencia	Valor asegurado
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	Desde 2023-07-25 Hasta 2024-07-25	\$30.112.901.063.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	Desde 2023-07-25 Hasta 2024-07-25	\$30.112.901.063.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	Desde 2023-07-25 Hasta 2024-07-25	\$30.112.901.063.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Desde 2023-07-25 Hasta 2024-07-25	\$30.112.901.063.00
RESPONSABILIDAD PATRONAL CIVIL	Desde 2023-07-25 Hasta 2024-07-25	\$30.112.901.063.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	Desde 2023-07-25 Hasta 2024-07-25	\$30.112.901.063.00
GASTOS MÉDICOS	Desde 2023-07-25 Hasta 2024-07-25	\$30.112.901.063.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	Desde 2023-07-25 Hasta 2024-07-25	\$30.112.901.063.00

Póliza de Cumplimiento:

Contrato No.	148 de 2020
Objeto de la póliza	AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO 148 DEL 2020 CUYO OBJETO ES: 'EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA CON LA EMB A REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO, EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL CONCESIONARIO A TRAVÉS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN QUE DICHO CONCESIONARIO EJECUTE DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO.
Contratista	CONSORCIO SUPERVISOR PLMB
Compañía aseguradora	Seguros del Estado S.A.
Tomador/Afianzado	CONSORCIO SUPERVISOR PLMB NIT 901404612-0 CONFORMADO POR: AYESA MÉXICO SA DE CV IDENTIFICADO CON NUMERO RFC AME031128173(25%) AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAU SUCURSAL COLOMBIA NIT. 900494141-4 (15%) MAB INGENIERÍA DE VALOR SA NIT. 900139110-5 (20%) MM SPA IDENTIFICADO CON NÚMERO 01742310152 (15%)

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 78 de 104	

Contrato No.	148 de 2020	
	ITALFERR SPA IDENTIFICADO CON NÚMERO 06770620588 (25%)	
Compañía Aseguradora	Seguros del Estado S. A	
Nº de póliza	15-44-101284815 (Anexo 1)	
Fecha de expedición	2024-02-14	
Riesgos asegurados (Amparos)	Vigencia	Valor asegurado
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Desde 2023-07-25 Hasta 2028-03-14	\$30.112.901.063.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Desde 2023-07-25 Hasta 2030-09-14	\$30.112.901.063.00
CALIDAD DEL SERVICIO	Desde 2027-09-14 Hasta 2032-09-14	\$30.112.901.063.00

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 79 de 104	

1.4. Información Administrativa y Financiera del Contrato

a) Soporte que demuestra que el interventor está a paz y salvo de las obligaciones tributarias

En el LINK se encuentra el Anexo 1.4 A Certificado cumplimiento Obligaciones Tributarias

[1.4. Información Administrativa y Financiera.pdf](#)

b) Valor pagado del Contrato, detallando el valor a pagar del mes en curso y pago acumulado

Concepto	Valor de referencia en pesos (\$)	Pesos colombianos (\$ dic 2017)	Dólares estadounidenses (US dic 2017)
Valor Fase Previa	48.873.741.183	26.319.044.561,00	2.826.941,00
Valor Fase de Construcción	174.743.502.391	91.309.157.653,00	9.807.559,00
Valor Fase de Certificaciones Pruebas, Certificaciones y Puesta en Marcha	24.638.014.701	6.650.139.855,00	714.295,00
Etapas de Operación y Mantenimiento	32.351.956.126	17.835.298.259,00	1.915.698,00
Valor antes de IVA (incluye todos los demás tributos a cargo del Consultor)	280.607.214.401	142.113.640.328,00	15.264.493,00
IVA (19%)	53.315.370.736	27.001.591.662,32	2.900.253,67
Valor total	333.922.585.137	169.115.231.990,32	18.164.746,67

Tabla 1.4-1. Valores del Contrato

Nota: Los pesos y dólares están expresados en cifras constantes de diciembre de 2017

Se presenta la causación de la Retribución del Interventor en pesos constantes de diciembre de 2017, y la causación acumulada, antes de IVA.

ACTA	No. DE CONTRATO	PERIODO	VALOR OFERTADO PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017		VALOR CAUSADO PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017	
1	148-2020	oct-20	26.319.044.561,00	COP	324.926.476,06	COP
			2.826.941,00	USD	34.900,51	USD
2	148-2020	nov-20	26.319.044.561,00	COP	974.779.428,19	COP
			2.826.941,00	USD	104.701,52	USD
3	148-2020	dic-20	26.319.044.561,00	COP	1.007.272.075,79	COP
			2.826.941,00	USD	108.191,57	USD
4	148-2020	ene-21	26.319.044.561,00	COP	1.007.272.075,79	COP
			2.826.941,00	USD	108.191,57	USD
5	148-2020	feb-21	26.319.044.561,00	COP	909.794.132,97	COP
			2.826.941,00	USD	97.721,42	USD
6	148-2020	mar-21	26.319.044.561,00	COP	1.007.272.075,79	COP
			2.826.941,00	USD	108.191,57	USD
7	148-2020	abr-21	26.319.044.561,00	COP	974.779.428,19	COP
			2.826.941,00	USD	104.701,52	USD
8	148-2020	may-21	26.319.044.561,00	COP	1.007.272.075,79	COP
			2.826.941,00	USD	108.191,57	USD

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 80 de 104	

ACTA	No. DE CONTRATO	PERIODO	VALOR OFERTADO PESOS Y DOLARES		VALOR CAUSADO PESOS Y DOLARES	
			CONSTANTES DIC 2017		CONSTANTES DIC 2017	
9	148-2020	jun-21	26.319.044.561,00	COP	974.779.428,19	COP
			2.826.941,00	USD	104.701,52	USD
10	148-2020	jul-21	26.319.044.561,00	COP	1.007.272.075,79	COP
			2.826.941,00	USD	108.191,57	USD
11	148-2020	ago-21	26.319.044.561,00	COP	1.007.272.075,79	COP
			2.826.941,00	USD	108.191,57	USD
12	148-2020	sep-21	26.319.044.561,00	COP	974.779.428,19	COP
			2.826.941,00	USD	104.701,52	USD
13	148-2020	oct-21	26.319.044.561,00	COP	1.007.272.075,79	COP
			2.826.941,00	USD	108.191,57	USD
14	148-2020	nov-21	26.319.044.561,00	COP	974.779.428,19	COP
			2.826.941,00	USD	104.701,52	USD
15	148-2020	dic-21	26.319.044.561,00	COP	1.007.272.075,79	COP
			2.826.941,00	USD	108.191,57	USD
16	148-2020	ene-22	26.319.044.561,00	COP	1.007.272.075,79	COP
			2.826.941,00	USD	108.191,57	USD
17	148-2020	feb-22	26.319.044.561,00	COP	909.794.132,97	COP
			2.826.941,00	USD	97.721,42	USD
18	148-2020	mar-22	26.319.044.561,00	COP	1.007.272.075,79	COP
			2.826.941,00	USD	108.191,57	USD
19	148-2020	abr-22	26.319.044.561,00	COP	974.779.428,19	COP
			2.826.941,00	USD	104.701,52	USD
20	148-2020	may-22	26.319.044.561,00	COP	1.007.272.075,79	COP
			2.826.941,00	USD	108.191,57	USD
21	148-2020	jun-22	26.319.044.561,00	COP	974.779.428,19	COP
			2.826.941,00	USD	104.701,52	USD
22	148-2020	jul-22	26.319.044.561,00	COP	1.007.272.075,79	COP
			2.826.941,00	USD	108.191,57	USD
23	148-2020	ago-22	26.319.044.561,00	COP	1.007.272.075,79	COP
			2.826.941,00	USD	108.191,57	USD
24	148-2020	sep-22	26.319.044.561,00	COP	974.779.428,19	COP
			2.826.941,00	USD	104.701,52	USD
25	148-2020	oct-22	26.319.044.561,00	COP	1.007.272.075,79	COP
			2.826.941,00	USD	108.191,57	USD
26	148-2020	nov-22	26.319.044.561,00	COP	974.779.428,19	COP
			2.826.941,00	USD	104.701,52	USD
27	148-2020	dic-22	26.319.044.561,00	COP	1.007.272.075,79	COP
			2.826.941,00	USD	108.191,57	USD
28	148-2020	ene-23	26.319.044.561,00	COP	1.007.272.075,79	COP
			2.826.941,00	USD	108.191,57	USD
29	148-2020	feb-23	26.319.044.561,00	COP	909.794.132,97	COP
			2.826.941,00	USD	97.721,42	USD
30	148-2020	marzo 1 - 30	26.319.044.561,00	COP	974.779.428,19	COP
			2.826.941,00	USD	104.701,52	USD
31	148-2020	mar-31	26.319.044.561,00	COP	27.618.750,47	COP
			2.826.941,00	USD	2.966,54	USD

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA			
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.			
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	

ACTA	No. DE CONTRATO	PERIODO	VALOR OFERTADO PESOS Y DOLARES		VALOR CAUSADO PESOS Y DOLARES	
			CONSTANTES DIC 2017		CONSTANTES DIC 2017	
32	148-2020	abr-23	26.319.044.561,00	COP	828.562.513,96	COP
			2.826.941,00	USD	88.996,29	USD
33	148-2020	may-23	26.319.044.561,00	COP	856.181.264,42	COP
			2.826.941,00	USD	91.962,83	USD
34	148-2020	jun-23	26.319.044.561,00	COP	828.562.513,96	COP
			2.826.941,00	USD	88.996,29	USD
35	148-2020	julio 1 - 25	26.319.044.561,00	COP	690.468.761,63	COP
			2.826.941,00	USD	74.163,58	USD
35	148-2020	julio 26 - 31	91.309.157.653,00	COP	336.313.656,18	COP
			9.807.559,00	USD	36.123,61	USD
36	148-2020	ago-23	91.309.157.653,00	COP	1.737.620.556,93	COP
			9.807.559,00	USD	186.638,63	USD
37	148-2020	sep-23	91.309.157.653,00	COP	1.681.568.280,90	COP
			9.807.559,00	USD	180.618,03	USD
38	148-2020	oct-23	91.309.157.653,00	COP	1.737.620.556,93	COP
			9.807.559,00	USD	186.638,63	USD
39	148-2020	nov-23	91.309.157.653,00	COP	1.681.568.280,90	COP
			9.807.559,00	USD	180.618,03	USD
40	148-2020	dic-23	91.309.157.653,00	COP	1.737.620.556,93	COP
			9.807.559,00	USD	186.638,63	USD
41	148-2020	ene-24	91.309.157.653,00	COP	1.737.620.556,93	COP
			9.807.559,00	USD	186.638,63	USD
42	148-2020	feb-24	91.309.157.653,00	COP	1.625.516.004,87	COP
			9.807.559,00	USD	174.597,43	USD
43	148-2020	mar-24	91.309.157.653,00	COP	1.737.620.556,93	COP
			9.807.559,00	USD	186.638,63	USD

Tabla 1.4-2. Causación Retribución del Interventor a pesos y dólares constantes de diciembre de 2017 antes de IVA

De acuerdo con la modificación No. 1 al Contrato de Interventoría No. 148 de 2020, el plazo de la Fase Previa se extiende hasta el 30 de marzo de 2023, acorde con la modificación al Contrato de Concesión. Dicha Fase no culminó en esta fecha prevista por causas no imputables a la Interventoría. Aunque a solicitud de la Empresa Metro de Bogotá se realiza un descuento del 15% en la remuneración del Interventor a partir del día 31 de marzo de 2023 hasta la terminación de la Fase Previa, esta Interventoría no está de acuerdo con dicho descuento.

ACTA	No. DE CONTRATO	PERIODO	CAUSACIÓN ACUMULADA PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017	
1	148-2020	oct-20	324.926.476,06	COP
			34.900,51	USD
2	148-2020	nov-20	1.299.705.904,25	COP
			139.602,02	USD
3	148-2020	dic-20	2.306.977.980,04	COP
			247.793,59	USD
4	148-2020	ene-21	3.314.250.055,83	COP
			355.985,16	USD
5	148-2020	feb-21	4.224.044.188,80	COP

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 82 de 104	

ACTA	No. DE CONTRATO	PERIODO	CAUSACIÓN ACUMULADA PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017	
			453.706,58	USD
6	148-2020	mar-21	5.231.316.264,59	COP
			561.898,15	USD
7	148-2020	abr-21	6.206.095.692,78	COP
			666.599,67	USD
8	148-2020	may-21	7.213.367.768,57	COP
			774.791,24	USD
9	148-2020	jun-21	8.188.147.196,76	COP
			879.492,76	USD
10	148-2020	jul-21	9.195.419.272,55	COP
			987.684,32	USD
11	148-2020	ago-21	10.202.691.348,34	COP
			1.095.875,89	USD
12	148-2020	sep-21	11.177.470.776,52	COP
			1.200.577,41	USD
13	148-2020	oct-21	12.184.742.852,31	COP
			1.308.768,98	USD
14	148-2020	nov-21	13.159.522.280,50	COP
			1.413.470,50	USD
15	148-2020	dic-21	14.166.794.356,29	COP
			1.521.662,07	USD
16	148-2020	ene-22	15.174.066.432,08	COP
			1.629.853,64	USD
17	148-2020	feb-22	16.083.860.565,05	COP
			1.727.575,06	USD
18	148-2020	mar-22	17.091.132.640,85	COP
			1.835.766,63	USD
19	148-2020	abr-22	18.065.912.069,03	COP
			1.940.468,14	USD
20	148-2020	may-22	19.073.184.144,82	COP
			2.048.659,71	USD
21	148-2020	jun-22	20.047.963.573,01	COP
			2.153.361,23	USD
22	148-2020	jul-22	21.055.235.648,80	COP
			2.261.552,80	USD
23	148-2020	ago-22	22.062.507.724,59	COP
			2.369.744,37	USD
24	148-2020	sep-22	23.037.287.152,78	COP
			2.474.445,89	USD
25	148-2020	oct-22	24.044.559.228,57	COP
			2.582.637,46	USD
26	148-2020	nov-22	25.019.338.656,76	COP
			2.687.338,98	USD
27	148-2020	dic-22	26.026.610.732,55	COP
			2.795.530,55	USD
28	148-2020	ene-23	27.033.882.808,34	COP
			2.903.722,12	USD
29	148-2020	feb-23	27.943.676.941,31	COP
			3.001.443,53	USD

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 83 de 104	

ACTA	No. DE CONTRATO	PERIODO	CAUSACIÓN ACUMULADA PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017	
30	148-2020	marzo 1 - 30	28.918.456.369,50	COP
			3.106.145,05	USD
31	148-2020	mar-31	28.946.075.119,96	COP
			3.109.111,60	USD
32	148-2020	abr-23	29.774.637.633,93	COP
			3.198.107,89	USD
33	148-2020	may-23	30.630.818.898,35	COP
			3.290.070,72	USD
34	148-2020	jun-23	31.459.381.412,31	COP
			3.379.067,01	USD
35	148-2020	julio 1 - 25	32.149.850.173,94	COP
			3.453.230,59	USD
35	148-2020	julio 26 - 31	32.486.163.830,12	COP
			3.489.354,20	USD
36	148-2020	ago-23	34.223.784.387,05	COP
			3.675.992,83	USD
37	148-2020	sep-23	35.905.352.667,95	COP
			3.856.610,86	USD
38	148-2020	oct-23	37.642.973.224,88	COP
			4.043.249,49	USD
39	148-2020	nov-23	39.324.541.505,78	COP
			4.223.867,52	USD
40	148-2020	dic-23	41.062.162.062,71	COP
			4.410.506,15	USD
41	148-2020	ene-24	42.799.782.619,64	COP
			4.597.144,78	USD
42	148-2020	feb-24	44.425.298.624,51	COP
			4.771.742,21	USD
43	148-2020	mar-24	46.162.919.181,44	COP
			4.958.380,84	USD

Tabla 1.4-3. Causación acumulada de la Retribución del Interventor a pesos y dólares constantes de diciembre de 2017 antes de IVA

A continuación, se presenta los valores pagados al corte del presente informe tanto en valores constantes de diciembre de 2017, como en valores corrientes, antes de IVA.

ACTA	No. DE CONTRATO	PERIODO	VALOR PAGADO PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017		VALOR PAGADO ACUMULADO PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017	
1	148-2020	oct-20	282.686.034,17	COP	282.686.034,17	COP
			30.363,44	USD	30.363,44	USD
2	148-2020	nov-20	848.058.102,52	COP	1.130.744.136,69	COP
			91.090,32	USD	121.453,76	USD
3	148-2020	dic-20	876.326.705,94	COP	2.007.070.842,63	COP
			94.126,67	USD	215.580,43	USD
4	148-2020	ene-21	876.326.705,94	COP	2.883.397.548,57	COP
			94.126,67	USD	309.707,10	USD

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 84 de 104	

ACTA	No. DE CONTRATO	PERIODO	VALOR PAGADO PESOS Y DOLARES			VALOR PAGADO ACUMULADO PESOS Y DOLARES		
			CONSTANTES DIC 2017			CONSTANTES DIC 2017		
5	148-2020	feb-21	791.520.895,69	COP	3.674.918.444,26	COP		
			85.017,63	USD	394.724,73	USD		
6	148-2020	mar-21	876.326.705,94	COP	4.551.245.150,20	COP		
			94.126,67	USD	488.851,40	USD		
7	148-2020	abr-21	848.058.102,52	COP	5.399.303.252,72	COP		
			91.090,32	USD	579.941,72	USD		
8	148-2020	may-21	876.326.705,94	COP	6.275.629.958,66	COP		
			94.126,67	USD	674.068,39	USD		
9	148-2020	jun-21	848.058.102,52	COP	7.123.688.061,18	COP		
			91.090,32	USD	765.158,71	USD		
10	148-2020	jul-21	876.326.705,94	COP	8.000.014.767,12	COP		
			94.126,67	USD	859.285,38	USD		
11	148-2020	ago-21	876.326.705,94	COP	8.876.341.473,06	COP		
			94.126,67	USD	953.412,05	USD		
12	148-2020	sep-21	848.058.102,52	COP	9.724.399.575,58	COP		
			91.090,32	USD	1.044.502,37	USD		
13	148-2020	oct-21	876.326.705,94	COP	10.600.726.281,52	COP		
			94.126,67	USD	1.138.629,04	USD		
14	148-2020	nov-21	848.058.102,52	COP	11.448.784.384,04	COP		
			91.090,32	USD	1.229.719,36	USD		
15	148-2020	dic-21	876.326.705,94	COP	12.325.111.089,98	COP		
			94.126,67	USD	1.323.846,03	USD		
16	148-2020	ene-22	876.326.705,94	COP	13.201.437.795,92	COP		
			94.126,67	USD	1.417.972,70	USD		
17	148-2020	feb-22	791.520.895,69	COP	13.992.958.691,61	COP		
			85.017,63	USD	1.502.990,33	USD		
18	148-2020	mar-22	876.326.705,94	COP	14.869.285.397,55	COP		
			94.126,67	USD	1.597.117,00	USD		
19	148-2020	abr-22	848.058.102,52	COP	15.717.343.500,07	COP		
			91.090,32	USD	1.688.207,32	USD		
20	148-2020	may-22	876.326.705,94	COP	16.593.670.206,01	COP		
			94.126,67	USD	1.782.333,99	USD		
21	148-2020	jun-22	848.058.102,52	COP	17.441.728.308,53	COP		
			91.090,32	USD	1.873.424,31	USD		
22	148-2020	jul-22	876.326.705,94	COP	18.318.055.014,47	COP		
			94.126,67	USD	1.967.550,98	USD		
23	148-2020	ago-22	876.326.705,94	COP	19.194.381.720,41	COP		
			94.126,67	USD	2.061.677,65	USD		
24	148-2020	sep-22	848.058.102,53	COP	20.042.439.822,94	COP		
			91.090,32	USD	2.152.767,97	USD		
25	148-2020	oct-22	876.326.705,94	COP	20.918.766.528,88	COP		
			94.126,67	USD	2.246.894,64	USD		
26	148-2020	nov-22	805.712.486,39	COP	21.724.479.015,27	COP		
			91.090,32	USD	2.337.984,96	USD		
27	148-2020	dic-22	876.326.705,94	COP	22.600.805.721,21	COP		
			94.126,67	USD	2.432.111,63	USD		

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 85 de 104	

ACTA	No. DE CONTRATO	PERIODO	VALOR PAGADO PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017		VALOR PAGADO ACUMULADO PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017	
28	148-2020	ene-23	876.326.705,94	COP	23.477.132.427,15	COP
			94.126,67	USD	2.526.238,30	USD
29	148-2020	feb-23	791.520.895,69	COP	24.268.653.322,84	COP
			85.017,63	USD	2.611.255,93	USD
30	148-2020	marzo 1 - 30	848.058.102,52	COP	25.116.711.425,36	COP
			91.090,32	USD	2.702.346,25	USD
31	148-2020	mar-31	24.028.312,91	COP	25.140.739.738,27	COP
			2.580,89	USD	2.704.927,14	USD
32	148-2020	abr-23	720.849.387,15	COP	25.861.589.125,42	COP
			77.426,77	USD	2.782.353,91	USD
33	148-2020	may-23	744.877.700,05	COP	26.606.466.825,47	COP
			80.007,67	USD	2.862.361,58	USD
34	148-2020	jun-23	720.849.387,15	COP	27.327.316.212,62	COP
			77.426,77	USD	2.939.788,35	USD
35	148-2020	julio 1 - 25	600.707.822,62	COP	27.928.024.035,24	COP
			64.522,31	USD	3.004.310,66	USD
35	148-2020	julio 26 - 31	292.592.880,88	COP	28.220.616.916,12	COP
			31.427,54	USD	3.035.738,20	USD
36	148-2020	ago-23	1.503.915.402,78	COP	29.724.532.318,90	COP
			161.536,25	USD	3.197.274,45	USD
37	148-2020	sep-23	1.462.964.404,38	COP	31.187.496.723,28	COP
			157.137,69	USD	3.354.412,14	USD
38	148-2020	oct-23	1.511.729.884,53	COP	32.699.226.607,81	COP
			162.375,61	USD	3.516.787,75	USD
39	148-2020	nov-23	1.462.964.404,38	COP	34.162.191.012,19	COP
			157.137,69	USD	3.673.925,44	USD
40	148-2020	dic-23	1.511.729.884,53	COP	35.673.920.896,72	COP
			162.375,61	USD	3.836.301,05	USD

Tabla 1.4-4. Valores pagados en pesos y dólares constantes de diciembre de 2017 antes de IVA

Al valor pagado en pesos constantes de diciembre de 2017 por concepto del período de noviembre de 2022, se descontó el valor del acuerdo transaccional firmado por las partes el 28 de diciembre de 2022 por valor de COP \$ 42.345.616,13 constantes de diciembre de 2017.

Adicionalmente, al valor pagado del Informe No. 36 se le realizó un descuento de COP \$ 7.814.481,75 y 839,36, pesos y dólares constantes de diciembre de 2017 respectivamente, por concepto de un ajuste realizado al valor pagado de la retención del 13% correspondiente a la Fase Previa.

ACTA	No. DE CONTRATO	PERIODO	VALOR PAGADO PESOS Y DOLARES CORRIENTES		VALOR PAGADO ACUMULADO PESOS Y DOLARES CORRIENTES	
1	148-2020	oct-20	306.923.765,75	COP	306.923.765,75	COP
			32.071,02	USD	32.071,02	USD
2	148-2020	nov-20	919.458.784,70	COP	1.226.382.550,45	COP
			96.154,30	USD	128.225,32	USD

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 86 de 104	

ACTA	No. DE CONTRATO	PERIODO	VALOR PAGADO PESOS Y DOLARES			VALOR PAGADO ACUMULADO PESOS Y DOLARES		
			CORRIENTES			CORRIENTES		
3	148-2020	dic-20	953.724.112,08	COP	2.180.106.662,53	COP		
			99.452,99	USD	227.678,31	USD		
4	148-2020	ene-21	957.612.065,89	COP	3.137.718.728,42	COP		
			99.876,04	USD	327.554,35	USD		
5	148-2020	feb-21	870.411.649,42	COP	4.008.130.377,84	COP		
			90.704,47	USD	418.258,82	USD		
6	148-2020	mar-21	968.552.587,08	COP	4.976.682.964,92	COP		
			101.134,12	USD	519.392,94	USD		
7	148-2020	abr-21	942.909.008,75	COP	5.919.591.973,67	COP		
			98.676,13	USD	618.069,07	USD		
8	148-2020	may-21	984.104.402,34	COP	6.903.696.376,01	COP		
			102.782,80	USD	720.851,87	USD		
9	148-2020	jun-21	951.834.094,02	COP	7.855.530.470,03	COP		
			100.391,34	USD	821.243,21	USD		
10	148-2020	jul-21	986.816.928,25	COP	8.842.347.398,28	COP		
			104.236,76	USD	925.479,97	USD		
11	148-2020	ago-21	991.156.969,72	COP	9.833.504.368,00	COP		
			104.452,10	USD	1.029.932,07	USD		
12	148-2020	sep-21	962.859.199,35	COP	10.796.363.567,35	COP		
			101.357,21	USD	1.131.289,28	USD		
13	148-2020	oct-21	995.135.341,06	COP	11.791.498.908,41	COP		
			105.605,95	USD	1.236.895,23	USD		
14	148-2020	nov-21	967.759.246,17	COP	12.759.258.154,58	COP		
			102.701,45	USD	1.339.596,68	USD		
15	148-2020	dic-21	1.007.341.707,68	COP	13.766.599.862,26	COP		
			106.450,90	USD	1.446.047,58	USD		
16	148-2020	ene-22	1.024.068.950,83	COP	14.790.668.813,09	COP		
			107.346,65	USD	1.553.394,23	USD		
17	148-2020	feb-22	940.073.981,66	COP	15.730.742.794,75	COP		
			97.843,87	USD	1.651.238,10	USD		
18	148-2020	mar-22	1.051.194.209,99	COP	16.781.937.004,74	COP		
			109.773,46	USD	1.761.011,56	USD		
19	148-2020	abr-22	1.029.972.340,57	COP	17.811.909.345,31	COP		
			106.825,43	USD	1.867.836,99	USD		
20	148-2020	may-22	1.073.256.087,44	COP	18.885.165.432,75	COP		
			111.603,12	USD	1.979.440,11	USD		
21	148-2020	jun-22	1.043.972.474,33	COP	19.929.137.907,08	COP		
			109.486,56	USD	2.088.926,67	USD		
22	148-2020	jul-22	1.087.451.639,74	COP	21.016.589.546,82	COP		
			113.122,75	USD	2.202.049,42	USD		
23	148-2020	ago-22	1.098.572.995,99	COP	22.115.162.542,81	COP		
			113.082,66	USD	2.315.132,08	USD		
24	148-2020	sep-22	1.073.022.751,88	COP	23.188.185.294,69	COP		
			109.670,20	USD	2.424.802,28	USD		
25	148-2020	oct-22	1.116.746.919,63	COP	24.304.932.214,32	COP		
			113.785,58	USD	2.538.587,86	USD		

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 87 de 104	

ACTA	No. DE CONTRATO	PERIODO	VALOR PAGADO PESOS Y DOLARES		VALOR PAGADO ACUMULADO PESOS Y DOLARES	
			CORRIENTES		CORRIENTES	
26	148-2020	nov-22	1.035.347.852,76	COP	25.340.280.067,08	COP
			110.003,86	USD	2.648.591,72	USD
27	148-2020	dic-22	1.139.532.137,32	COP	26.479.812.204,40	COP
			113.321,67	USD	2.761.913,39	USD
28	148-2020	ene-23	1.159.785.664,16	COP	27.639.597.868,56	COP
			114.227,72	USD	2.876.141,11	USD
29	148-2020	feb-23	1.064.943.508,02	COP	28.704.541.376,58	COP
			103.749,35	USD	2.979.890,46	USD
30	148-2020	marzo 1 - 30	1.152.998.515,98	COP	29.857.539.892,56	COP
			111.528,04	USD	3.091.418,50	USD
31	148-2020	mar-31	32.668.291,29	COP	29.890.208.183,85	COP
			3.159,96	USD	3.094.578,46	USD
32	148-2020	abr-23	987.709.436,78	COP	30.877.917.620,63	COP
			95.278,42	USD	3.189.856,88	USD
33	148-2020	may-23	1.025.090.668,93	COP	31.903.008.289,56	COP
			98.702,32	USD	3.288.559,20	USD
34	148-2020	jun-23	994.998.256,42	COP	32.898.006.545,98	COP
			95.826,80	USD	3.384.386,00	USD
35	148-2020	julio 1 - 25	833.317.857,52	COP	33.731.324.403,50	COP
			80.007,99	USD	3.464.393,99	USD
35	148-2020	julio 26 - 31	405.892.621,07	COP	34.137.217.024,57	COP
			38.970,30	USD	3.503.364,29	USD
36	148-2020	ago-23	2.101.149.347,98	COP	36.238.366.372,55	COP
			201.198,20	USD	3.704.562,49	USD
37	148-2020	sep-23	2.054.520.068,93	COP	38.292.886.441,48	COP
			196.188,81	USD	3.900.751,30	USD
38	148-2020	oct-23	2.128.307.292,04	COP	40.421.193.733,52	COP
			202.650,72	USD	4.103.402,02	USD
39	148-2020	nov-23	2.069.312.734,18	COP	42.490.506.467,70	COP
			195.718,40	USD	4.299.120,42	USD
40	148-2020	dic-23	2.148.116.381,53	COP	44.638.622.849,23	COP
			202.041,46	USD	4.501.161,88	USD

Tabla 1.4-5. Valores pagados en pesos y dólares corrientes antes de IVA

Al valor pagado en pesos por concepto del período de noviembre de 2022 (Factura FE60), se descontó el valor del acuerdo transaccional firmado por las partes el 28 de diciembre de 2022 por valor de COP \$ 53.687.552,11.

Igualmente, al valor pagado correspondiente al Informe No. 36, se le realizó un descuento de COP \$10.624.373,30 y USD \$ 1.027,68, por concepto de un ajuste realizado al valor pagado de la retención del 13% de la Fase Previa.

En el mes de septiembre de 2023 se recibió el valor de la retención del 13% de los honorarios de la interventoría durante de la Fase Previa. Se presenta el cálculo correspondiente.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 88 de 104	

Retención Fase Previa COP	
Valor ofertado en Pesos FP COP dic 2017	26.319.044.561,00
Días	810
Días hasta duración estimada FP	891
Días adicionales duración estimada FP	118
IPC marzo 2023	131,77
IPC diciembre 2017	96,92
Valor Pesos retención Fase Previa	5.692.941.216,72

Tabla 1.4-6. Valores retención Fase Previa COP antes de IVA

Retención Fase Previa USD	
Valor ofertado en dólares FP USD dic 2017	2.826.941,00
Días	810
Días hasta duración estimada FP	891
Días adicionales duración estimada FP	118
IPCEU marzo 2023	301,836
IPCEU diciembre 2017	246,524
Valor dólares retención Fase Previa	550.670,76

Tabla 1.4-7. Valores retención Fase Previa USD antes de IVA

De acuerdo con la revisión de la fórmula de cálculo de la Retención de la Fase Previa, Sección 6.4 del Contrato de Interventoría No. 148 de 2020, efectuada por la Empresa Metro de Bogotá y el Consorcio Supervisor PLMB, en la cual se encontró que había un error en dicho cálculo, la Interventoría autoriza a la EMB a realizar un descuento de la facturación del Informe de Interventoría No. 36, por un monto en COP de 10.624.373,30 y USD de 1.027,68, valores antes de IVA.

A continuación, se presenta el valor a pagar por el informe correspondiente al mes de marzo de 2024 (antes de IVA), una vez sea aprobado dicho informe y se emita la respectiva factura. Este es el mes sobre el cual se tiene el último dato de inflación observada de Colombia y Estados Unidos, a la fecha de elaboración del presente informe.

Remuneración 1 – 31 de marzo de 2024:

MARZO 2024 - INFORME 43	Valor
Remuneración del 1 al 31 de marzo 2024 en pesos	2.536.510.074,23
Remuneración del 1 al 31 de marzo 2024 en pesos de dic de 2017	1.737.620.556,93
Valor ofertado en pesos fase construcción \$ dic 2017	91.309.157.653,00
Días	1629
Valor día en pesos fase construcción \$ dic 2017	56.052.276,03
IPC marzo 2024	141,48

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA			
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.			
Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 89 de 104	

MARZO 2024 - INFORME 43	Valor
IPC dic 2017	96,92
Rd	0%
Fecha inicial:	1 de marzo de 2024
Fecha final:	31 de marzo de 2024
Días	31
Valor a pagar COP (87%)	2.206.763.764,58
MARZO 2024 - INFORME 43	Valor
Remuneración del 1 al 31 de marzo 2024 en USD	236.460,62
Remuneración del 1 al 31 de marzo 2024 en USD de dic 2017	186.638,63
Valor ofertado en dólares fase construcción \$US dic 2017	9.807.559,00
Días	1629
Valor día en dólares fase construcción \$ dic 2017	6.020,60
IPCEU marzo 2024	312,332
IPCEU dic 2017	246,524
Rd	0%
Fecha inicial:	1 de marzo de 2024
Fecha final:	31 de marzo de 2024
Días	31
Valor a pagar USD (87%)	205.720,74

Tabla 1.4-8. Valor de la Retribución del Interventor enero de 2024 antes de IVA

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 90 de 104		

1.5 Información de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Interventoría

Los anexos correspondientes a este informe pueden ser consultados a través del siguiente enlace:

[1.5 Información SST interventoria.pdf](#)

En esta sección del informe, se exponen las actividades y acciones de la interventoría para garantizar, supervisar y vigilar el adecuado desarrollo del Contrato 148 de 2020 en lo relativo a la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). La redacción del presente informe se ajusta a las disposiciones establecidas en el Apéndice B del contrato de interventoría, específicamente en la Sección II, Numeral 1.5, y se complementa con la inclusión de los respaldos exigidos.

Con el objetivo de asegurar que la totalidad de los trabajadores involucrados en la ejecución del contrato de interventoría posean las competencias necesarias para salvaguardar su seguridad y salud, la interventoría ha implementado diversas actividades orientadas a la formación, sensibilización y gestión empresarial.

1.5.1 Formatos de Gestión SST del CSPLMB

A continuación, se presenta el análisis de los formatos de reporte de la gestión SST de la Interventoría, los cuales fueron diligenciados durante el periodo de reporte de este informe.

a) **GA-FR-023** Seguimiento mantenimiento vehículos, maquinaria y equipos:

La Interventoría contó con (12) vehículos para realizar los desplazamientos requeridos en el seguimiento al contrato. Las novedades relacionadas con el retiro de vehículos pueden consultarse en el formato correspondiente, acompañado de su justificación. Cada conductor realizó diariamente la inspección preoperacional del vehículo, dejando constancia mediante el formato adjunto (Anexo 1.5-13). Durante el periodo de reporte, los vehículos no presentaron ninguna novedad.

b) **GA-FR-024** Listado de vehículos, maquinaria y equipos:

Se contó con (12) vehículos. Todos los vehículos cuentan con el seguro obligatorio de accidente de tránsito (SOAT) y la revisión técnico-mecánica vigente, según corresponda.

c) **GA-FR-026** Abastecimiento de combustible: El suministro de combustible (gas, gasolina o diésel) a las camionetas utilizadas se llevó a cabo en estaciones de servicio. Durante el mes de reporte, no se registraron novedades en este aspecto.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA			
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.			
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 91 de 104

d) **GA-FR-027** Acciones preventivas y correctivas a los reportes preoperacionales de maquinaria, equipos y vehículos: El informe de gestión de acciones preventivas de equipos y maquinaria se incluye en el Anexo 1.5-1, detallando las medidas adoptadas a partir de los reportes preoperacionales.

e) **GA-FR-029** Inducción, Capacitación y/o Entrenamiento:

En el periodo, se registraron (10) ingresos de personal, de los que los soportes de inducción para (10) personas se detallan en el Anexo 1.5-7.

Asimismo, los respaldos de notificación de riesgos al personal están disponibles para su revisión en el Anexo 1.5-6.

f) **GA-FR-031** Listado personal, seguridad social y conceptos médicos ocupacionales:

Se presentan 179 personas vinculadas a la interventoría. Este periodo refleja la consolidación de 179 individuos, distribuidos entre 169 personas existentes, 10 nuevos ingresos, 4 retiros y 1 ingreso-retiro.

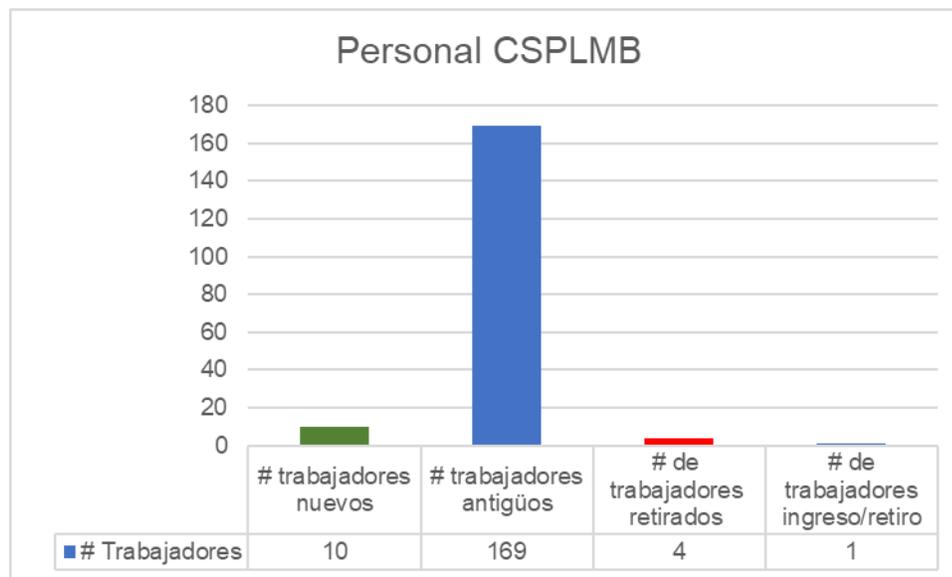


Ilustración 1.5-1. Seguimiento personal interventoría
Fuente, CSPLMB 2023

La Interventoría empleó: 58 mujeres (34%) y 121 hombres (70%)

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 92 de 104	

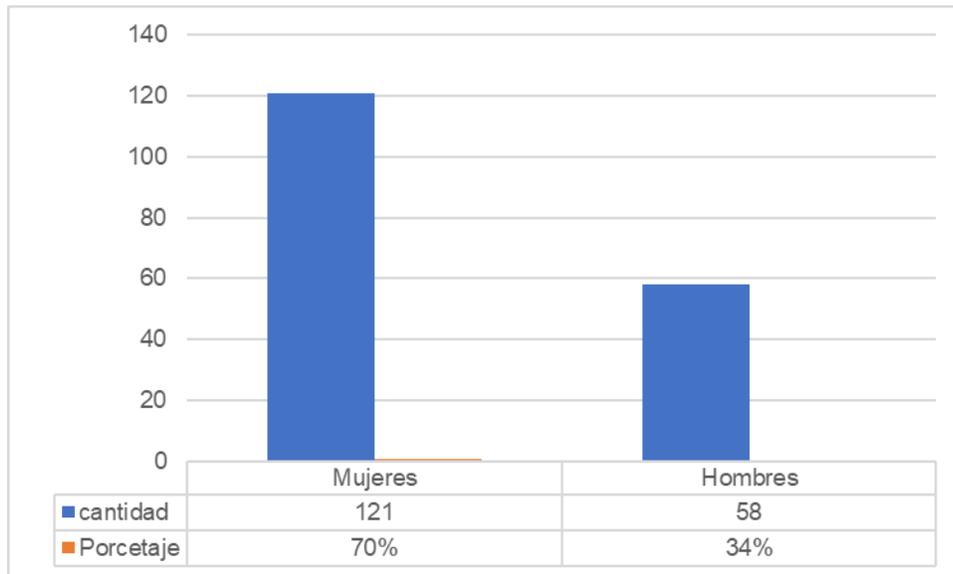


Ilustración 1.5-2. Seguimiento sexo personal interventoría
Fuente, CSPLMB 2023

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la interventoría llevó a cabo la verificación de la afiliación y/o pago de seguridad social, así como el Concepto Médico Ocupacional, como requisitos previos para el ingreso al contrato.

Nota: Cabe aclarar la información del formato 31 se actualizó según los exámenes médicos periódicos realizados.

Se procedió a verificar el cumplimiento del pago de seguridad social para todo el personal antiguo del proyecto. En el caso del personal ubicado en el extranjero, se adjuntan las certificaciones correspondientes.

Adicionalmente, la Interventoría gestionó el pago correspondiente a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) para el personal independiente contratado bajo la modalidad de prestación de servicios, y que realiza actividades clasificadas en riesgo IV o V.

Los documentos relativos al egreso del personal están disponibles para su revisión en el Anexo 1.5-5.

g) **GA-FR-032** Reporte de caracterización de accidentes, enfermedades laborales y ausentismo:

Durante el periodo de reporte, no se registraron accidentes de origen laboral.

A continuación, se presentan los resultados correspondientes a los indicadores AL (Accidentes Laborales) y EL (Enfermedades Laborales) para el mencionado periodo:

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 93 de 104		

- **Frecuencia de Accidentalidad:**
No se registraron accidentes laborales para cada 100 trabajadores que estuvieron laborando en dicho periodo. En consonancia con los trabajadores vinculados, 179, se concluye que no se presentaron accidentes de origen laboral en el mencionado periodo.
 - **Severidad de Accidentalidad:**
No se perdieron días laborales por accidentes de trabajo para cada 100 trabajadores que estuvieron laborando en dicho periodo. En consonancia con la totalidad de trabajadores vinculados, que fue de 179, se determina que no se perdieron días de trabajo por accidentes de origen laboral en el periodo.
 - **Accidentes Mortales:**
No se registraron accidentes mortales durante el periodo de reporte, lo que implica que el porcentaje de accidentes de trabajo mortales es de 0%.
 - **Prevalencia de Enfermedades Laborales:**
No se reportaron casos de enfermedades laborales durante el periodo de reporte, resultando en una prevalencia de 0 casos por cada 100.000 trabajadores.
 - **Incidencia de Enfermedades Laborales:**
No se reportaron nuevos casos de enfermedades laborales durante el periodo de reporte, lo que implica que la incidencia es de 0 casos nuevos por cada 100.000 trabajadores.
 - **Ausentismo por Causa Médica:**
Se registraron 8 días programados de trabajo perdidos debido a incapacidad médica en el periodo de reporte.
- h) **GA-FR-033** Reporte de incidentes laborales: Durante el mes pasado, no se registraron incidentes laborales en las actividades llevadas a cabo por la interventoría.
- i) **GA-FR-034** Registro de actos y condiciones inseguras: En el periodo reciente, se identificaron (1) condición insegura. El estado detallado de este reporte se encuentra disponible en el formato GA-FR-034 Registro de Actos y Condiciones Inseguras
- j) **GA-FR-037** Consolidado de emergencias: No se presentaron emergencias durante la ejecución de las actividades de la interventoría en el periodo de este informe.
- k) **GA-FR-050** Seguimiento, uso y manejo Elementos de Protección Personal (EPP): Durante el último periodo de reporte, se llevó a cabo el seguimiento al uso y manejo de los Elementos de Protección Personal (EPP). Se realizó la entrega de EPP a los cargos asociados, según lo establecido en los formatos de entrega de EPP y de acuerdo con las necesidades específicas de las actividades. Para el personal recién incorporado, la entrega de EPP no fue necesaria en dicho periodo, considerando su rol y tipo de contratación. Se pueden verificar soportes pertinentes en el Anexo 1.5-10. Es importante señalar que los demás ingresos reportados corresponden a contrataciones independientes.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 94 de 104	

1.5.2 Certificaciones de Paz y salvo

Original de la certificación emitida por el revisor fiscal (si aplica) o por el contador y el representante legal del Interventor, en la cual se certifique que se encuentra a paz y salvo por concepto de pagos de salarios, honorarios, prestaciones y seguridad social, de la totalidad del personal reportado en el respectivo período. La certificación presentada por el Interventor deberá contener el listado de personal certificado. Las respectivas certificaciones, del personal reportado en el presente periodo, se adjuntan en el Anexo 1.5-2.

Nota: En el certificado general de la interventoría se incluye el personal que se integró en el presente periodo según formato 31, no se incluye el personal que se retiró.

1.5.3 Afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad Social

Copias de afiliaciones y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral del Personal vinculado o retirado por el Interventor, dentro del periodo respectivo.

En el Anexo 1.5-3 se adjuntan las afiliaciones al SGSS del personal que ingreso durante el periodo del presente informe.

Además, se anexa el pago de seguridad social del personal antiguo que laboró en el periodo.

Para los trabajadores ubicados en el extranjero se anexan las respectivas certificaciones de sus empresas contratantes, que evidencian que están cubiertos por la seguridad social en sus países.

El CSPLMB realizó el respectivo pago de la ARL al personal independiente que tiene contrato por prestación de servicios, que realiza actividades clasificadas en riesgo IV o V.

Los respectivos soportes se adjuntan en el Anexo 1.5-3.

1.5.4 Pagos de salarios personal de interventoría

Soportes de pago de los salarios a los empleados del Interventor, dentro del periodo respectivo.

En el Anexo 1.5-4 se adjuntan los soportes de pago de nómina del mes reportado en el presente informe, de cada empleado de la interventoría.

Se presenta casos del personal profesional independiente contratado por la Interventoría por contrato de prestación de servicios, que tienen dedicaciones parciales, a quienes se le paga mes vencido una vez se revise y verifique la cuenta de cobro mensual que deben hacer llegar al área contable.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 95 de 104	

1.5.5 Egresos de personal/ Examen de retiro

Copia del formato de la notificación, en la cual le informo a su Personal el derecho que tiene a realizarse el examen médico de egreso, si fuere aplicable.

Se realiza la notificación del derecho a realizarse el examen médico de egreso, para el personal que ingreso en el presente periodo. Para su verificación en el Anexo 1.5- 5.

Como novedad del presente informe, los egresos son de metodología contractual independiente.

En el presente periodo se retiraron 4 personas y 1 ingreso- retiro del periodo. Para su verificación Anexo 1.5-5

1.5.6 Registro de la notificación de riesgos

Copia del formato de notificación de riesgos. Este soporte únicamente se deberá presentar, cuando se haya vinculado Personal nuevo dentro del respectivo periodo.

A cada trabajador que ingresa al proyecto, se le realiza la notificación de los riesgos a los que va a estar expuesto en su ambiente laboral, de acuerdo con el cargo a desempeña.

Durante el periodo se socializo (10) notificación de riesgos al personal que se vinculó en el periodo de reporte, verificar en el Anexo 1.5-6.

1.5.7 Registro de asistencia a la inducción SST

Copia de los formatos de inducción al Personal que se haya vinculado al Interventor dentro del respectivo periodo.

A todo el personal que ingreso al proyecto en el presente periodo, se le realizó una inducción en temas SST, como fueron: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Políticas: SST, de prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas, seguridad vial, objetivos del SG-SST, SGSS ARL, EPS, AFP, inducción PESV, definición y reporte de Accidentes y enfermedad laboral, Peligro y Riesgo, actos y condiciones inseguras, Reglamento de higiene y seguridad industrial, notificación de riesgos, plan de Emergencias, EPP uso y reposición, COPASST, Comité de Convivencia Laboral, acoso laboral, normas de seguridad. verificar en el Anexo 1.5-7.

1.5.8 Conceptos médicos ocupacionales

Durante el periodo se realizaron 3 exámenes ocupaciones debido al ingreso de personal reportado en el mes. Anexo 1.5-8.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 96 de 104	

1.5.9 Registro de Capacitaciones y entrenamientos

Copia de los formatos de capacitación y entrenamiento realizados en el respectivo período.

Para el proceso de formación en el mes del reporte se cumplió con las capacitaciones programadas en el cronograma de capacitación 2024, las temas que se dictaron fueron los siguientes:

- Actividad de pausas activas
- Campaña juego escalera trabajo seguro en alturas
- Capacitación Manejo Y Cuidado De La Fauna En El Proyecto PLMB
- Taller nutricional

Los soportes de las capacitaciones realizadas se presentan en el anexo 1.5-9.

Así mismo se realizó capacitación como actuar en caso de que ocurra un siniestro de tránsito como parte del plan de acción de la investigación de siniestro de tránsito que se presentó con uno de los vehículos de la Interventoría, verificar en anexo 1.5-16.

1.5.10 Entrega de EPP

Copia de las actas de entrega o reposición de los Elementos de Protección Personal (“EPP”) que haya sido entregado durante el periodo respectivo.

Los soportes de entrega o reposición de EPP se pueden verificar en el anexo 1.5-10.

De acuerdo con los entregables la reposición, se realizó conforme a la necesidad de las actividades; se incluye para verificación los soportes de la actividad en el anexo Anexo 1.5-10

Los demás colaboradores realizan trabajo de oficina y/o; por lo anterior no ha sido necesario la entrega de estos elementos.

1.5.11 Soporte Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (“COPASST”)

- a) Copia de la convocatoria y/o conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (“COPASST”), en caso de haber ocurrido durante el periodo respectivo. Adicionalmente, el Interventor deberá presentar el acta de la reunión del COPASST, que se haya llevado a cabo durante el periodo respectivo.

Se programa reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (“COPASST”) dentro de los 15 días del mes siguiente, se anexa soporte de reunión del mes de marzo en el Anexo 1.5-17

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 97 de 104	

1.5.12 Soporte Comité de Convivencia Laboral

Copia de la convocatoria y/o conformación del Comité de Convivencia Laboral.

No se programa esta actividad en el periodo del informe.

1.5.13 Aprobación emitida entidad gubernamental PESV

Adjuntar copia de la aprobación emitida por la Autoridad Gubernamental del Plan Estratégico de Seguridad Vial (“PESV”).

En relación con la aprobación ante la autoridad gubernamental, no se requiere aprobación según Decreto 2106/2019 artículo 110, se debe realizar reporte de autogestión de forma anual según resolución 40595/2022 en el paso 20 por los medios que disponga la entidad verificadora que le corresponda, cabe resaltar según ley 2050/2020 artículo 1 la entidad que le corresponde al Consorcio Supervisor PLMB es el Ministerio de trabajo el cual no se ha pronunciado.

1.5.14 Soporte cumplimiento PESV

Adjuntar copia de la certificación emitida por la Autoridad Gubernamental, respecto del cumplimiento de la implementación de PESV.

En relación con la aprobación ante la autoridad gubernamental, no se requiere aprobación según Decreto 2106/2019 artículo 110, se debe realizar reporte de autogestión de forma anual según resolución 40595/2022 en el paso 20 por los medios que disponga la entidad verificadora que le corresponda, cabe resaltar según ley 2050/2020 artículo 1 la entidad que le corresponde al Consorcio Supervisor PLMB es el Ministerio de trabajo el cual no se ha pronunciado.

La Interventoría se encuentra en la implementación del PESV el cual hace parte del SG SST de la organización.

1.5.15 Registro de capacitaciones conductores

Adjuntar copia de los soportes de capacitación de conductores en concordancia con las actividades programadas en el período respectivo.

Se realizaron verificaciones visuales en el frente de obra en el periodo respectivo entre el Interventor y la EMB relacionada con la gestión SST. Los soportes de formación de conductores se incluyen en el Anexo 1.5-9.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 98 de 104	

1.5.16 Soporte Actas de comité ambiental y SST

Copia de las actas de los comités Ambiental y de SST del Interventor, que hayan sido suscritas en el período respectivo.

Las actas de los comités llevados a cabo durante este periodo se encuentran actualmente en proceso de revisión. Por lo tanto, se anexarán en la próxima versión

1.5.17 Registro Fotográfico

Registro fotográfico a color georeferenciado de las actividades de SST ejecutadas en el periodo correspondiente.

En el Anexo 1.5-11 se adjunta el registro fotográfico, donde se hace una breve descripción de cada fotografía, de acuerdo con las actividades realizadas en el periodo.

1.5.18 Registro de PQRS

Registro acumulado de las peticiones, quejas y reclamos (“PQRS”) gestionadas por el Interventor. El formato será acordado con la EMB al momento de la firma del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, y el mismo se ajustará de acuerdo con las necesidades de la EMB.

No se han gestionado PQRS relacionadas con el componente SST en el periodo. [OBJ]

1.5.19 Registro de inspecciones

Adjuntar el listado de las inspecciones planeadas y ejecutadas, en el cual se deberán detallar las fechas en las cuales se llevaron a cabo, durante el periodo respectivo.

Actividades de Inspección realizadas:

- Inspección de Botiquín
- Inspección de extintores
- Inspección de instalaciones locativas
- Inspección de EPP

Las inspecciones preoperacionales diarias de los vehículos empleados durante el mes se han realizado sin novedad.

Los registros de inspección y lista de inspecciones se presentan en el Anexo 1.5-13.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 99 de 104	

Las inspecciones se realizan con el objetivo de verificar condiciones de seguridad en las actividades que se realizan durante el periodo del presente informe, como resultado de estas, se obtiene un control y buenas prácticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, para evitar cualquier afectación física y moral de los trabajadores. Se realizan las inspecciones planeadas en el Copasst.

1.5.20 Documentos finales de año

Adicionalmente, al final del año fiscal el Interventor deberá presentar a la EMB la documentación relacionada con la gestión de SST del Contrato:

- i. Certificación emitida por el revisor fiscal o representante legal y el contador, en la cual conste que a la fecha de su emisión no se han interpuesto reclamaciones o demandas, como consecuencia de la falta de pago de salarios u honorarios, prestaciones y seguridad sociales del Personal del Interventor. En caso de existir reclamaciones o demandas deberá acompañarse de un informe de las acciones tomadas por el Interventor.

No aplica para el periodo del presente informe.

- ii. Documento emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (“ARL”), en la cual conste una relación de los accidentes laborales que hayan ocurrido durante la respectiva anualidad.

No aplica para el periodo del presente informe.

Certificación emitida por el ente competente del porcentaje de cumplimiento de la implementación del SG-SST por parte del Interventor.

No aplica para el periodo del presente informe.

- iii. Soportes de reubicación laboral de trabajadores (si aplica).

No aplica para el periodo del presente informe.

1.5.21 Otras actividades SST realizadas por interventoría

Durante el periodo se realizaron las actividades del Plan de Trabajo SST, enfocadas en las actividades de supervisión e implementación de buenas prácticas de seguridad con el personal del CSPLMB; conforme a la programación, entre las más importantes ejecutadas en el periodo del informe están la realización de capacitaciones, inspecciones, verificación de condiciones inseguras, recorridos en los frentes de obra activos, comités del SG-SST, comités del contrato entre otras.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 100 de 104		

Como cumplimiento a la gestión de supervisión de actividades al contrato; esta Interventoría presenta un registro fotográfico de supervisión de las actividades constructivas en el anexo 1.5-11.

De igual manera como apoyo a la supervisión esta Interventoría realiza recorridos permanentes por los frentes de obra activos con el fin de evidenciar la gestión de buenas prácticas de SST.

La supervisión de la Interventoría durante el periodo se ha realizado de manera permanente, en cada frente de obra; con acompañamientos a las actividades programadas de alto riesgo, de igual manera la realización de verificación de las condiciones de señalización de seguridad, senderos peatonales, orden y aseo en los frentes de obra, equipamiento de seguridad para los contratistas entre otros.

1.5.22 Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV

La Interventoría empleó (12) vehículos en la ejecución de sus actividades. El plan estratégico de seguridad vial este articulado con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.


En este periodo la interventoría realizó las siguientes actividades conducentes a la implementación del PESV.

- Se realiza la Inducción del plan estratégico de seguridad vial, política de seguridad vial, programas al personal que ingreso en el periodo del informe, ver Anexo 1.5-7.
- Se verificaron los documentos del vehículo que ingreso al proyecto (licencia de conducción, licencia de tránsito, SOAT, tecnicomecanicas, póliza, mantenimientos)
- Se actualizó la base de datos de los conductores.
- Se verificó en el SIMIT la información sobre infracciones de tráfico de los conductores del Consorcio.
- Se realiza control a los vehículos con que cuenta el Consorcio en cuanto a: preoperacionales diarios, mantenimientos preventivos de acuerdo con el kilometraje. (Anexos 1.5-1, y 1.5-13).
- Verificación de cumplimiento de la política de seguridad vial, Programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño (prevención de la distracción, gestión de velocidad segura, cero tolerancias a la conducción bajo efectos del alcohol y sustancias psicoactivas, gestión de velocidad segura y seguimiento a los indicadores entre otros.
- Se realiza el proceso de actualización del plan anual de trabajo del PESV articulado con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (Anexos 1.5-15)

Avance del plan de trabajo del plan estratégico de seguridad vial

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA			
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.			
Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 101 de 104	


ANÁLISIS TENDENCIAL PLAN DE TRABAJO

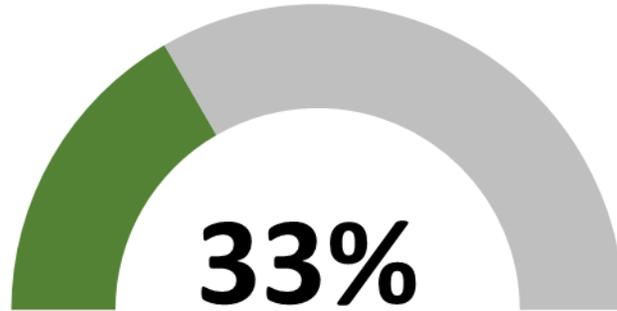

En el periodo seleccionado se da cumplimiento con el 33% de las actividades propuestas en el plan de trabajo, para el Plan estratégico de seguridad vial


En este mes no se tenía programada ninguna capacitación de seguridad vial, no obstante, se realizó capacitación en cómo actuar en caso de que ocurra un siniestro de tránsito como plan de acción por la investigación de tránsito presentada.

ANÁLISIS TASA DE SINIESTRO DE TRANSITO

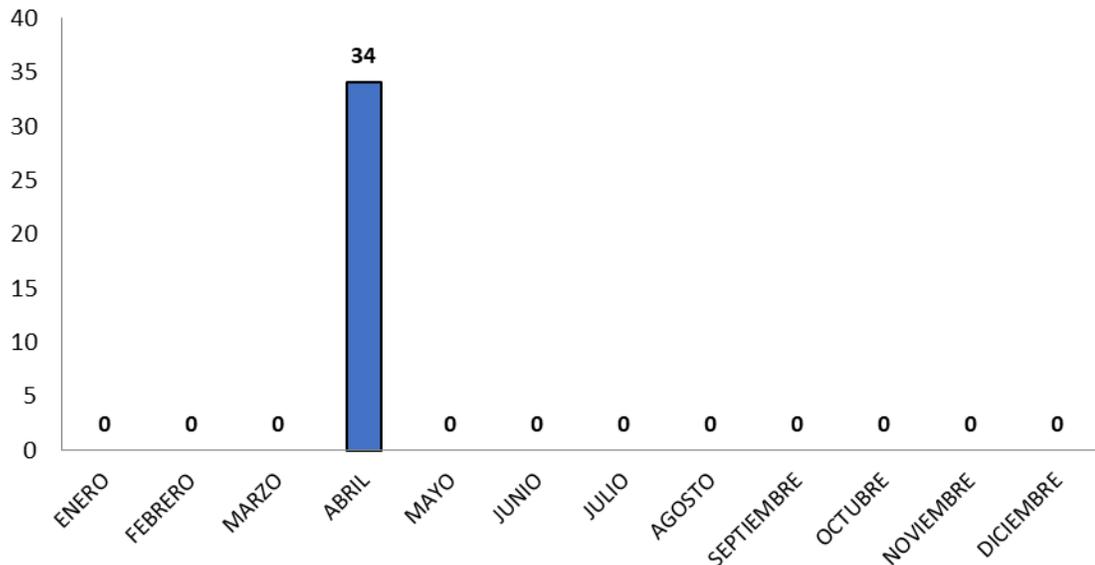

En el periodo seleccionado se presentó un 1 siniestros vial teniendo en cuenta el kilometraje recorrido 29303 y la contante de 1'000.000 de Kilómetros recorridos se brinda la tasa de siniestro de tránsito según formula $TSV(n) = SV(tn) * K / Km(t)$ quedando así: $TSV(n) = 1 * 1'000.000 / 29303 = 34.1$

Con relación a lo anterior y según el evento presentado se clasifica según la matriz de perdida de la resolución 40595 de 2022 así:

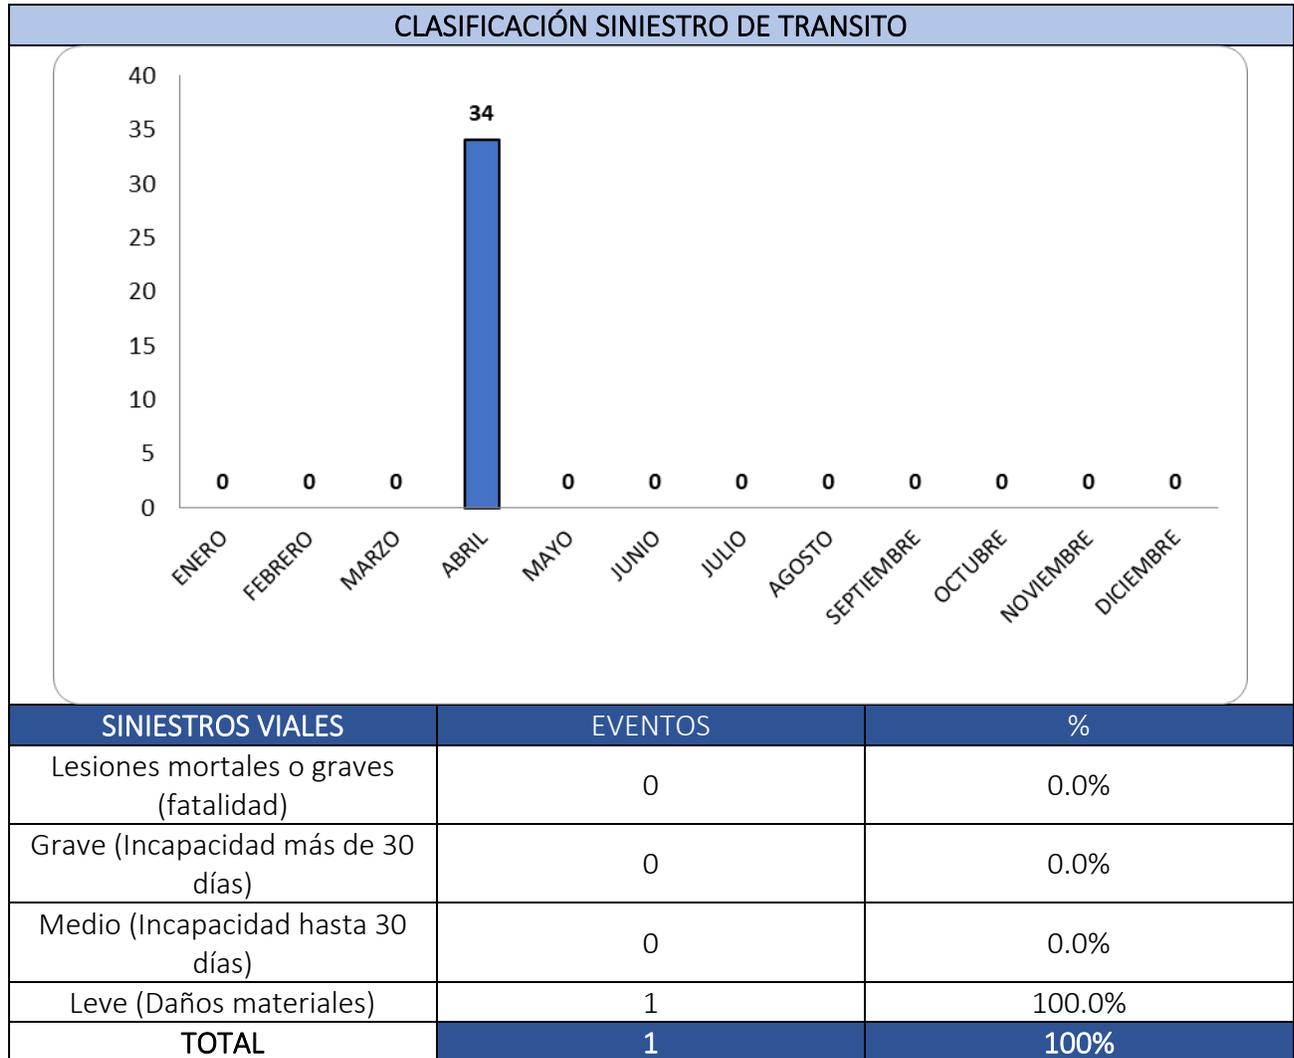

Se anexa en el 1.5-16 los soportes de la investigación de siniestros de tránsito.

1.5.23 Cumplimiento de las obligaciones SST por parte de interventoría

En el Anexo 1.5-14 se presenta la matriz de los requerimientos específicos sobre la verificación que debe hacer la interventoría, expresados en el Apéndice A2 "Obligaciones específicas del contrato de interventoría.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 103 de 104		

Conforme a lo establecido en el plan de trabajo SST, se presenta en el presente informe la ejecución de actividades proyectadas (Programadas y Ejecutadas) para el periodo del presente informe. Anexo 1.5-15.

De igual manera se ejecutaron las actividades del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo; conforme a la metodología de priorización de los principales riesgos asociados al proyecto; dentro de las actividades ejecutadas se presenta la gestión de capacitaciones, inspecciones programadas, control normativo de personal, gestión de comité del Copasst, entrega de elementos de protección personal, acompañamiento a las actividades críticas en el frente de obra, recorridos de supervisión de obra, revisión de preoperacionales, verificación de senderos peatonales y señalización general de seguridad en el frente de obra y en las áreas de influencia del proyecto.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.				
Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 27-07-2021	Versión: 02	Pág. 104 de 104		

1.6. Seguimiento Contrato No. 148 de 2020

En el LINK se encuentra las actas realizadas en el Periodo

[1.6 Actas de Seguimiento Obligaciones Interventoría.pdf](#)
